
Riepilogo sterro/riporto

Nome	Fase	Area 2D	Sterro	Riporto	Netto
Ricoprimento Finale [Fase 5]	5	3335.67m quad.	46.74 M. cub.	24919.98 M. cub.	24873.23 M. cub.<Riporto>

Riepilogo sterro/riporto TOTALE


Nome	Fase	Area 2D	Sterro	Riporto	Netto
Creazione Rampa Accesso [Fase 0]	0	3193.04m quad.	0.35 M. cub.	8253.82 M. cub.	8253.47 M. cub.<Riporto>
Abbancamento Fase 1	1	3995.21m quad.	0.00 M. cub.	17231.10 M. cub.	17231.10 M. cub.<Riporto>
Creazione Pista di Cantiere [Fase 2]	2	10276.05m quad.	0.85 M. cub.	57134.55 M. cub.	57133.70 M. cub.<Riporto>
Creazione Piattaforma +85 [Fase 3]	3	7133.43m quad.	1.29 M. cub.	42954.21 M. cub.	42952.93 M. cub.<Riporto>
Abbancamento Fase 4	4	3646.02m quad.	0.00 M. cub.	14994.83 M. cub.	14994.83 M. cub.<Riporto>
Ricoprimento Finale [Fase 5]	5	3335.67m quad.	46.74 M. cub.	24919.98 M. cub.	24873.23 M. cub.<Riporto>
Totali		31579.42m quad.	49.23 M. cub.	165488.50 M. cub.	165439.27 M. cub.<Riporto>

SISTEMAZIONE DEFINITIVA – Planimetria – Scala 1:250

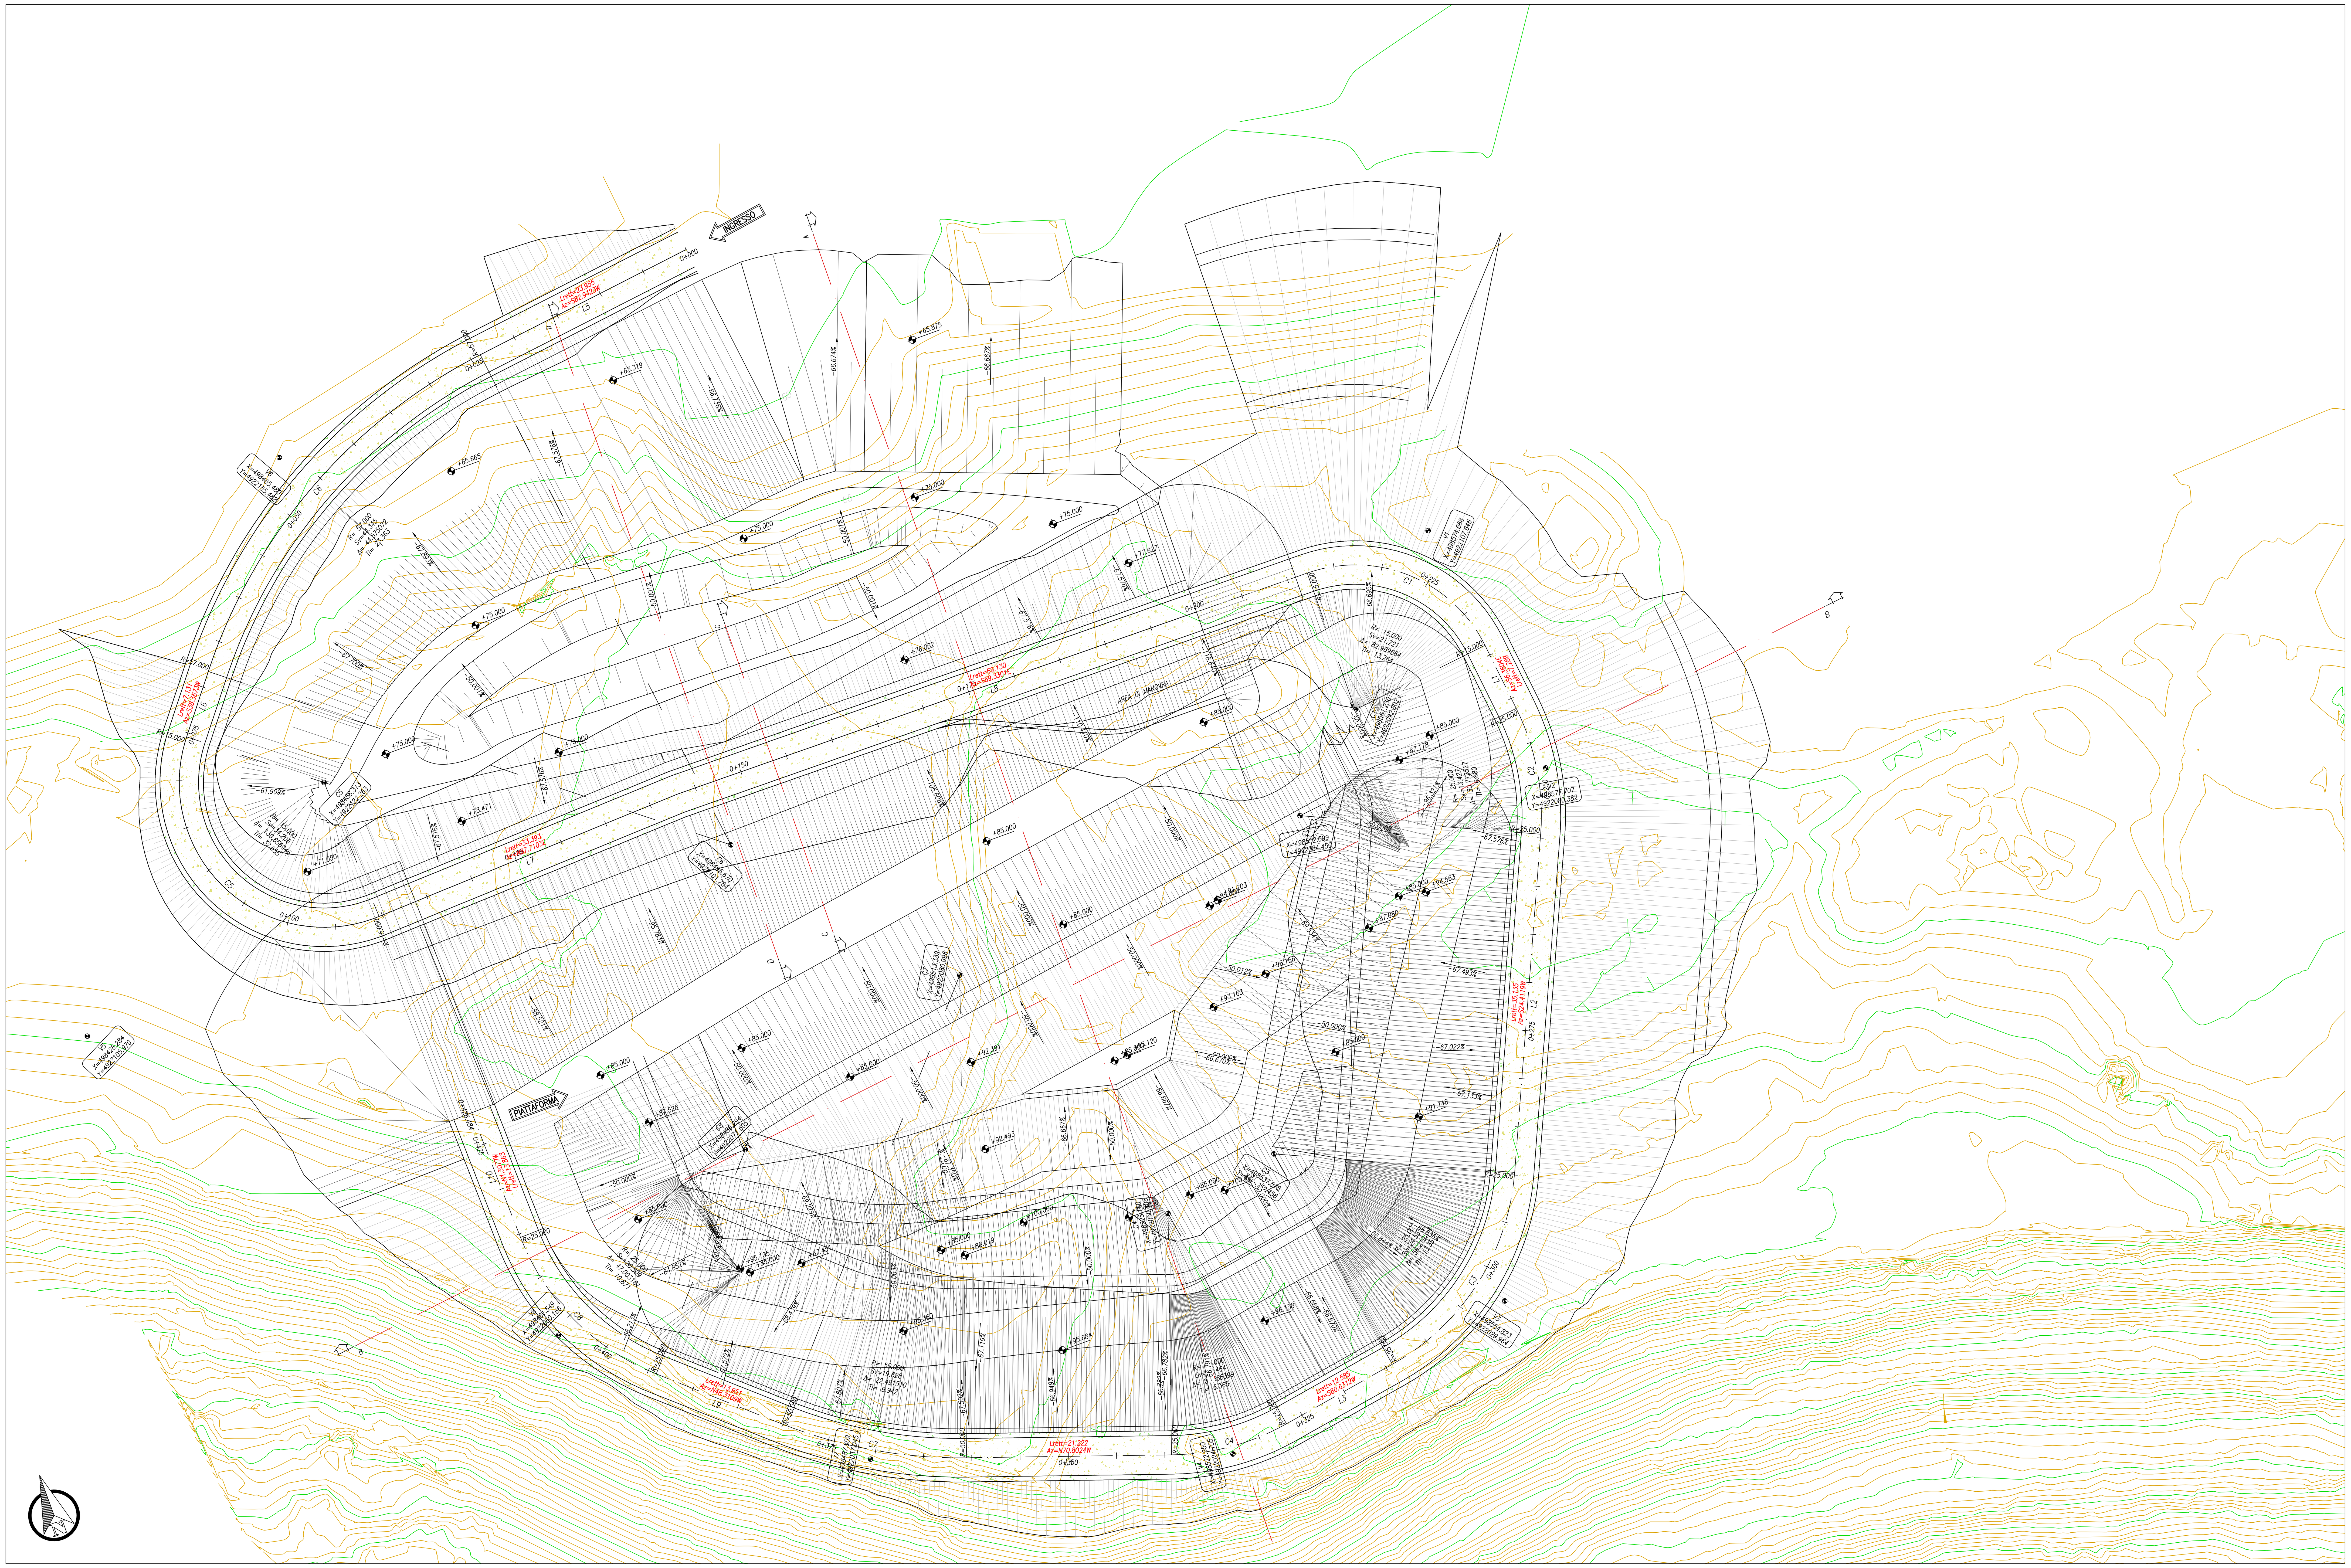

LEGENDA

- Sezione Terreno Esistente
- Sezione Piattaforma di Progetto (quota +85,00)
- Sezione Pista di Cantiere
- Sezione Abbancamento Fase 4
- Sezione Abbancamento Fase 5 (Fase Corrente)

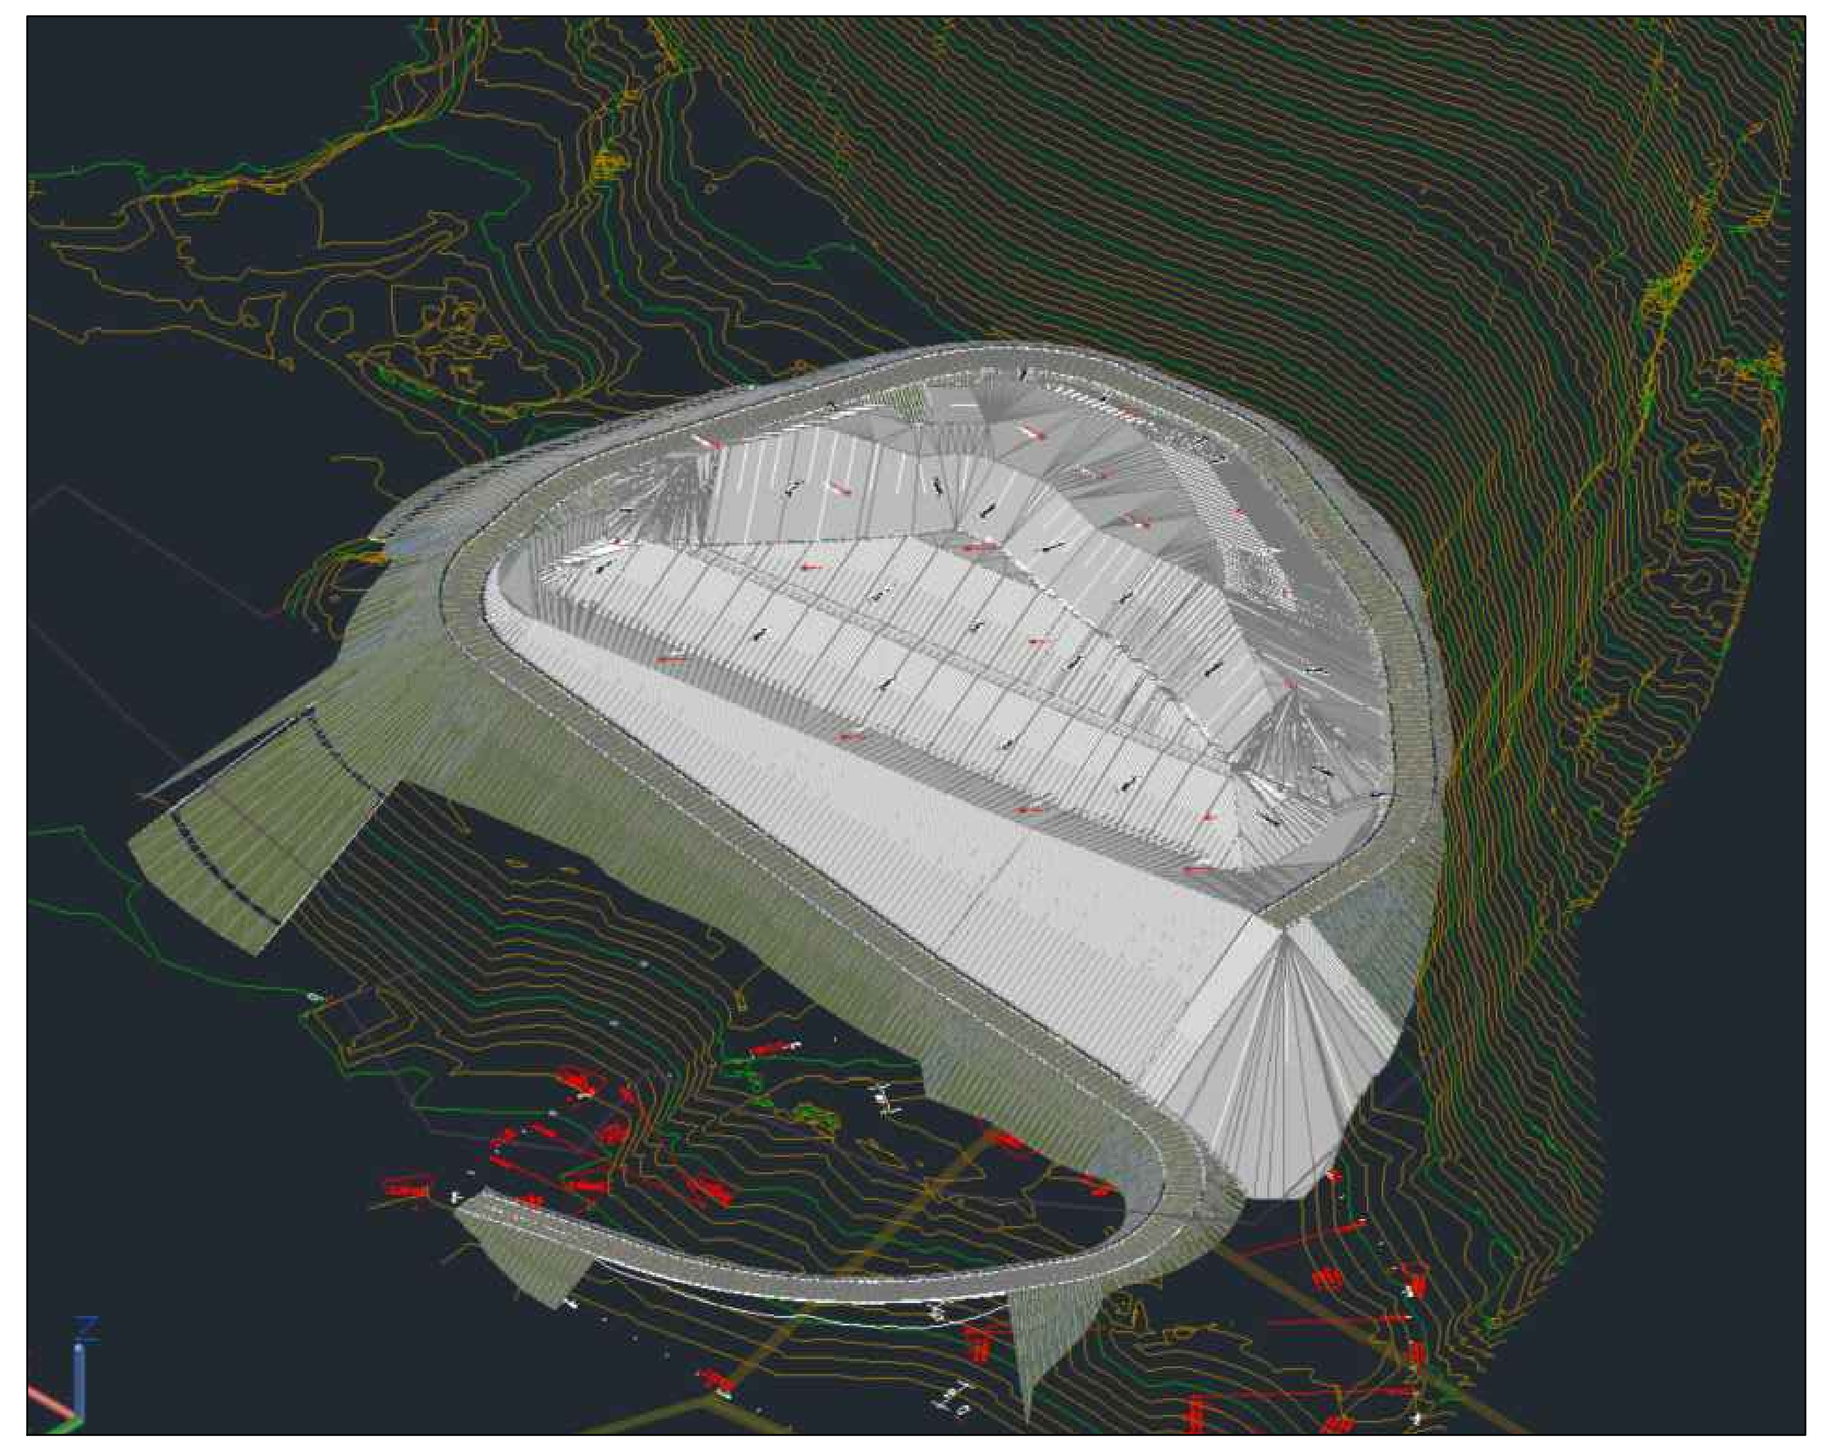

REGIONE LIGURIA — #ItaliaSicura Presidenza del Consiglio dei Ministri — COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE
CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii.
(ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario: Dott. Giovanni TOTI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: Ing. Stefano PINASCO
RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: Ing. Luca BERRUTI
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Mario CANGIANO

PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI
CAPOGRUPPO MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A. – CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel campo della GEOINGEGNERIA
MANDANTI: art ambiente risorse territorio – HYDRODATA INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE
Ing. Mario CANGIANO — Ing. Paolo GALLO
Ing. Francesco DE SANCTIS — Dott.ssa Francesca GIOMI
GRUPPO DI IMPRESE: COSTRUIRE PER GENOVA
Direttore Tecnico: Ing. Gianni Orlati

PROGETTO COSTRUTTIVO
CAPOGRUPPO MANDATARIA: HYpro srl — MANDANTE: TUNNEL CONSULT — MANDANTE: Progetti e opere

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche: Ing. Vincenzo Secreti
Progettazione scavo meccanizzato: Ing. Moreno Pescara
Progettazione gallerie naturali: Ing. Vincenzo Secreti
Progettazione opere marittime: Ing. Elio Ciralli

Gruppo di progettazione

Gallerie naturali, imbocchi e opere di sostegno	Ing. Francesco Conte
Strutture	Ing. Antonello Mastropierro
Scavo meccanizzato	Ing. Mario Coppola
Opere marittime	Ing. Giancarlo Inserra
Gestione T&R da scavo	Geol. Carla Leonetti
Aspetti ambientali	Ing. Valentina Bonifati
Cantierizzazione	Ing. Raffaele Ciardullo
Monitoraggio geotecnico	Geol. Giovanni De Fazio
Geologia	Geol. Alessandro Grispino
Indagini	Geol. Davide Fabbricatore
Computi e stime	Ing. Francesco Trovati

Geologo: Dott. Giuseppe Cerchiaro

Intervento/Opera: SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

MODIFICA TECNICA DI VARIANTE — N° Progr. — Codice elaborato: BIS2V - C - CAN07 - PL01 - 1

Oggetto della tavola: CANTIERIZZAZIONE
AREA DI SISTEMAZIONE TEMPORANEA TRS IN VIA ADAMOLI
SISTEMAZIONE DI ABBANCAMENTO
Sistemazione definitiva - Planimetria

Scala: Varie — Data: 09/06/2021

Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
1	09/06/2021		CIARDULLO	SECRETI	SECRETI

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
