PORTS of GENOA
VADO LIGURE ■ SAVONA ■ PRA' ■ GENOVA

PROGETTO NUMERO
P.755 - PROGETTO DI VARIANTE

TITOLO PROGETTO
INTERVENTO STRUTTURALE A DIFESA DI UN TRATTO DELLA COSTA DI VADO LIGURE - SAVONA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	DISEGNATO
0	**NOV.2021**	**PRIMA EMISSIONE**	**FIS**	


N.	TITOLO ELABORATO	SCALA
Rel.Gen.002	**Cronoprogramma dei Lavori**	

NOME FILE
P755_v_Rel.Gen.002_Crono.pdf

PROGETTISTI INTERNI		COLLABORATORI ESTERNI
Direttore dei lavori:	ing. Filippo Serafini Ordine ingegneri SV nr.1622A	
Direttore Operativo con qualifica di Coordinatore in fase di esecuzione:	ing. Matteo Vinci Ordine ingegneri RC nr.2562A	

DIRETTORE DEI LAVORI		VALIDATO R.U.P.	VISTO DIRETTORE
ing. Filippo Serafini		ing. Susanna Pelizza	ing. Flavio Destefanis

ID	Nome attività	Durata gg lavorativi	Predecessori	Data inizio	Data fine
1	1 Allestimento generale cantiere	3 g		mar 21/09/21	gio 23/09/21
2	2 gestione logistica cantiere	146 g	1	ven 24/09/21	ven 15/04/22
3	**3 Ispezioni preventive ordigni**	**6 g**		**mer 22/09/21**	**mer 29/09/21**
4	3.1 ispezione secca nord	2 g	1II+1 g	mer 22/09/21	gio 23/09/21
5	3.2 ispezione pennello	2 g	4	ven 24/09/21	lun 27/09/21
6	3.3 ispezione secca sud	2 g	5	mar 28/09/21	mer 29/09/21
7	**4 Realizzazione secche**	**70 g**	**1**	**mar 28/09/21**	**lun 03/01/22**
8	**4.1 Secca sud**	**40 g**		**mar 28/09/21**	**lun 22/11/21**
9	4.1.1 scavo fondale e posa geotessuto	7 g	6	mar 28/09/21	mer 06/10/21
10	4.1.2 posa scanno e massi	30 g	9	mar 12/10/21	lun 22/11/21
11	**4.2 Secca nord**	**37 g**	**8FI-7 g**	**ven 12/11/21**	**lun 03/01/22**
12	4.2.1 scavo fondale e posa geotessuto	7 g	4	ven 12/11/21	lun 22/11/21
13	4.2.2 posa scanno e massi	30 g	12	mar 23/11/21	lun 03/01/22
14	**5 Ripristino Terrapieno**	**20 g**	**11FI-15 g**	**mar 14/12/21**	**lun 10/01/22**
15	5.1 salpamento e riposizionamento massi	5 g		mar 14/12/21	lun 20/12/21
16	5.2 completamento scogliera	15 g	15	mar 21/12/21	lun 10/01/22
17	**6 Realizzazione pennello e scogliera sud**	**35 g**	**5;14**	**mar 11/01/22**	**lun 28/02/22**
18	6.1 scavo e predisposizione dell'imbasamento	5 g		mar 11/01/22	lun 17/01/22
19	6.2 posa scanno e massi	30 g	18	mar 18/01/22	lun 28/02/22
20	**7 Ripascimento strutturale e integrativo**	**43 g**	**19II+7 g**	**ven 11/02/22**	**mer 13/04/22**
21	7.1 prelievo sabbia in loco	35 g		ven 11/02/22	ven 01/04/22
22	7.2 stesa materiale	38 g	21II+5 g	ven 18/02/22	mer 13/04/22
23	8 smobilitazione generale cantiere	2 g	20	mer 13/04/22	ven 15/04/22

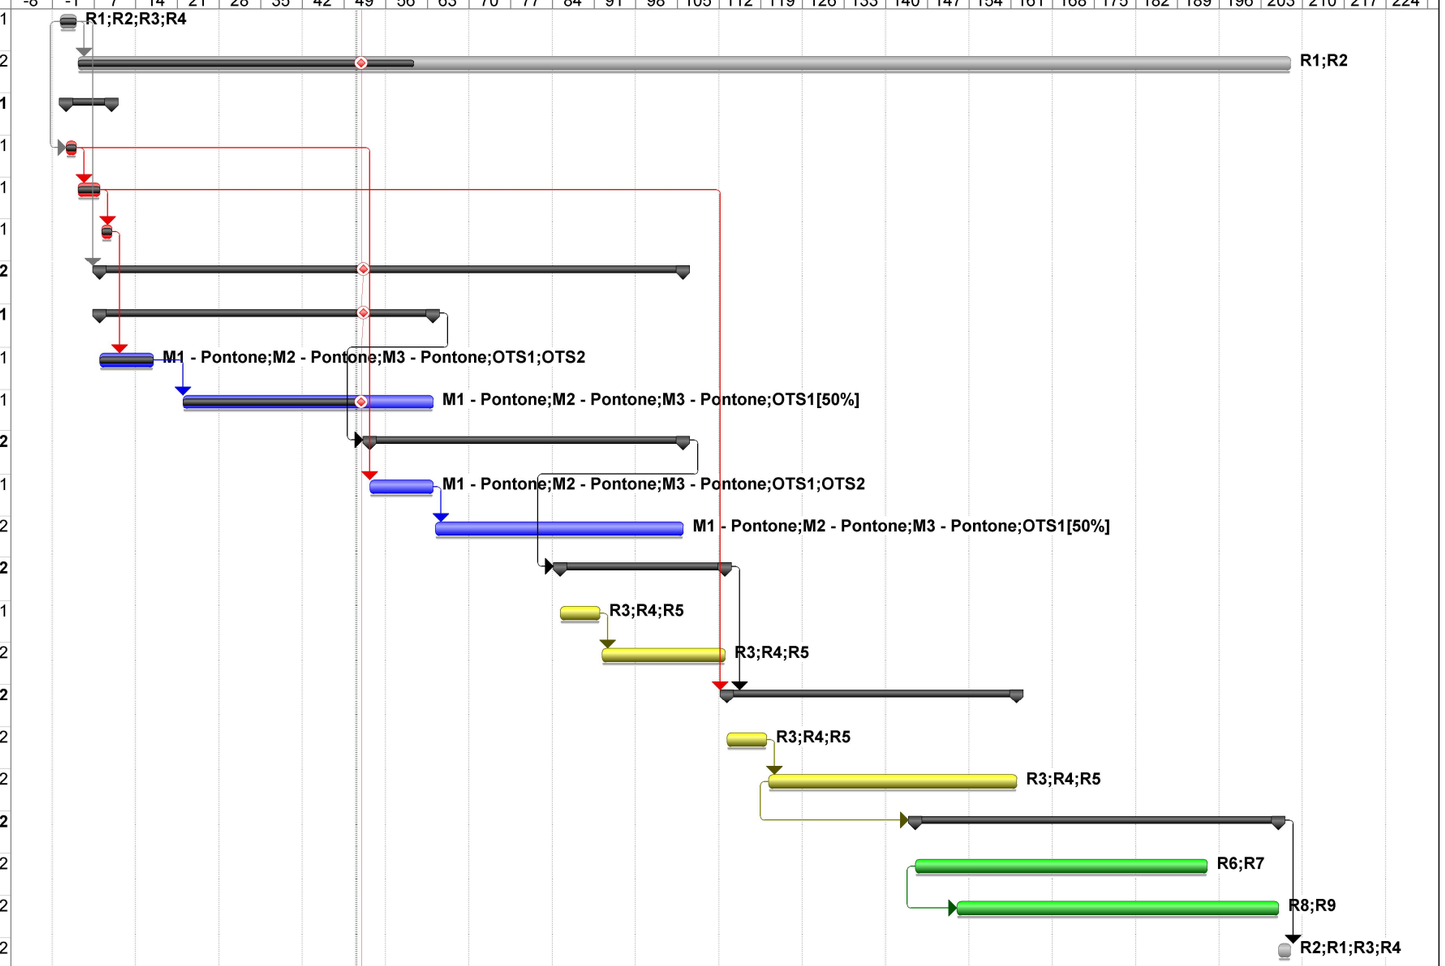

Progetto: P755_Crono
Data: mer 10/11/21

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza
