REGIONE:	PROVINCIA:	COMMITTENTE:	REGIONE:
REGIONE LIGURIA	PROVINCIA DI IMPERIA		REGIONE PIEMONTE

PROGETTO:

S.P. 97 delle Salse – Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

CUP:I81B21004530001



Coordinate: Latitudine 44.078393 - Longitudine 07.745743

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

ai sensi del D.Lgs 36/2023

ALLEGATO N°		DATA:
11	**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**	**Maggio 2024**
		PROTOCOLLO: **012-2024**

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo

Ing. Roberto Sperandio

TIMBRI E FIRME:

REV.:	REDATTO:	VALIDATO:	VERIFICATO:	RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
2	*Fabio Salomone*	*Roberto Sperandio*	*Giorgio Scioldo*	

studio associato INGEOPROJECT

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino
Tel +39 0115 113490
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo
tel +39 0171 681817
e-mail: info@ingeoproject.it

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo documento è coperto da copyright e non potrà essere modificato, riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione

Comune di Monesi di Triora

Provincia di Imperia

Cronoprogramma di PROGETTO

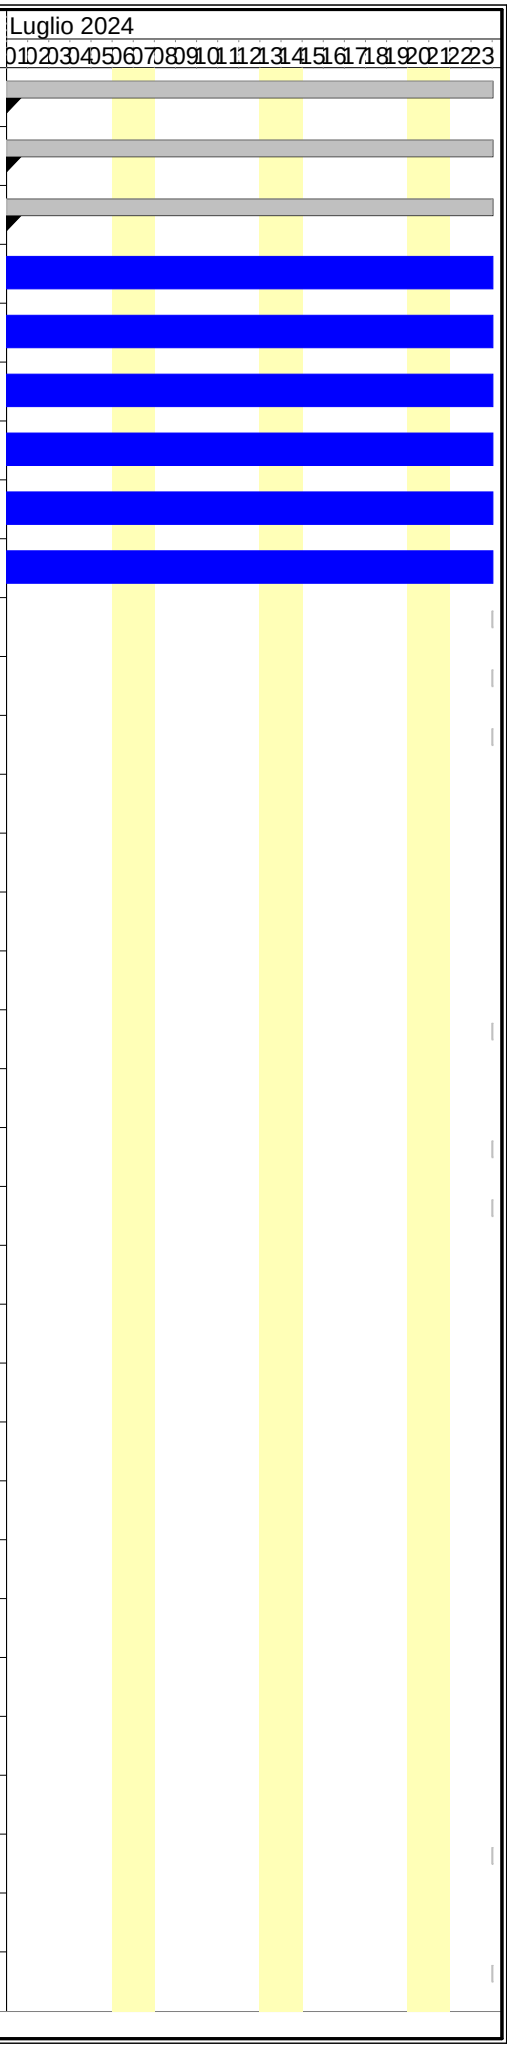
OGGETTO: Servizio riguardante la progettazione definitiva relativamente a: S.P. 97 delle Salse.
Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA

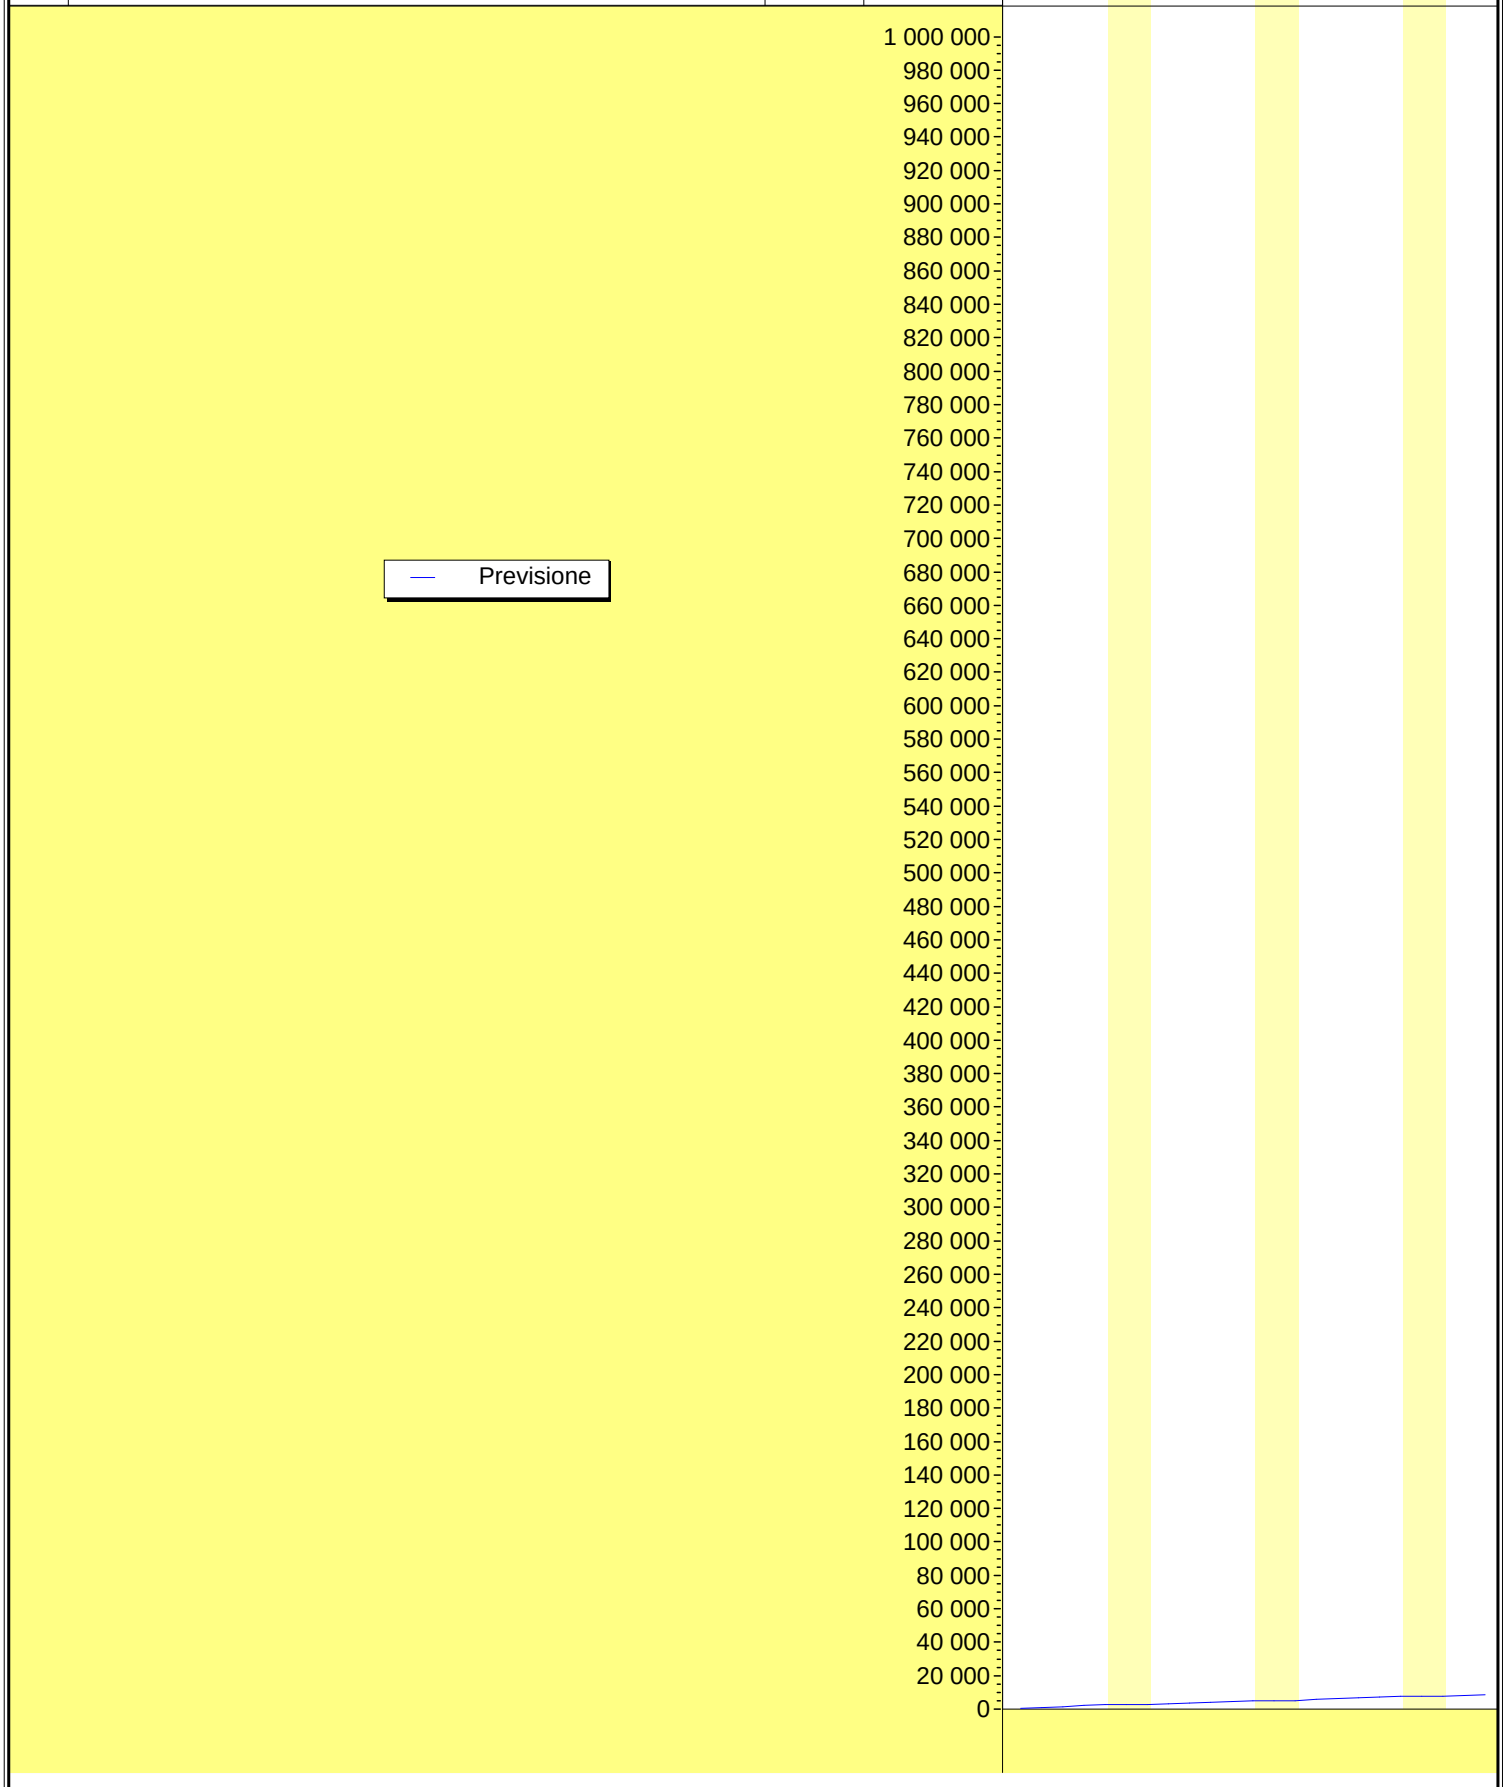
Il Tecnico
()

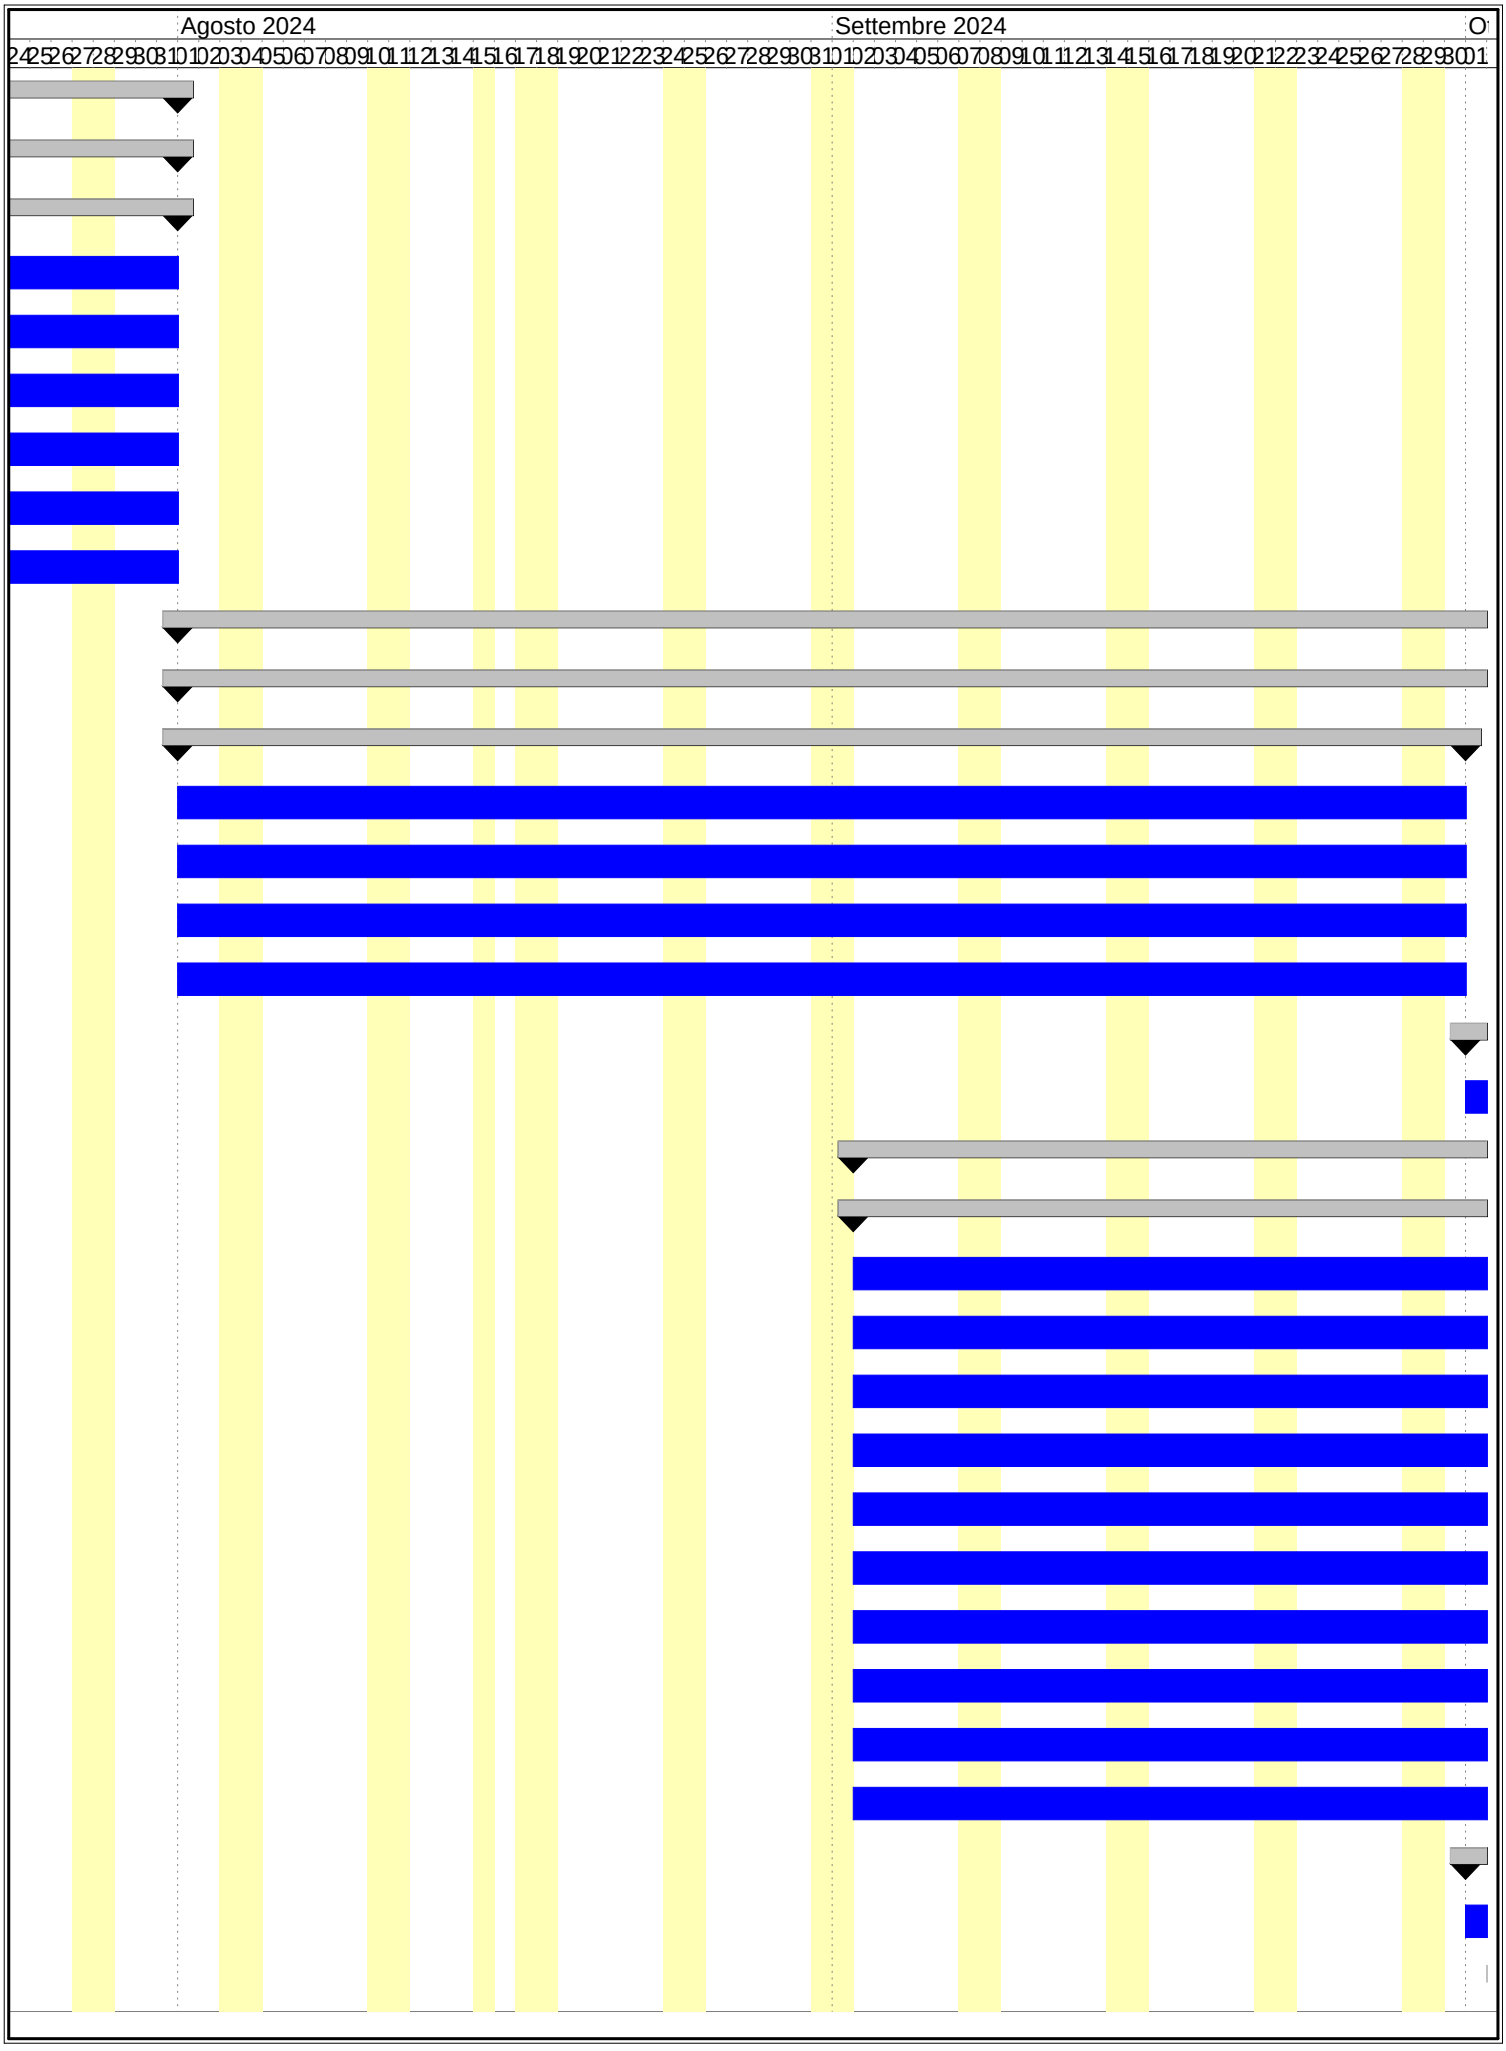
_____

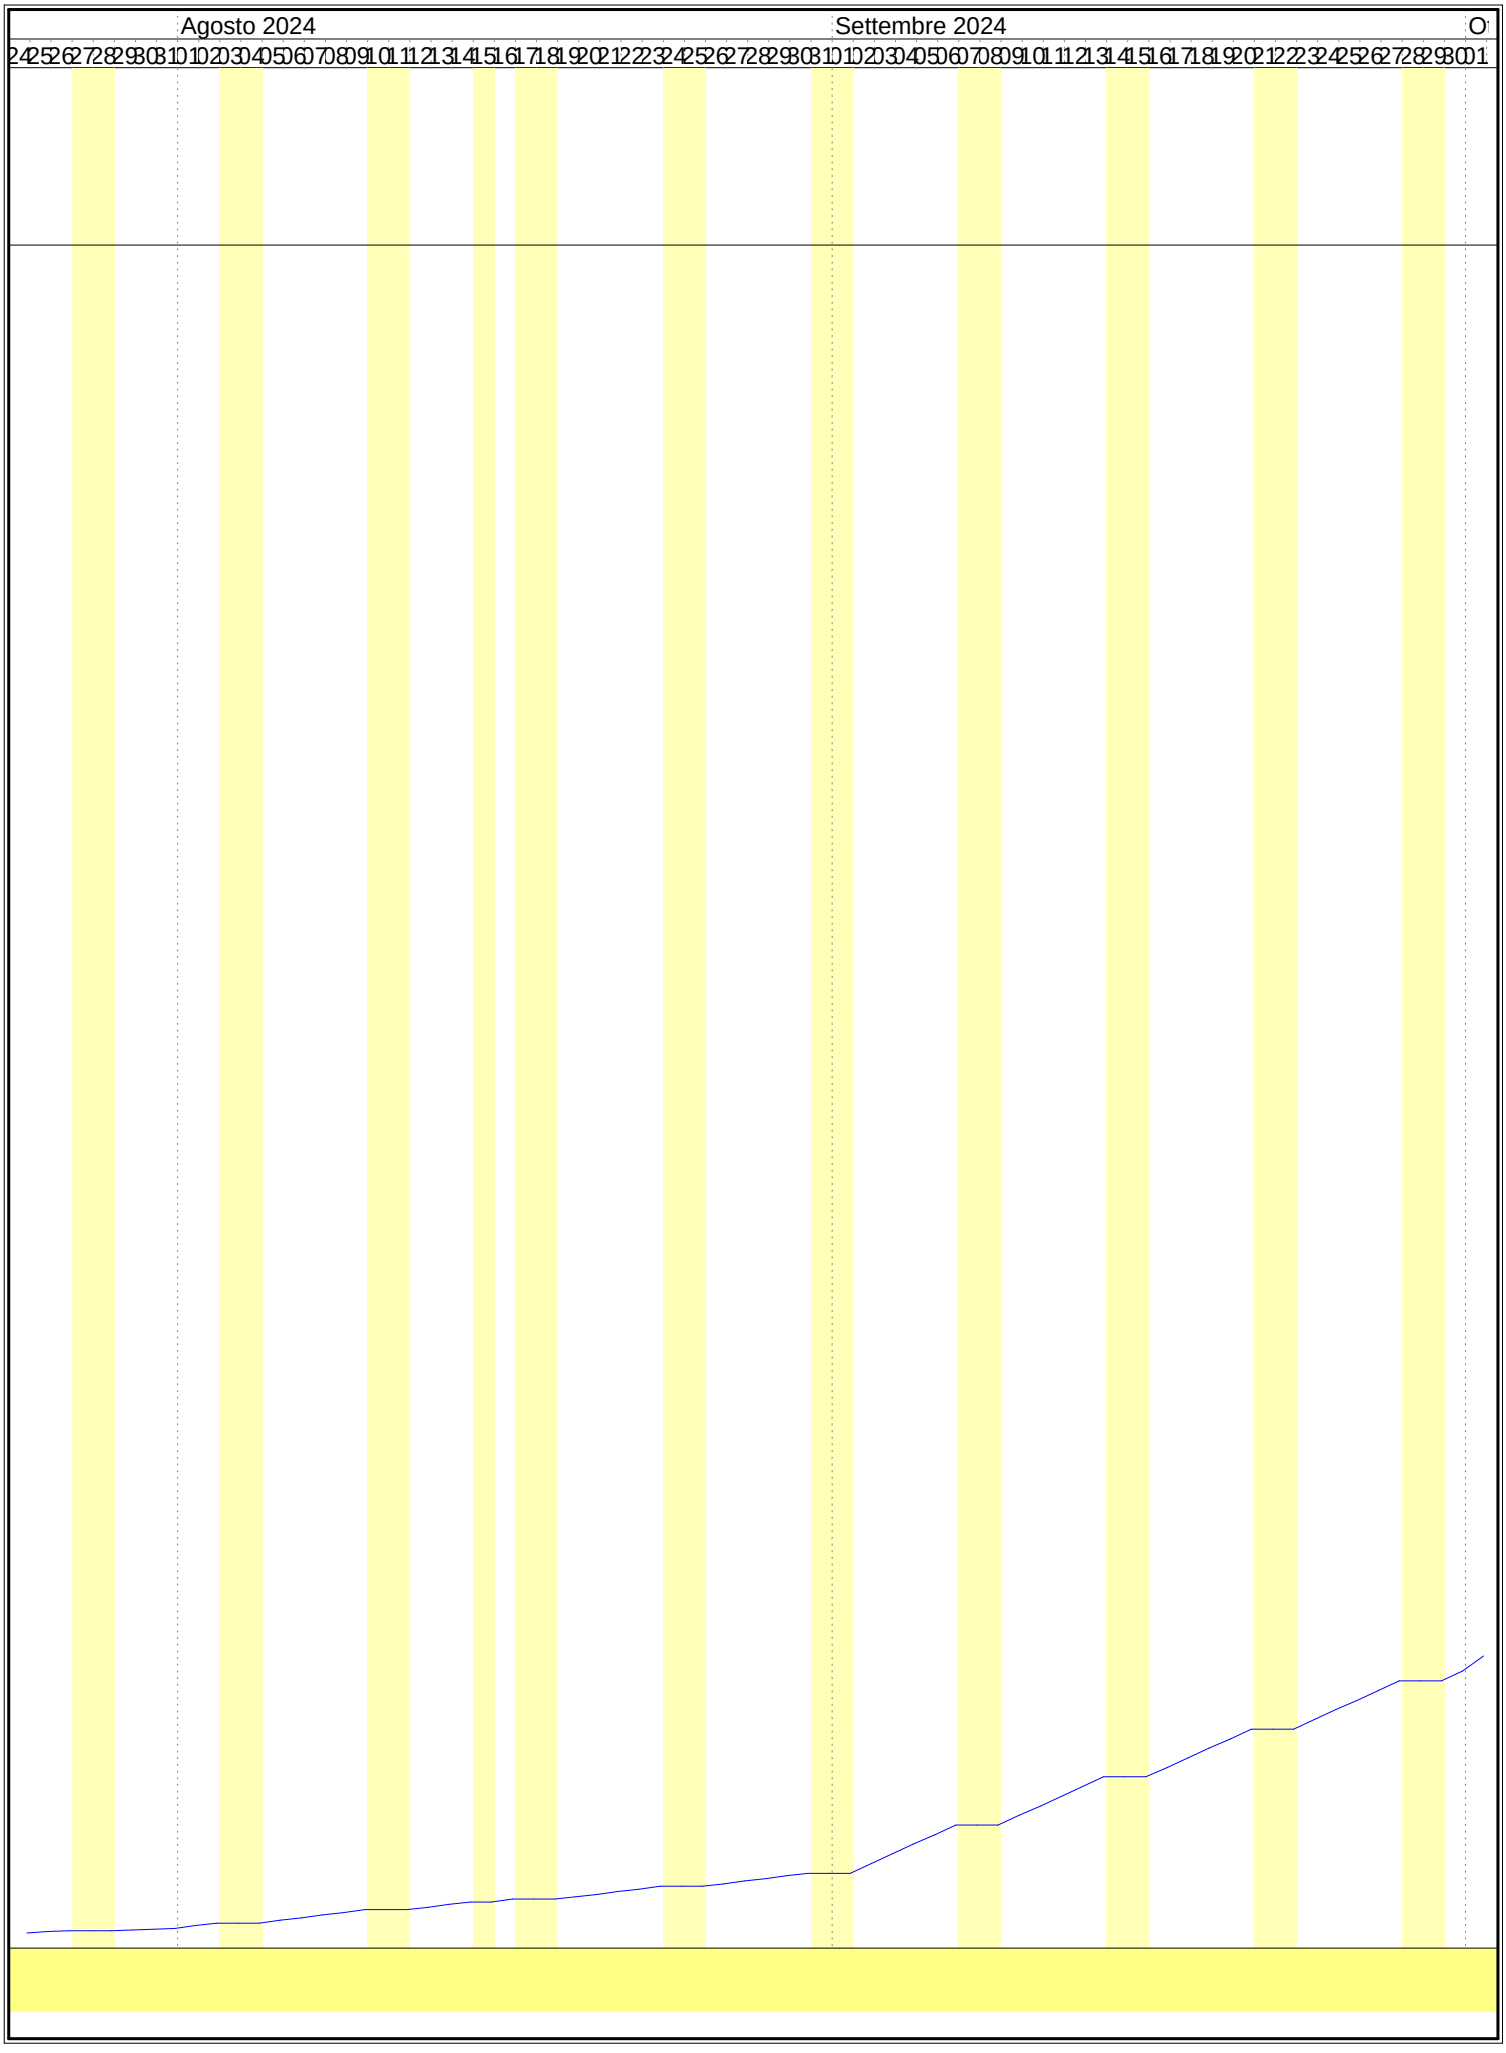
ID	Nome attivita'	Durata	Importo
1	**Lavori a MISURA**	23 g	11´801,20
2	**LAVORI IN ECONOMIA**	23 g	11´801,20
3	**Lavori in economia**	23 g	11´801,20
4	Operaio Edile IV Livello	23 g	1´564,00
5	Operaio Edile Specializzato	23 g	1´487,60
6	Operaio Edile Qualificato	23 g	1´382,00
7	Operaio Edile Comune	23 g	1´242,80
8	Autocarro da 15,01 t fino a 18,00 t	23 g	2´716,40
9	Escavatore oltre 8 t fino a 13 t.	23 g	3´408,40
10	**Lavori a CORPO**	228 g	881´930,28
11	**LAVORI TORRENTE BAVERA**	85 g	153´083,60
12	**Movimento Terra**	42 g	66´115,40
13	Scavo comune in rocce tenere per quantitativi > 500 mc	42 g	32´151,60
14	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	42 g	3´369,60
15	Riempimento esclusi rullatura e materiali di riempimento	42 g	24´710,40
16	Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o mattoni mezzo mecc.	42 g	5´883,80
17	**Opere Idrauliche**	43 g	86´968,20
18	PPO massi 2°cat.via mare >300 t/g entro 3 miglia zona carico	43 g	86´968,20
19	**COSTRUZIONE PONTE**	207 g	728´846,68
20	**Cementi Armati**	44 g	183´413,48
21	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	44 g	1´248,00
22	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco.	44 g	780,00
23	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco.	44 g	2´184,00
24	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco.	44 g	780,00
25	per diametro esterno pari a 200-219 mm.	44 g	75´014,64
26	Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett	44 g	19´146,24
27	Casseforme tavole abete - fondazioni.	44 g	12´649,53
28	Calcestruzzo XC3 S4 C30/37. RAPP. A/C 0,55	44 g	32´468,41
29	Getto in opera cls - elevazioni.	44 g	6´394,34
30	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.	44 g	32´748,32
31	**Carpenteria metallica ponte**	166 g	499´280,00
32	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE	166 g	499´280,00
33	**Opere stradali**	20 g	46´153,20



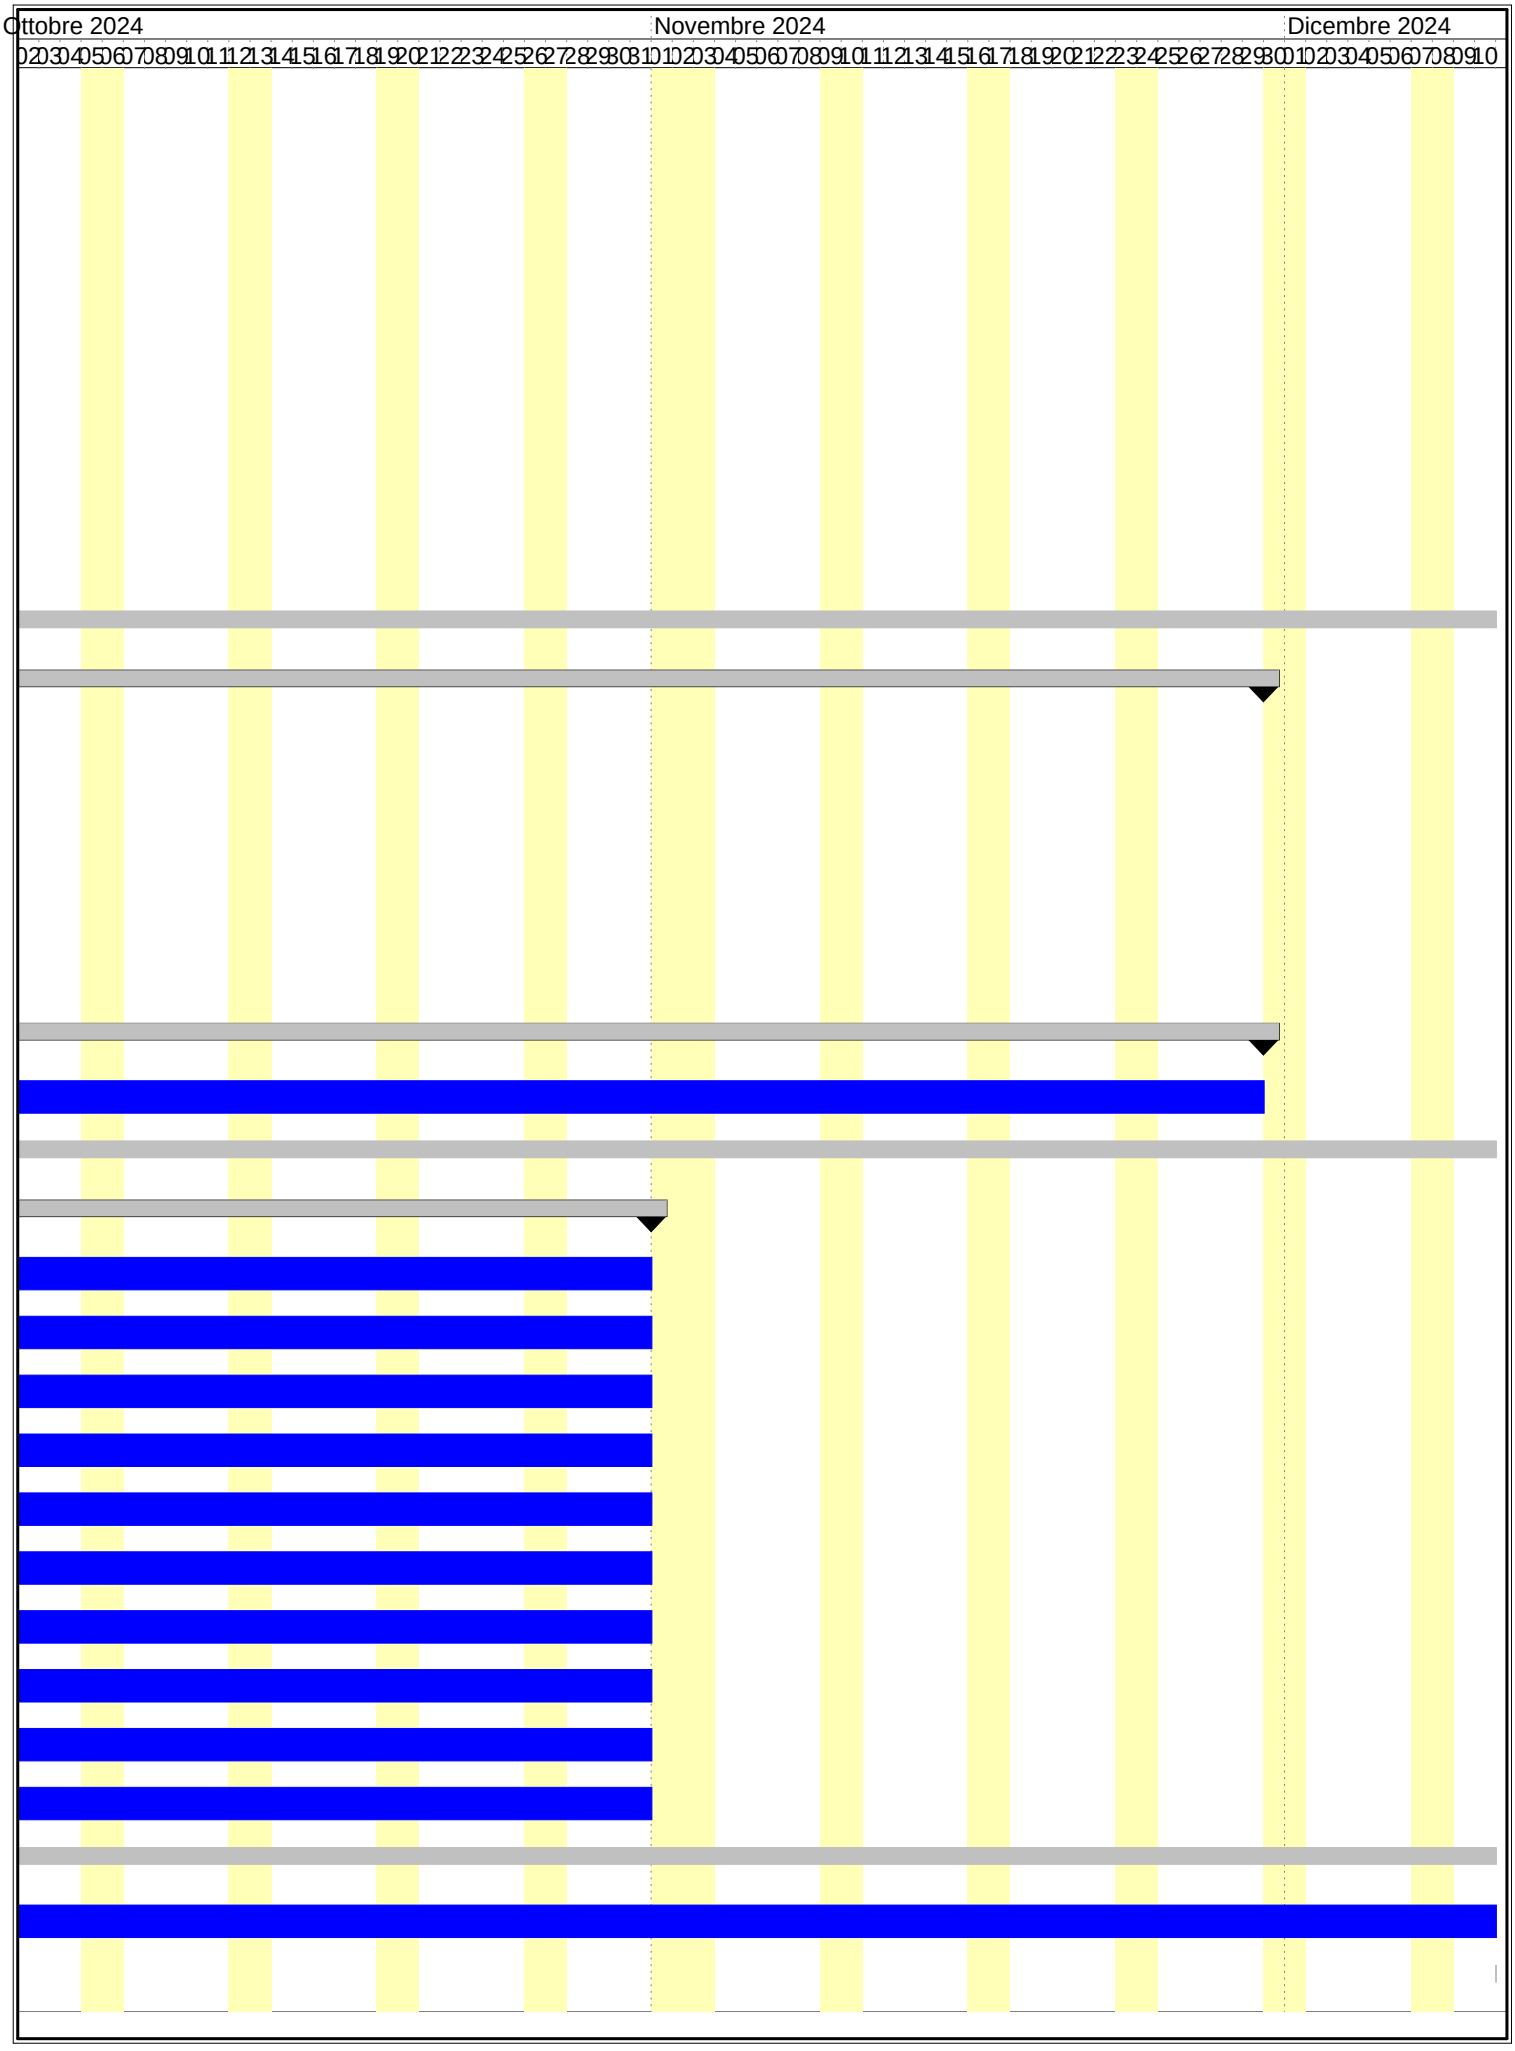
ID	Nome attivita'	Durata	Importo
34	per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - Imperia	20 g	20´470,00
35	Barriere strad. di sic. classe H2 - B.P.	20 g	19´430,40
36	Sola posa barriera strad acciaio H2	20 g	6´252,80



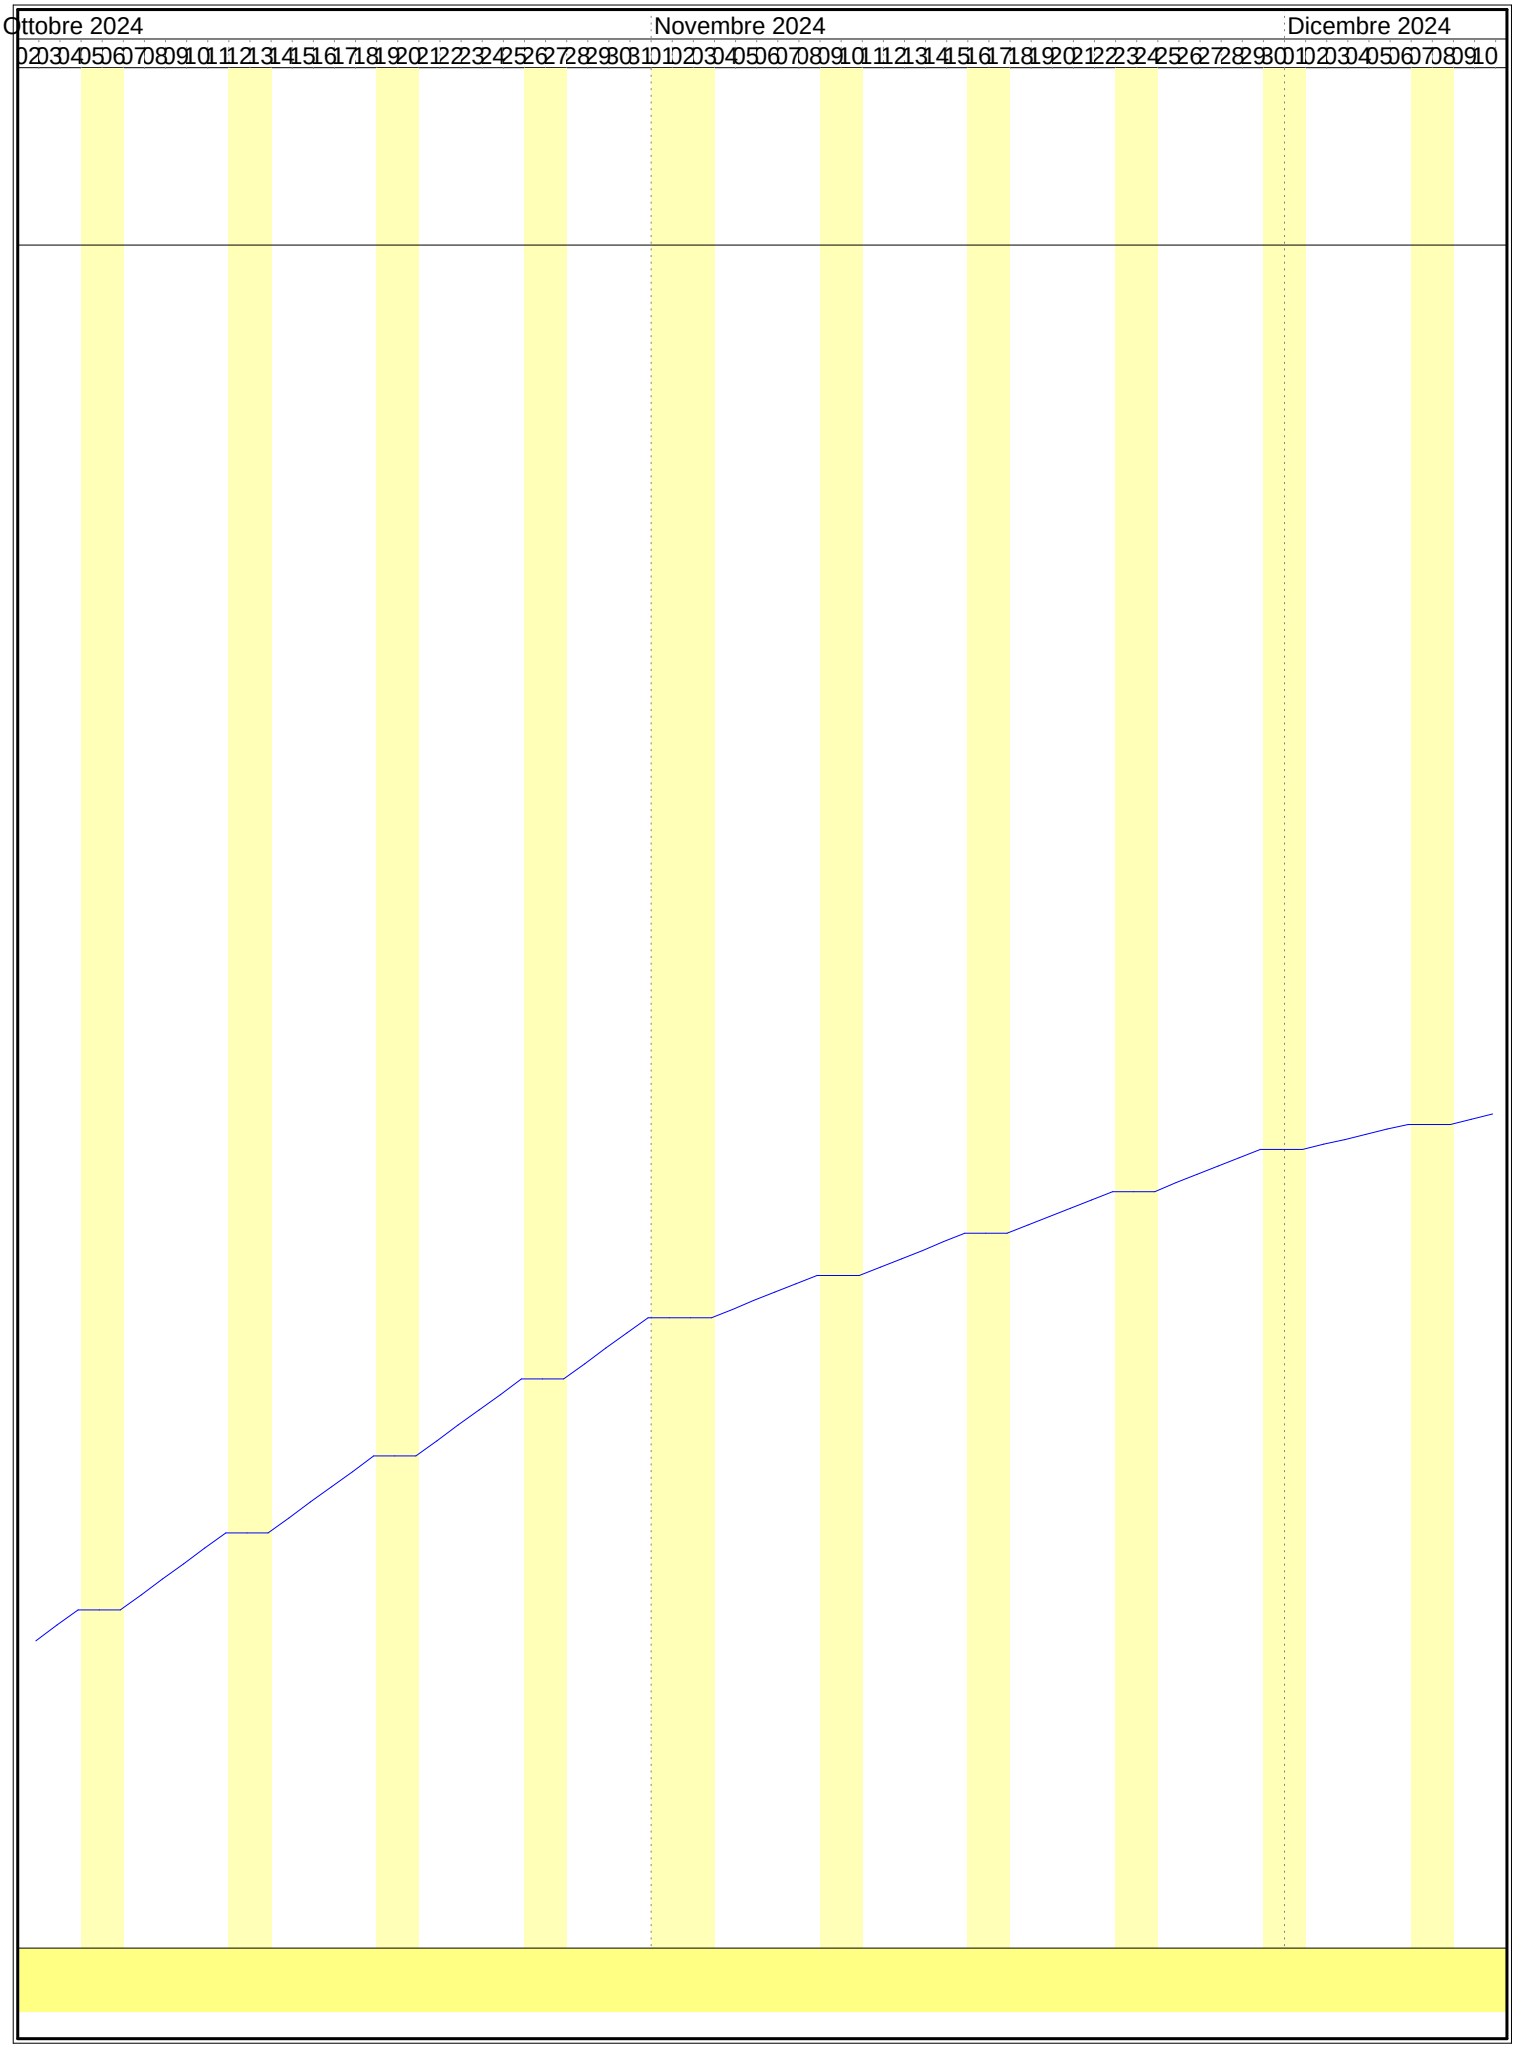

Agosto 2024
Settembre 2024
O
24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01

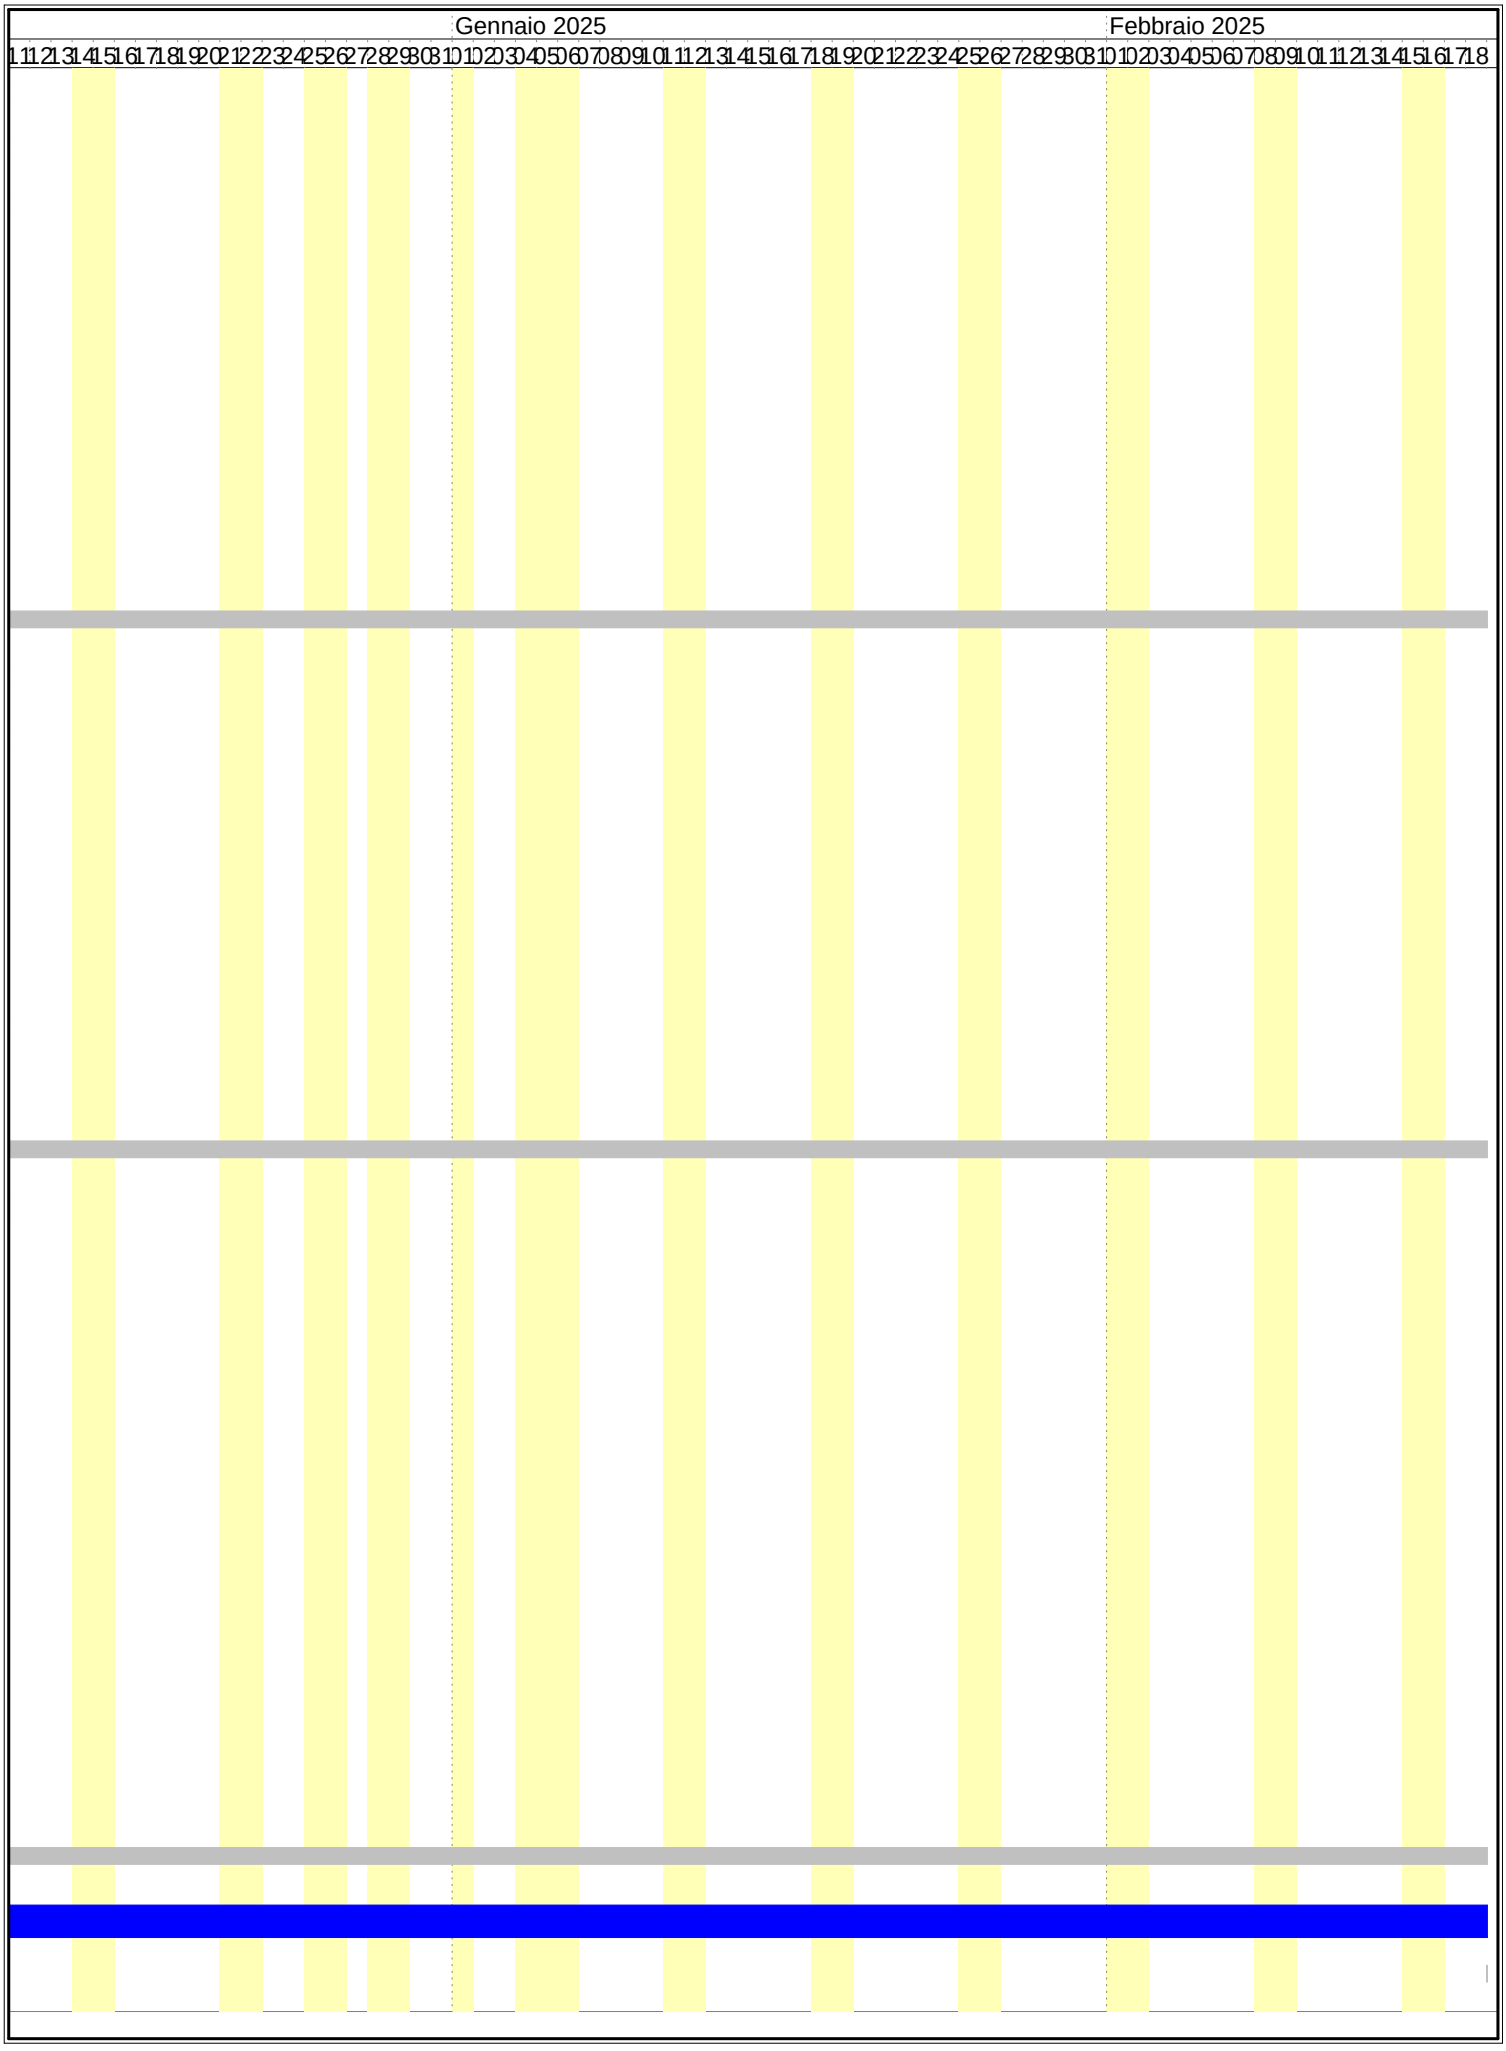


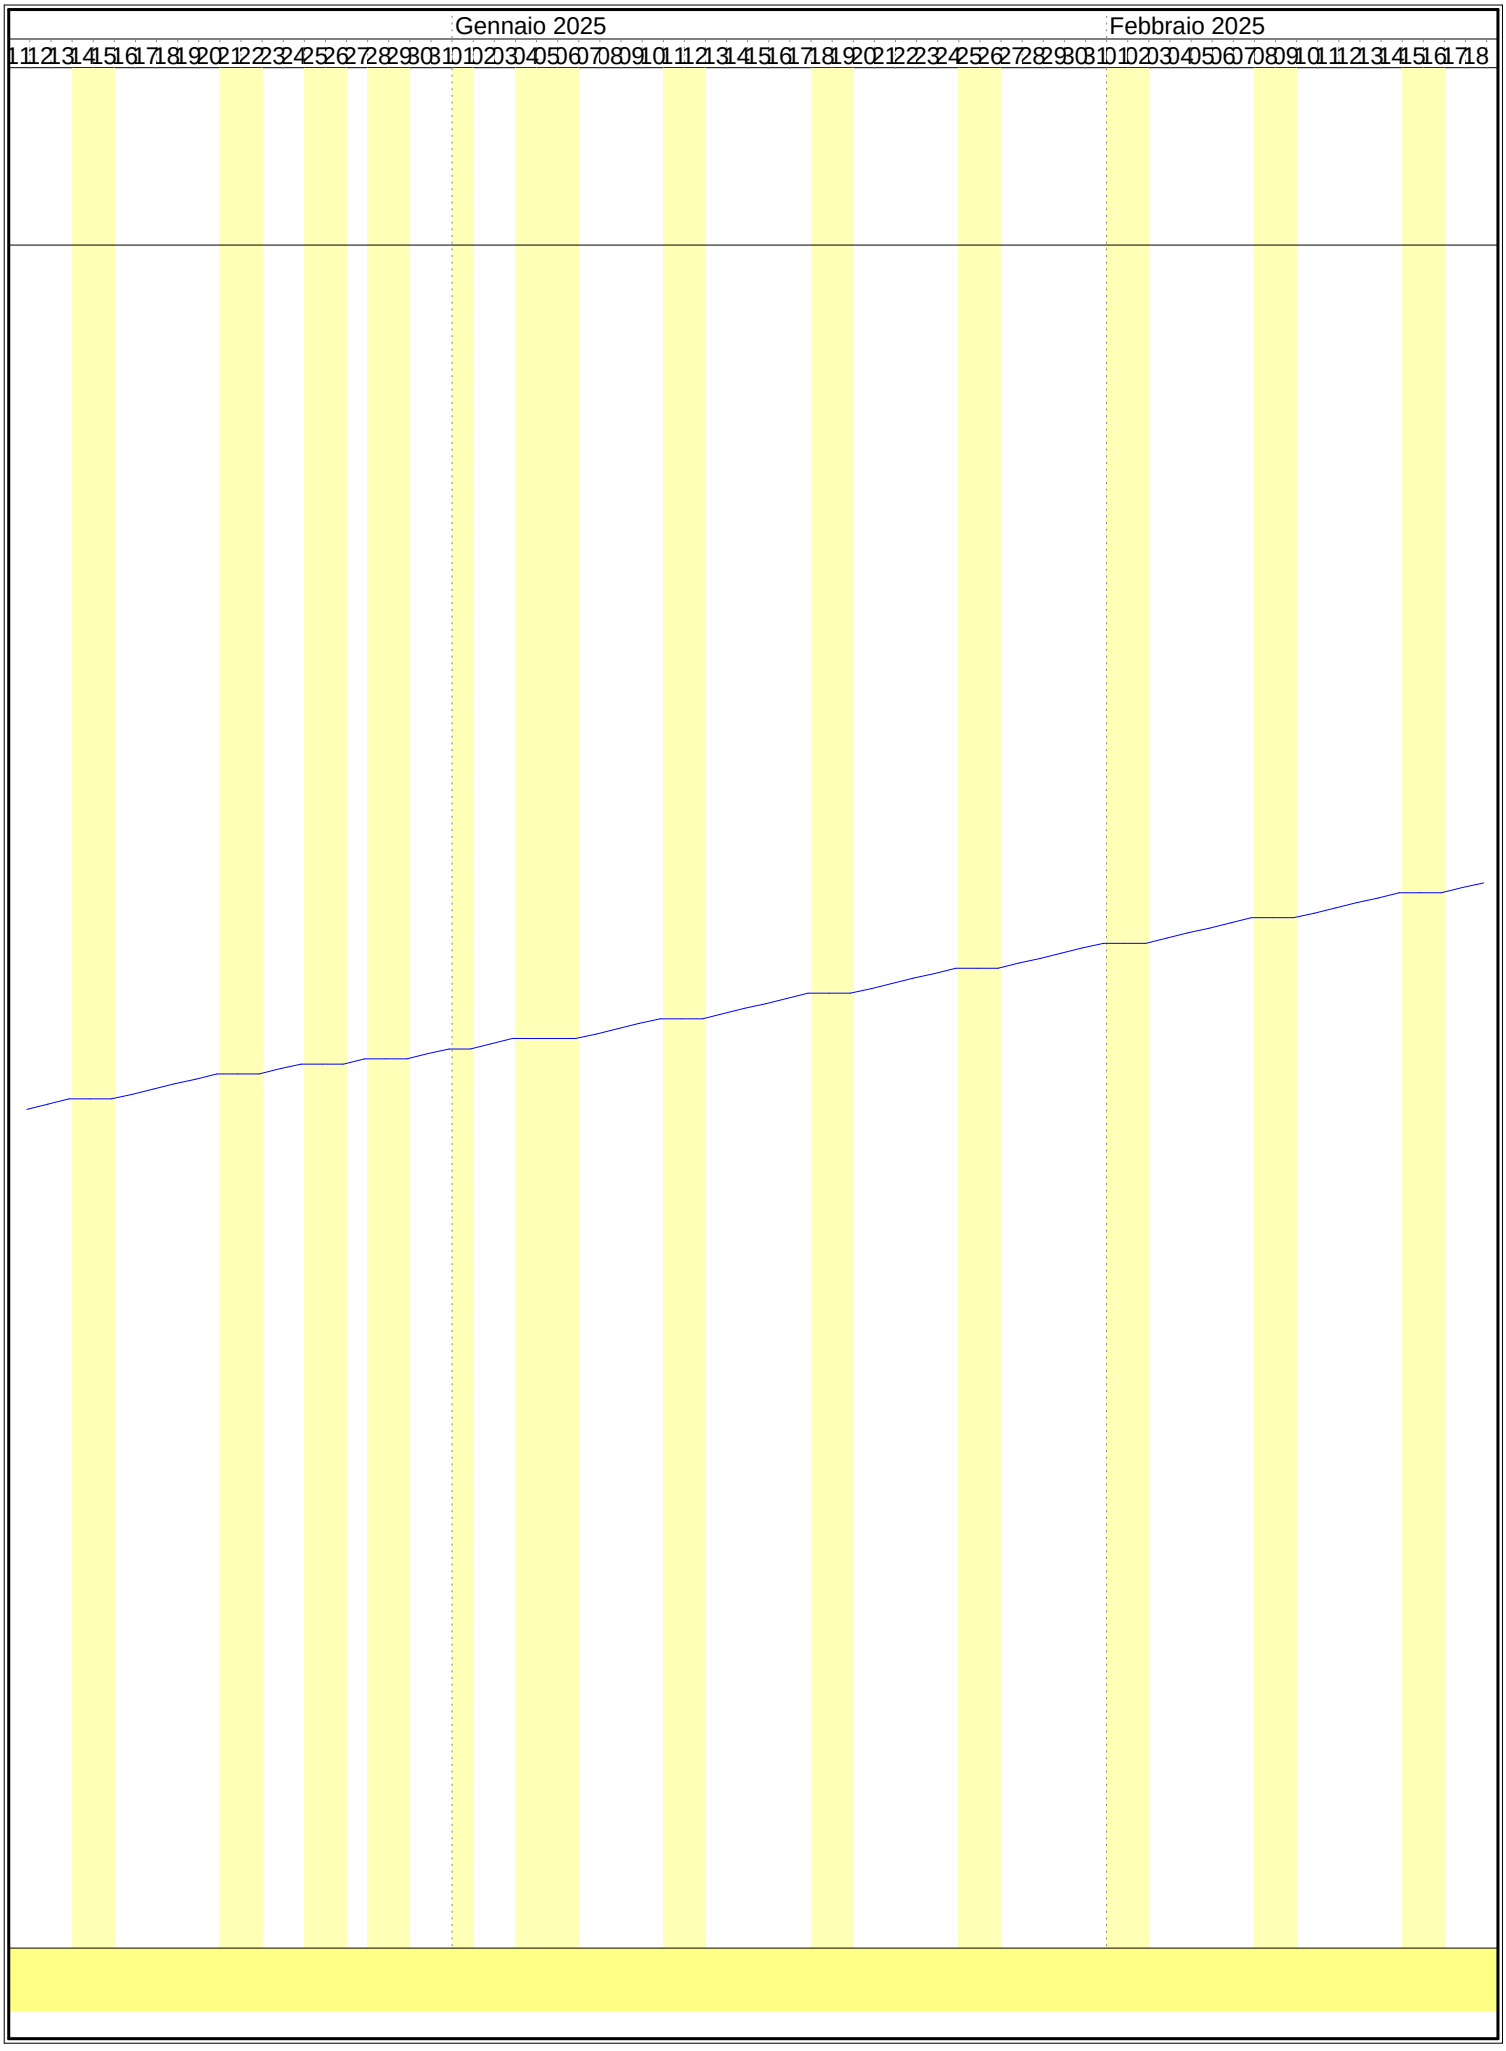
COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA

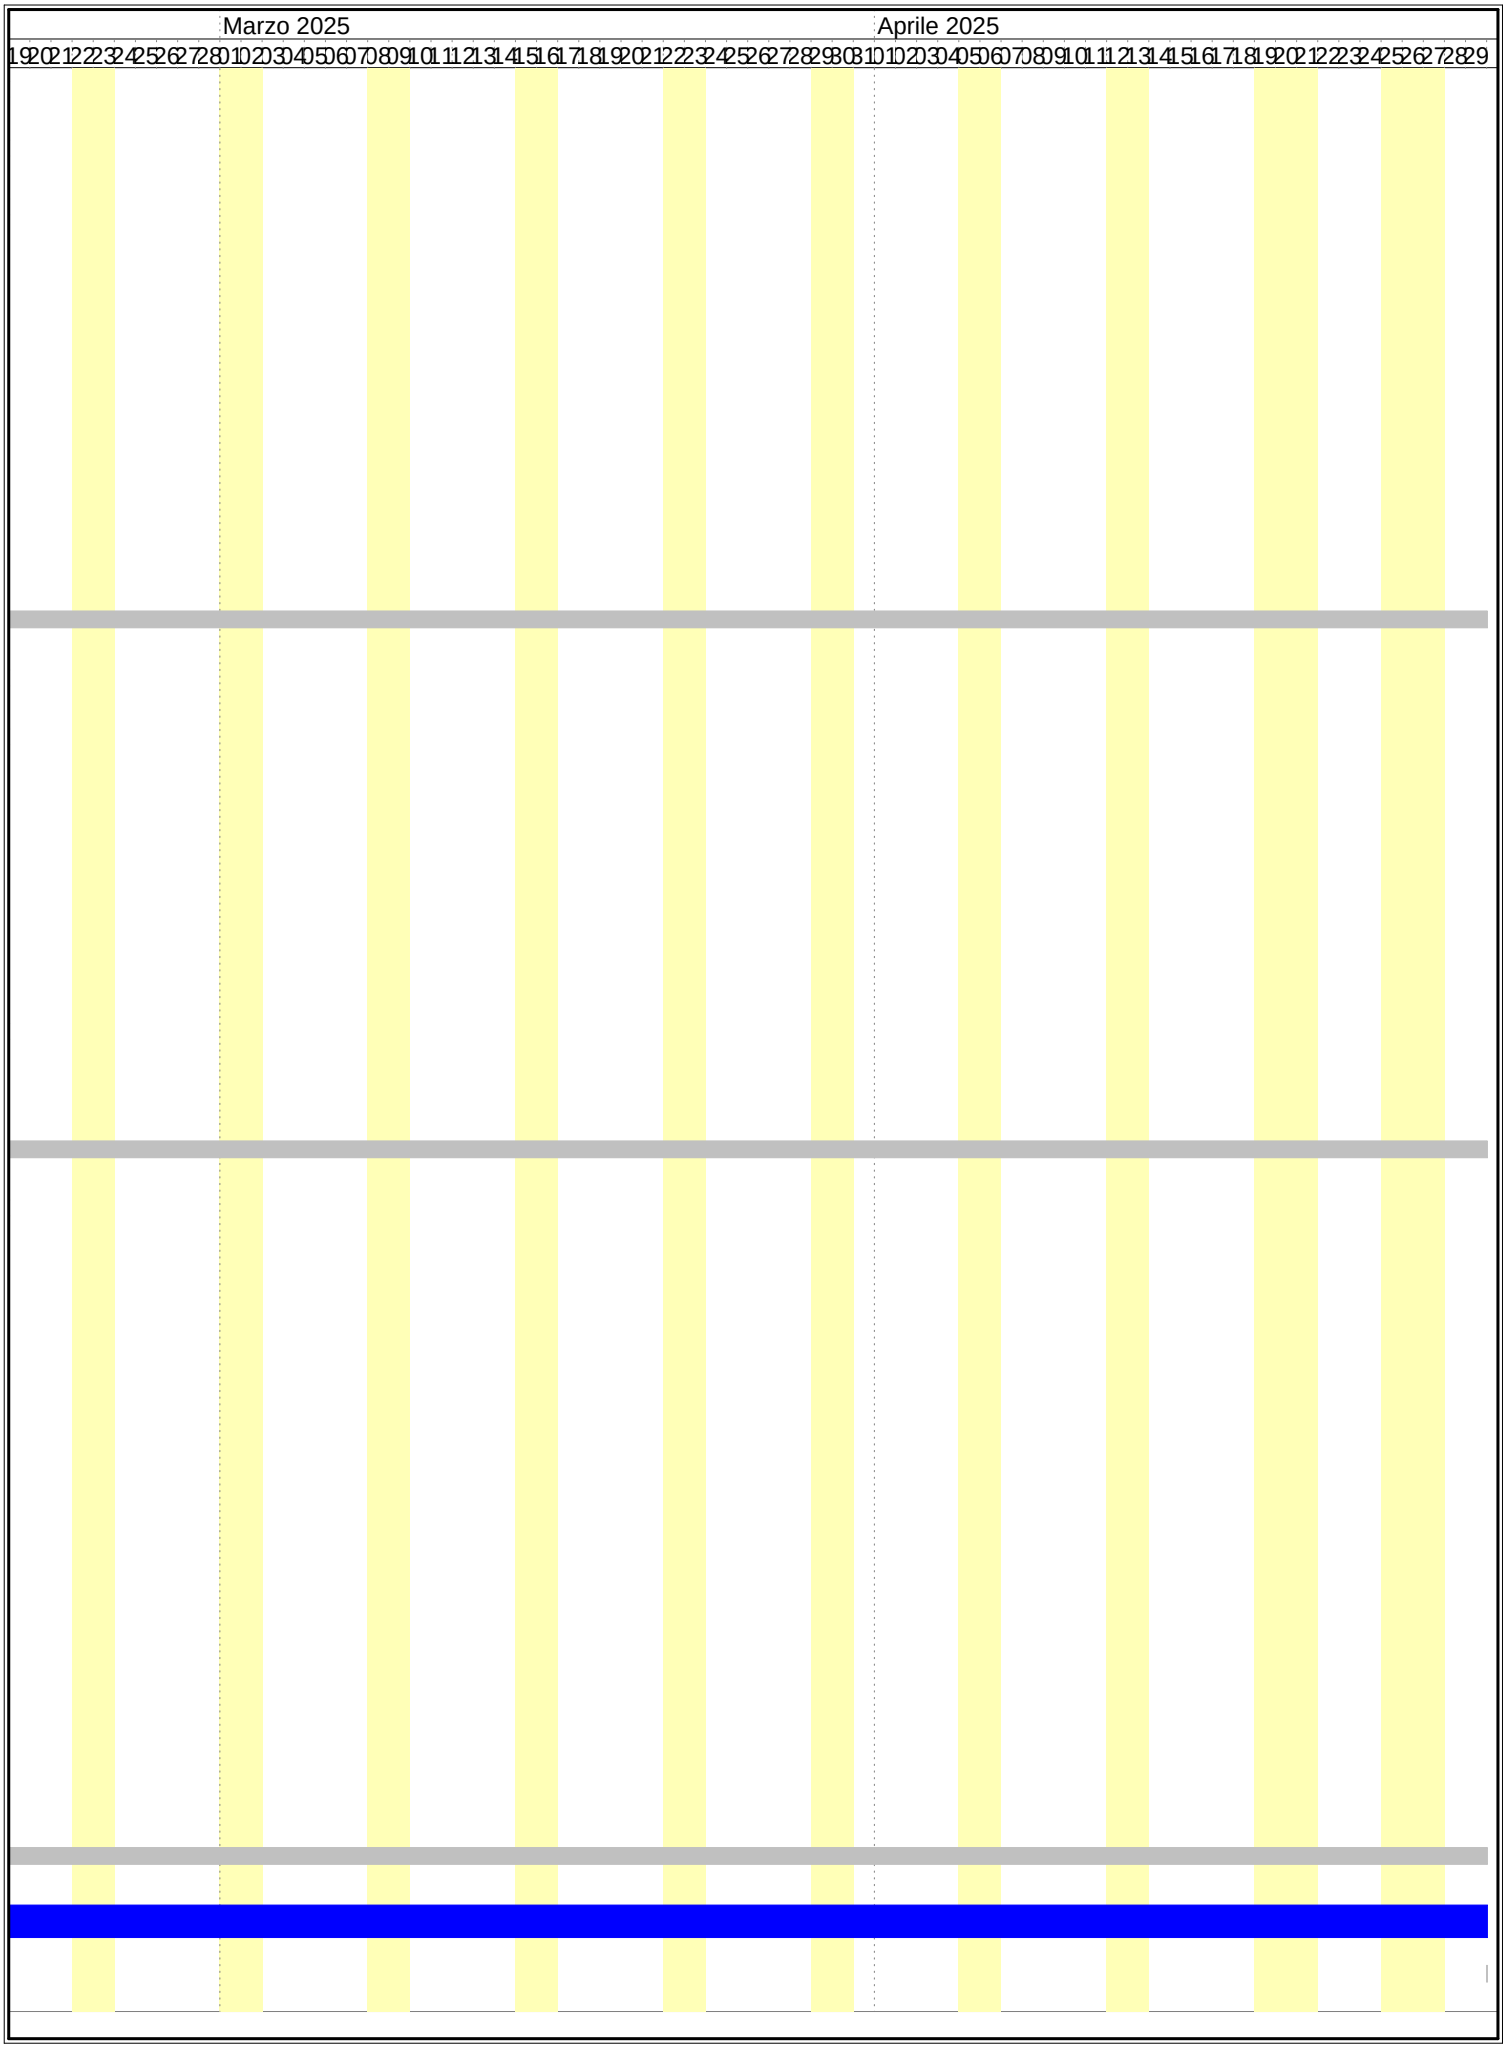


COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA

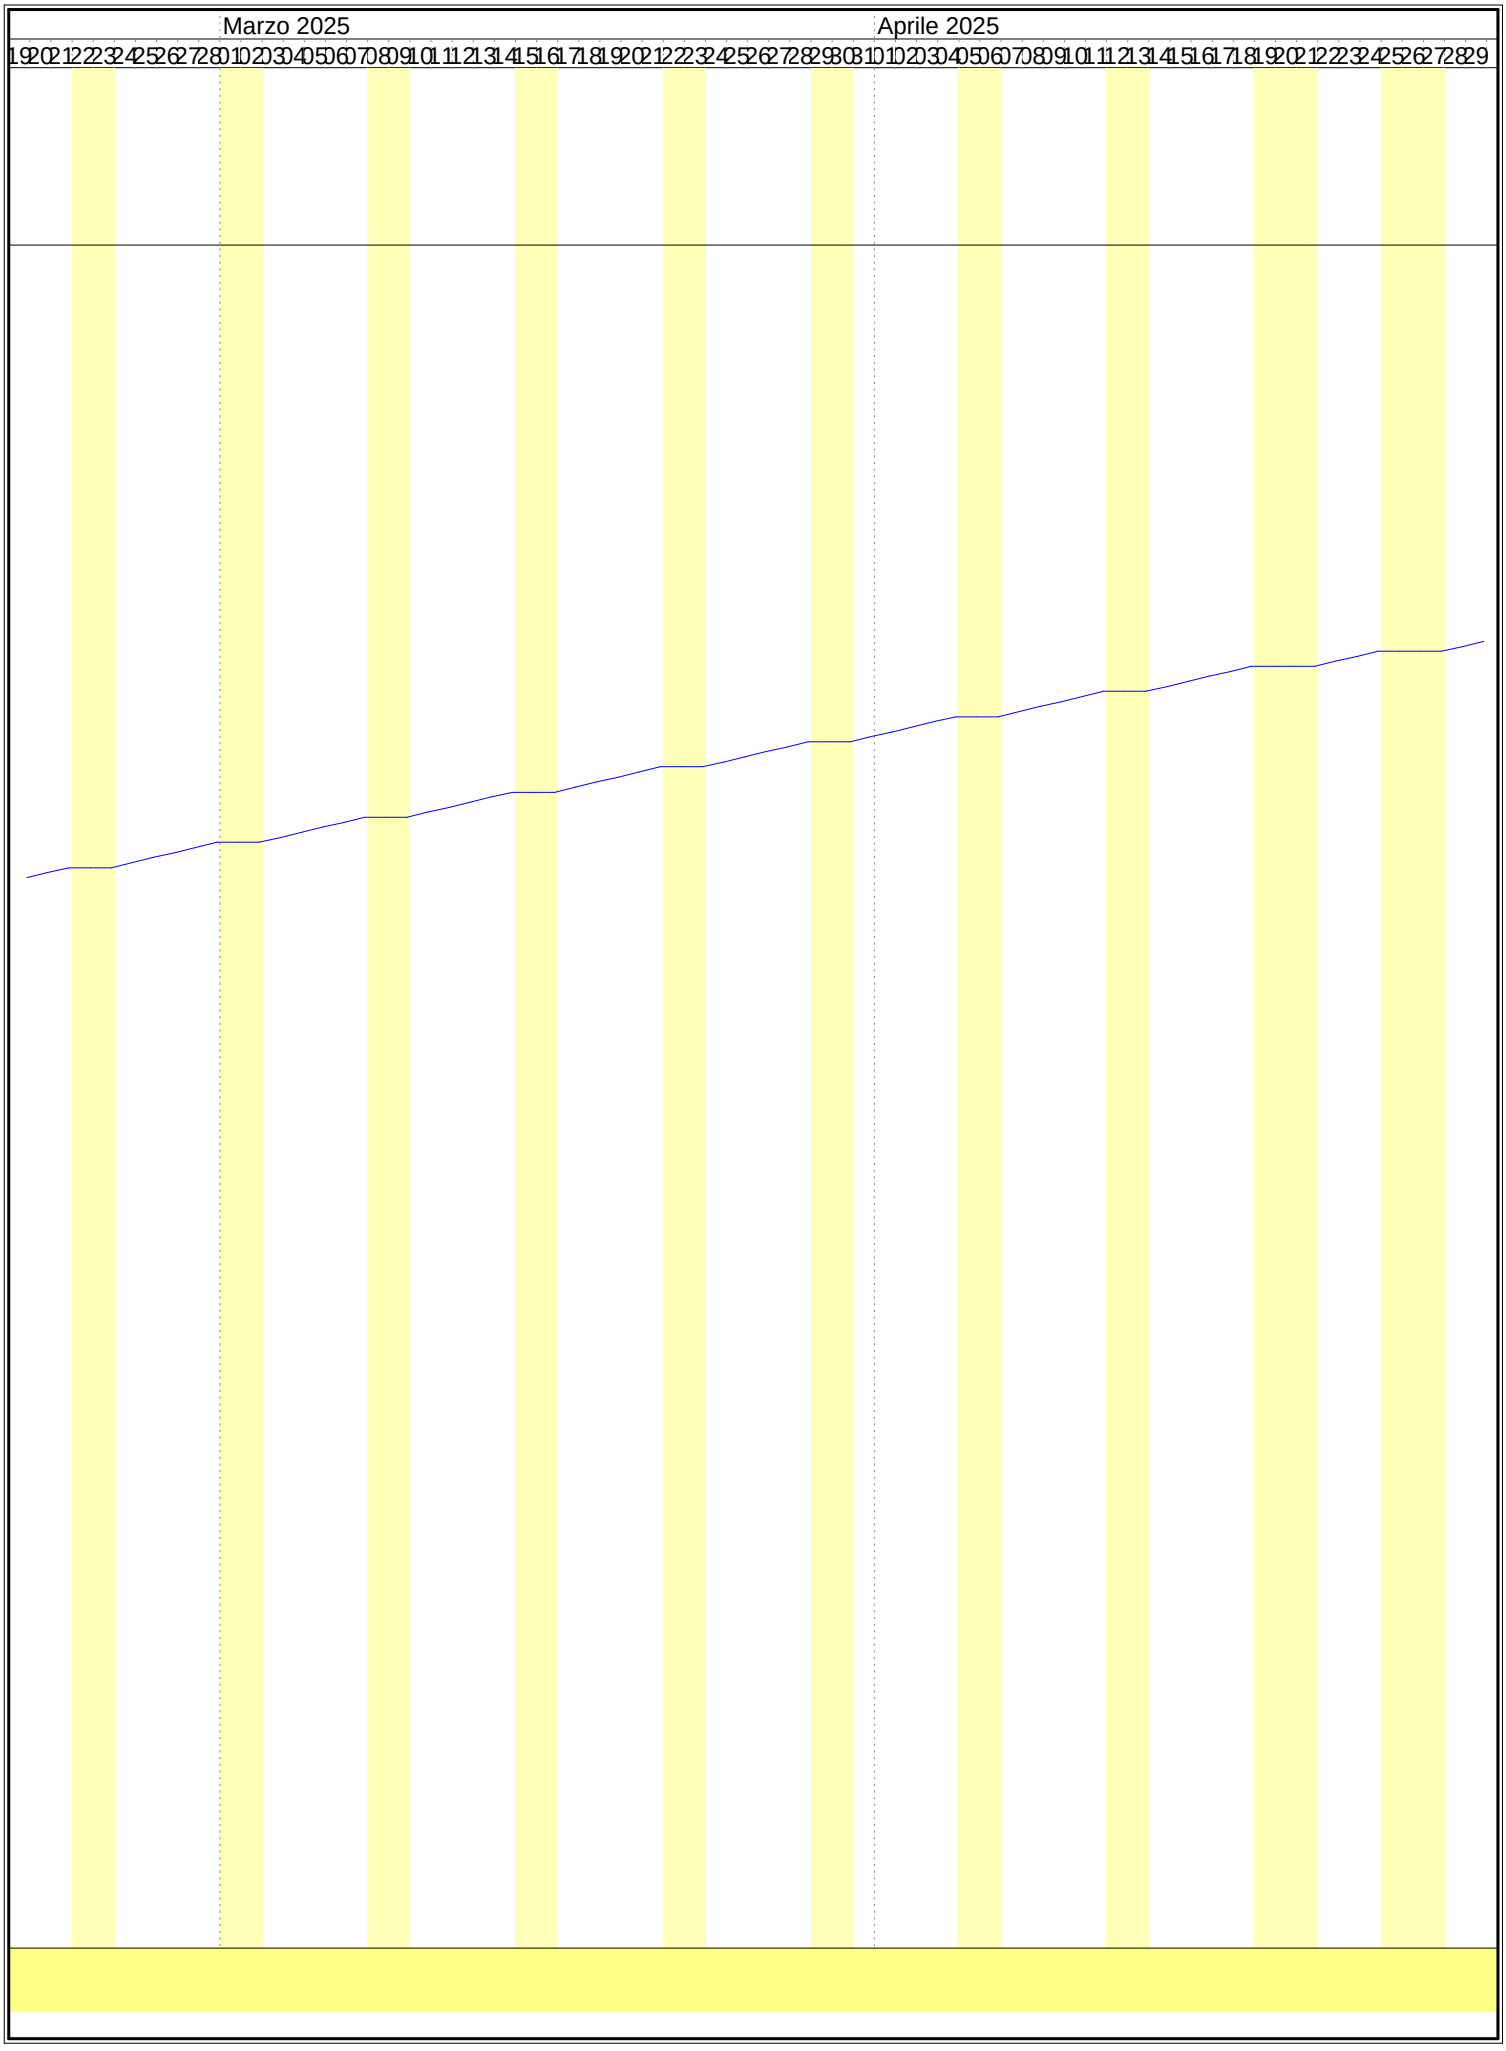

Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

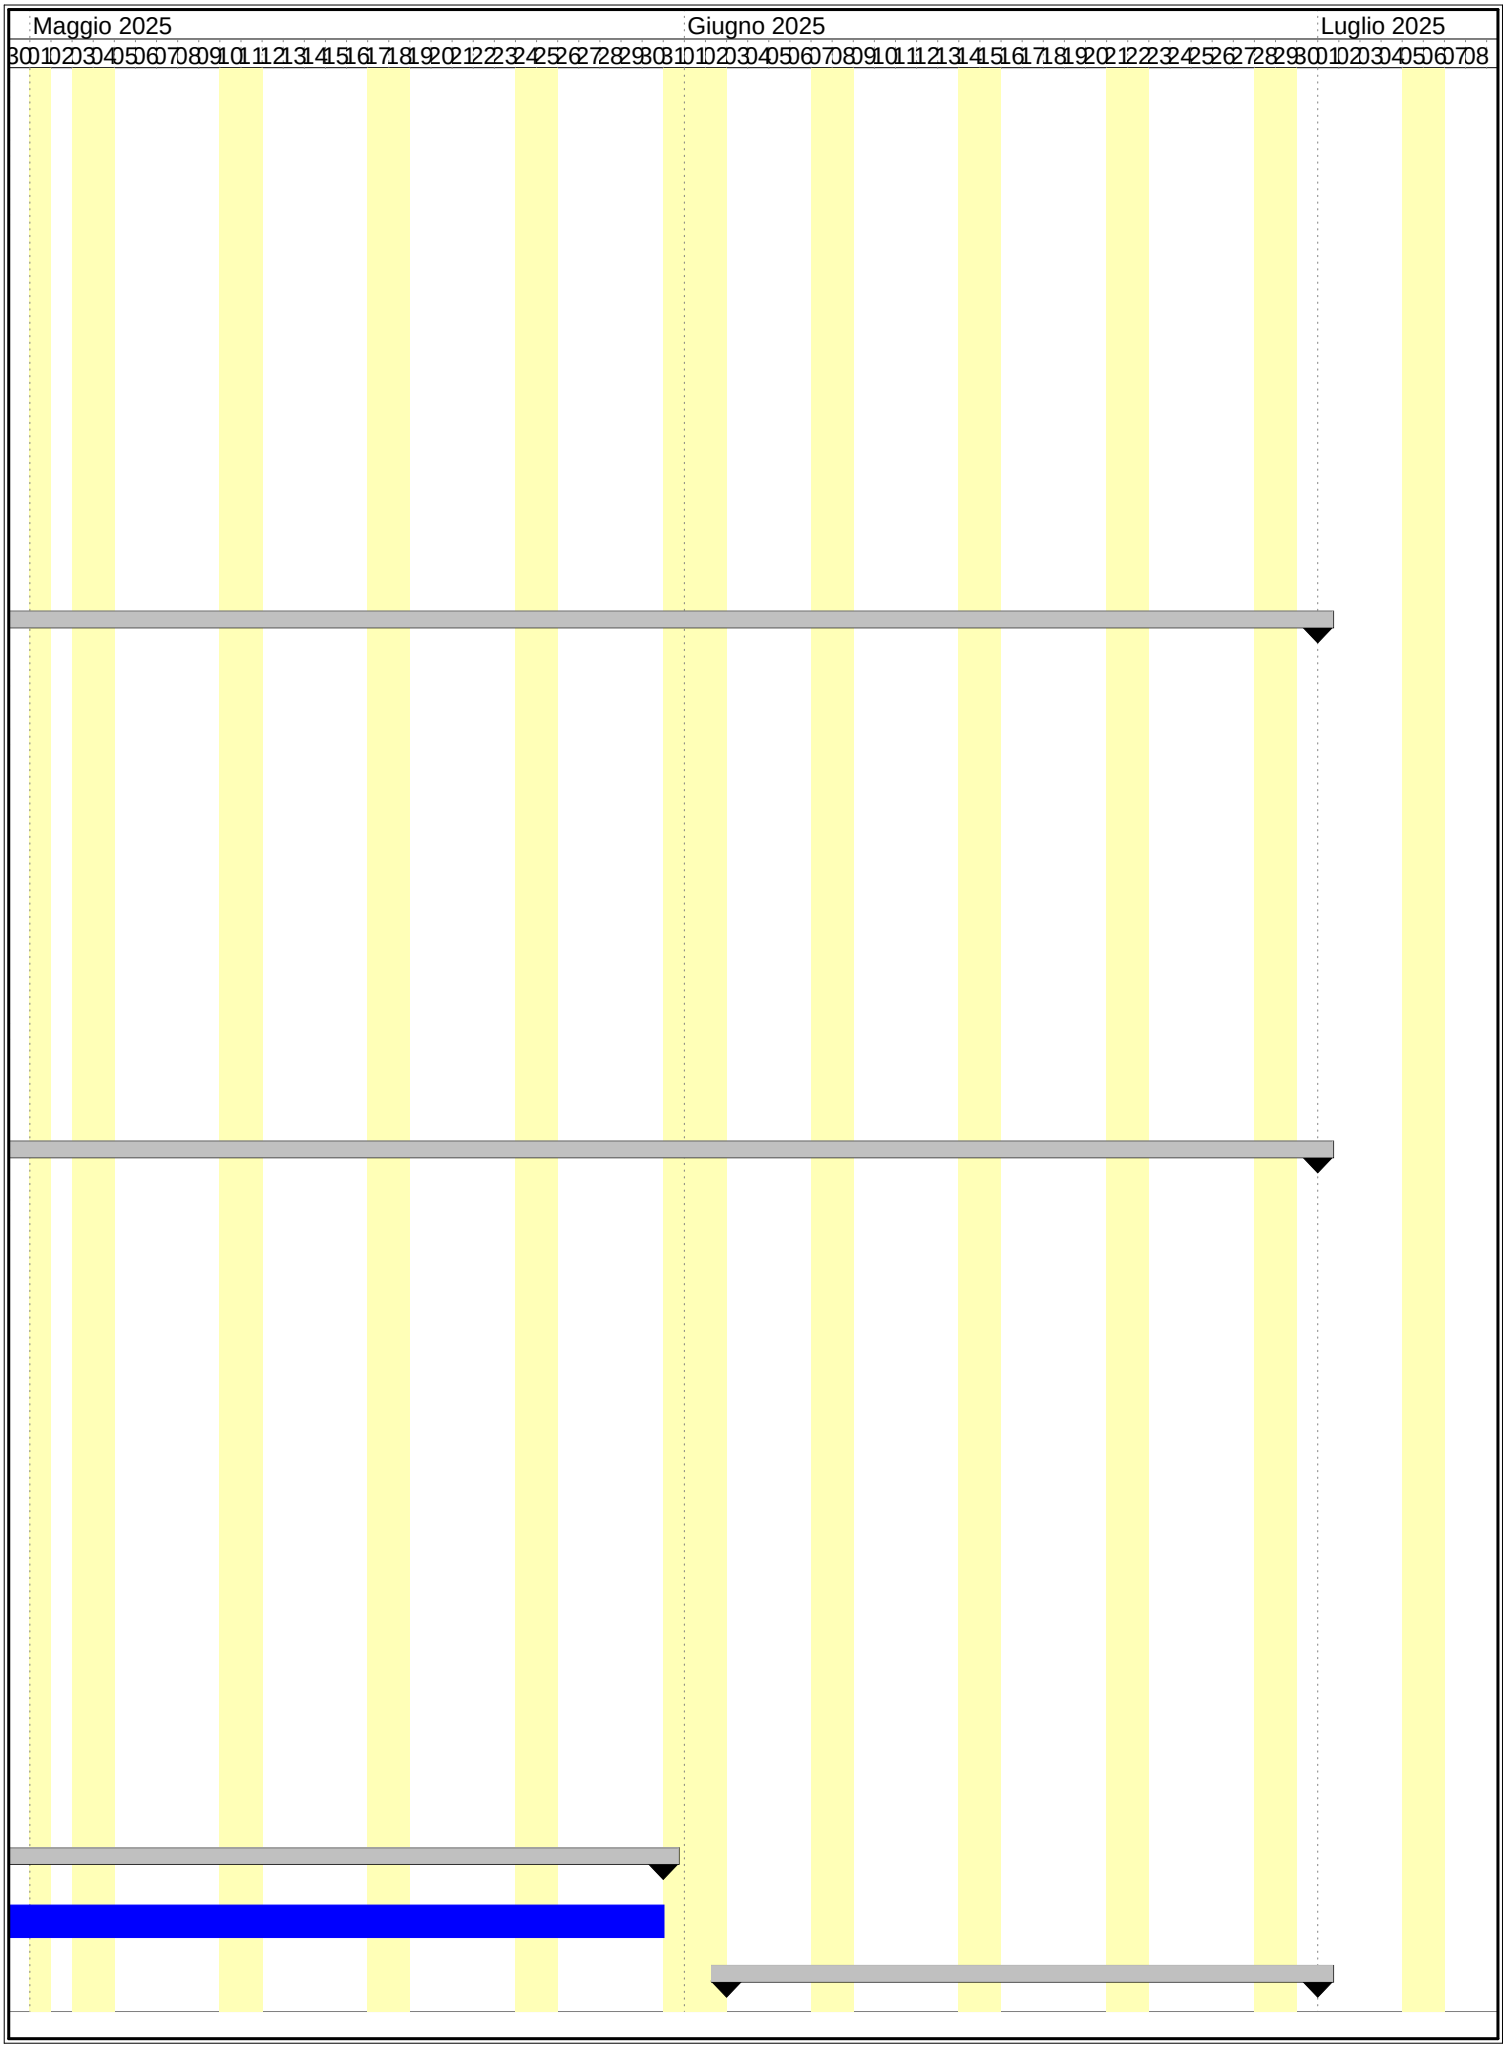

Gennaio 2025
Febbraio 2025
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 0 1 1 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

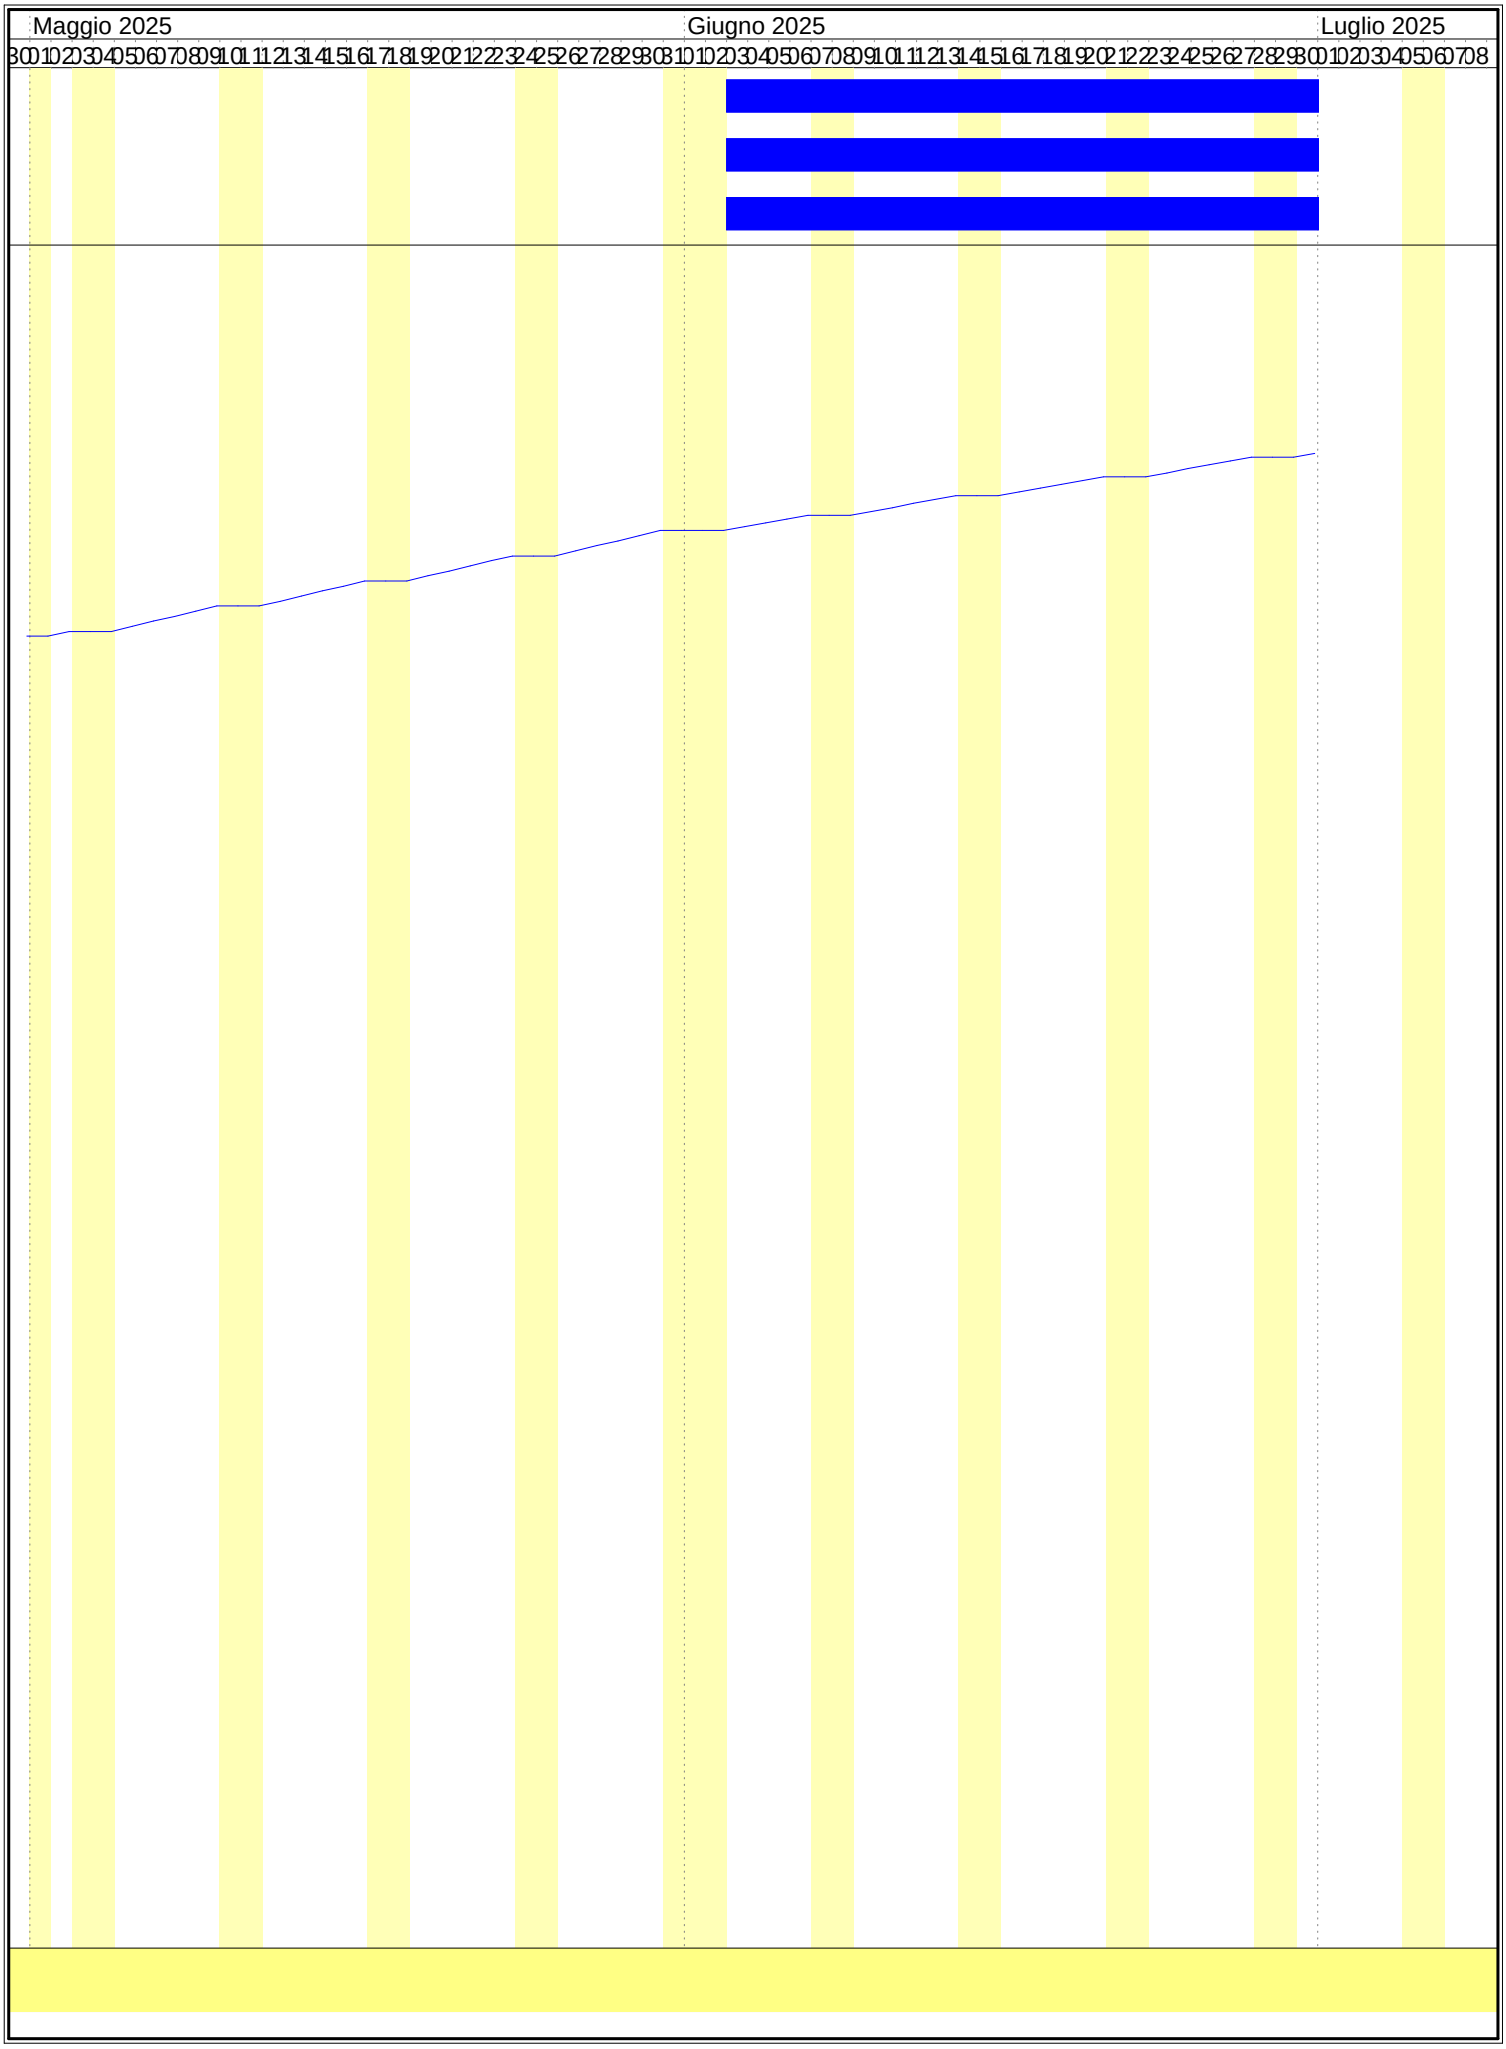

Gennaio 2025
Febbraio 2025
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18



COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA


Marzo 2025
Aprile 2025
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025
30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08


Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025
30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08

Comune di Monesi di Triora

Provincia di Imperia

Tabella Attività

OGGETTO: Servizio riguardante la progettazione definitiva relativamente a: S.P. 97 delle Salse.
Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA

Il Tecnico
()

_____

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	**11´801,20**	**1,320**	**01/07/2024**	**31/07/2024**	**23**	**31**
*** LAVORI IN ECONOMIA**	**11´801,20**	**1,320**	**01/07/2024**	**31/07/2024**	**23**	**31**
*** * Lavori in economia**	**11´801,20**	**1,320**	**01/07/2024**	**31/07/2024**	**23**	**31**
* * * Operaio Edile IV Livello	1´564,00	0,175	01/07/2024	31/07/2024	23	31
* * * Operaio Edile Specializzato	1´487,60	0,166	01/07/2024	31/07/2024	23	31
* * * Operaio Edile Qualificato	1´382,00	0,155	01/07/2024	31/07/2024	23	31
* * * Operaio Edile Comune	1´242,80	0,139	01/07/2024	31/07/2024	23	31
* * * Autocarro da 15,01 t fino a 18,00 t	2´716,40	0,304	01/07/2024	31/07/2024	23	31
* * * Escavatore oltre 8 t fino a 13 t.	3´408,40	0,381	01/07/2024	31/07/2024	23	31
Lavori a CORPO	**881´930,28**	**98,680**	**01/08/2024**	**30/06/2025**	**228**	**334**
*** LAVORI TORRENTE BAVERA**	**153´083,60**	**17,129**	**01/08/2024**	**29/11/2024**	**85**	**121**
*** * Movimento Terra**	**66´115,40**	**7,398**	**01/08/2024**	**30/09/2024**	**42**	**61**
* * * Scavo comune in rocce tenere per quantitativi > 500 mc	32´151,60	3,597	01/08/2024	30/09/2024	42	61
* * * Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	3´369,60	0,377	01/08/2024	30/09/2024	42	61
* * * Riempimento esclusi rullatura e materiali di riempimento	24´710,40	2,765	01/08/2024	30/09/2024	42	61
* * * Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o mattoni mezzo mecc.	5´883,80	0,658	01/08/2024	30/09/2024	42	61
*** * Opere Idrauliche**	**86´968,20**	**9,731**	**01/10/2024**	**29/11/2024**	**43**	**60**
* * * PPO massi 2°cat.via mare >300 t/g entro 3 miglia zona carico	86´968,20	9,731	01/10/2024	29/11/2024	43	60
*** COSTRUZIONE PONTE**	**728´846,68**	**81,551**	**02/09/2024**	**30/06/2025**	**207**	**302**
*** * Cementi Armati**	**183´413,48**	**20,522**	**02/09/2024**	**31/10/2024**	**44**	**60**
* * * Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	1´248,00	0,140	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco.	780,00	0,087	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco.	2´184,00	0,244	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco.	780,00	0,087	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * per diametro esterno pari a 200-219 mm.	75´014,64	8,393	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett	19´146,24	2,142	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Casseforme tavole abete - fondazioni.	12´649,53	1,415	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Calcestruzzo XC3 S4 C30/37. RAPP. A/C 0,55	32´468,41	3,633	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Getto in opera cls - elevazioni.	6´394,34	0,715	02/09/2024	31/10/2024	44	60
* * * Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.	32´748,32	3,664	02/09/2024	31/10/2024	44	60
*** * Carpenteria metallica ponte**	**499´280,00**	**55,865**	**01/10/2024**	**30/05/2025**	**166**	**242**
* * * Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE	499´280,00	55,865	01/10/2024	30/05/2025	166	242

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
*** * Opere stradali**	**46´153,20**	**5,164**	**03/06/2025**	**30/06/2025**	**20**	**28**
* * * per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - Imperia	20´470,00	2,290	03/06/2025	30/06/2025	20	28
* * * Barriere strad. di sic. classe H2 - B.P.	19´430,40	2,174	03/06/2025	30/06/2025	20	28
* * * Sola posa barriera strad acciaio H2	6´252,80	0,700	03/06/2025	30/06/2025	20	28

Data, 15/05/2024

Tecnico

Comune di Monesi di Triora

Provincia di Imperia

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Servizio riguardante la progettazione definitiva relativamente a: S.P. 97 delle Salse.
Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

COMMITTENTE: PROVINCIA DI IMPERIA

, 15/05/2024

Il Tecnico
()

_____

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
01/07/2024	513,10	513,10	0,057
02/07/2024	513,10	1´026,19	0,115
03/07/2024	513,10	1´539,29	0,172
04/07/2024	513,10	2´052,38	0,230
05/07/2024	513,10	2´565,48	0,287
08/07/2024	513,10	3´078,57	0,344
09/07/2024	513,10	3´591,67	0,402
10/07/2024	513,10	4´104,77	0,459
11/07/2024	513,10	4´617,86	0,517
12/07/2024	513,10	5´130,96	0,574
15/07/2024	513,10	5´644,05	0,632
16/07/2024	513,10	6´157,15	0,689
17/07/2024	513,10	6´670,24	0,746
18/07/2024	513,10	7´183,34	0,804
19/07/2024	513,10	7´696,43	0,861
22/07/2024	513,10	8´209,53	0,919
23/07/2024	513,10	8´722,63	0,976
24/07/2024	513,10	9´235,72	1,033
25/07/2024	513,10	9´748,82	1,091
26/07/2024	513,10	10´261,91	1,148
29/07/2024	513,10	10´775,01	1,206
30/07/2024	513,10	11´288,10	1,263
31/07/2024	513,09	11´801,19	1,320
01/08/2024	1´574,18	13´375,37	1,497
02/08/2024	1´574,18	14´949,55	1,673
05/08/2024	1´574,18	16´523,72	1,849
06/08/2024	1´574,18	18´097,90	2,025
07/08/2024	1´574,18	19´672,08	2,201
08/08/2024	1´574,18	21´246,25	2,377
09/08/2024	1´574,18	22´820,43	2,553
12/08/2024	1´574,18	24´394,60	2,730
13/08/2024	1´574,18	25´968,78	2,906
14/08/2024	1´574,18	27´542,96	3,082
16/08/2024	1´574,18	29´117,13	3,258
19/08/2024	1´574,18	30´691,31	3,434
20/08/2024	1´574,18	32´265,48	3,610
21/08/2024	1´574,18	33´839,66	3,786
22/08/2024	1´574,18	35´413,84	3,962
23/08/2024	1´574,18	36´988,01	4,139
26/08/2024	1´574,18	38´562,19	4,315
27/08/2024	1´574,18	40´136,37	4,491
28/08/2024	1´574,18	41´710,54	4,667
29/08/2024	1´574,18	43´284,72	4,843
30/08/2024	1´574,18	44´858,89	5,019
02/09/2024	5´742,66	50´601,56	5,662
03/09/2024	5´742,66	56´344,22	6,304
04/09/2024	5´742,66	62´086,89	6,947
05/09/2024	5´742,66	67´829,55	7,589
06/09/2024	5´742,66	73´572,22	8,232
09/09/2024	5´742,66	79´314,88	8,875
10/09/2024	5´742,66	85´057,54	9,517
11/09/2024	5´742,66	90´800,21	10,160
12/09/2024	5´742,66	96´542,87	10,802
13/09/2024	5´742,66	102´285,54	11,445
16/09/2024	5´742,66	108´028,20	12,087
17/09/2024	5´742,66	113´770,86	12,730
18/09/2024	5´742,66	119´513,53	13,372
19/09/2024	5´742,66	125´256,19	14,015
20/09/2024	5´742,66	130´998,86	14,658
23/09/2024	5´742,66	136´741,52	15,300
24/09/2024	5´742,66	142´484,19	15,943
25/09/2024	5´742,66	148´226,85	16,585
26/09/2024	5´742,66	153´969,51	17,228

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
27/09/2024	5´742,66	159´712,18	17,870
30/09/2024	5´742,66	165´454,84	18,513
01/10/2024	9´198,72	174´653,55	19,542
02/10/2024	9´198,72	183´852,27	20,571
03/10/2024	9´198,72	193´050,98	21,601
04/10/2024	9´198,72	202´249,70	22,630
07/10/2024	9´198,72	211´448,41	23,659
08/10/2024	9´198,72	220´647,13	24,688
09/10/2024	9´198,72	229´845,84	25,718
10/10/2024	9´198,72	239´044,56	26,747
11/10/2024	9´198,72	248´243,27	27,776
14/10/2024	9´198,72	257´441,99	28,805
15/10/2024	9´198,72	266´640,70	29,835
16/10/2024	9´198,72	275´839,42	30,864
17/10/2024	9´198,72	285´038,13	31,893
18/10/2024	9´198,72	294´236,85	32,922
21/10/2024	9´198,72	303´435,56	33,952
22/10/2024	9´198,72	312´634,28	34,981
23/10/2024	9´198,72	321´832,99	36,010
24/10/2024	9´198,72	331´031,71	37,039
25/10/2024	9´198,72	340´230,42	38,069
28/10/2024	9´198,72	349´429,14	39,098
29/10/2024	9´198,72	358´627,85	40,127
30/10/2024	9´198,72	367´826,57	41,156
31/10/2024	9´198,73	377´025,30	42,186
04/11/2024	5´030,23	382´055,52	42,748
05/11/2024	5´030,23	387´085,75	43,311
06/11/2024	5´030,23	392´115,98	43,874
07/11/2024	5´030,23	397´146,21	44,437
08/11/2024	5´030,23	402´176,43	45,000
11/11/2024	5´030,23	407´206,66	45,563
12/11/2024	5´030,23	412´236,89	46,125
13/11/2024	5´030,23	417´267,11	46,688
14/11/2024	5´030,23	422´297,34	47,251
15/11/2024	5´030,23	427´327,57	47,814
18/11/2024	5´030,23	432´357,80	48,377
19/11/2024	5´030,23	437´388,02	48,940
20/11/2024	5´030,23	442´418,25	49,502
21/11/2024	5´030,23	447´448,48	50,065
22/11/2024	5´030,23	452´478,70	50,628
25/11/2024	5´030,23	457´508,93	51,191
26/11/2024	5´030,23	462´539,16	51,754
27/11/2024	5´030,23	467´569,39	52,317
28/11/2024	5´030,23	472´599,61	52,879
29/11/2024	5´030,23	477´629,84	53,442
02/12/2024	3´007,71	480´637,55	53,779
03/12/2024	3´007,71	483´645,27	54,115
04/12/2024	3´007,71	486´652,98	54,452
05/12/2024	3´007,71	489´660,69	54,788
06/12/2024	3´007,71	492´668,40	55,125
09/12/2024	3´007,71	495´676,11	55,461
10/12/2024	3´007,71	498´683,82	55,798
11/12/2024	3´007,71	501´691,53	56,134
12/12/2024	3´007,71	504´699,24	56,471
13/12/2024	3´007,71	507´706,95	56,808
16/12/2024	3´007,71	510´714,66	57,144
17/12/2024	3´007,71	513´722,37	57,481
18/12/2024	3´007,71	516´730,08	57,817
19/12/2024	3´007,71	519´737,80	58,154
20/12/2024	3´007,71	522´745,51	58,490
23/12/2024	3´007,71	525´753,22	58,827
24/12/2024	3´007,71	528´760,93	59,163
27/12/2024	3´007,71	531´768,64	59,500

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
30/12/2024	3´007,71	534´776,35	59,836
31/12/2024	3´007,71	537´784,06	60,173
02/01/2025	3´007,71	540´791,77	60,509
03/01/2025	3´007,71	543´799,48	60,846
07/01/2025	3´007,71	546´807,19	61,182
08/01/2025	3´007,71	549´814,90	61,519
09/01/2025	3´007,71	552´822,61	61,856
10/01/2025	3´007,71	555´830,33	62,192
13/01/2025	3´007,71	558´838,04	62,529
14/01/2025	3´007,71	561´845,75	62,865
15/01/2025	3´007,71	564´853,46	63,202
16/01/2025	3´007,71	567´861,17	63,538
17/01/2025	3´007,71	570´868,88	63,875
20/01/2025	3´007,71	573´876,59	64,211
21/01/2025	3´007,71	576´884,30	64,548
22/01/2025	3´007,71	579´892,01	64,884
23/01/2025	3´007,71	582´899,72	65,221
24/01/2025	3´007,71	585´907,43	65,557
27/01/2025	3´007,71	588´915,14	65,894
28/01/2025	3´007,71	591´922,86	66,231
29/01/2025	3´007,71	594´930,57	66,567
30/01/2025	3´007,71	597´938,28	66,904
31/01/2025	3´007,71	600´945,99	67,240
03/02/2025	3´007,71	603´953,70	67,577
04/02/2025	3´007,71	606´961,41	67,913
05/02/2025	3´007,71	609´969,12	68,250
06/02/2025	3´007,71	612´976,83	68,586
07/02/2025	3´007,71	615´984,54	68,923
10/02/2025	3´007,71	618´992,25	69,259
11/02/2025	3´007,71	621´999,96	69,596
12/02/2025	3´007,71	625´007,68	69,932
13/02/2025	3´007,71	628´015,39	70,269
14/02/2025	3´007,71	631´023,10	70,605
17/02/2025	3´007,71	634´030,81	70,942
18/02/2025	3´007,71	637´038,52	71,279
19/02/2025	3´007,71	640´046,23	71,615
20/02/2025	3´007,71	643´053,94	71,952
21/02/2025	3´007,71	646´061,65	72,288
24/02/2025	3´007,71	649´069,36	72,625
25/02/2025	3´007,71	652´077,07	72,961
26/02/2025	3´007,71	655´084,78	73,298
27/02/2025	3´007,71	658´092,49	73,634
28/02/2025	3´007,71	661´100,21	73,971
03/03/2025	3´007,71	664´107,92	74,307
04/03/2025	3´007,71	667´115,63	74,644
05/03/2025	3´007,71	670´123,34	74,980
06/03/2025	3´007,71	673´131,05	75,317
07/03/2025	3´007,71	676´138,76	75,653
10/03/2025	3´007,71	679´146,47	75,990
11/03/2025	3´007,71	682´154,18	76,327
12/03/2025	3´007,71	685´161,89	76,663
13/03/2025	3´007,71	688´169,60	77,000
14/03/2025	3´007,71	691´177,31	77,336
17/03/2025	3´007,71	694´185,02	77,673
18/03/2025	3´007,71	697´192,74	78,009
19/03/2025	3´007,71	700´200,45	78,346
20/03/2025	3´007,71	703´208,16	78,682
21/03/2025	3´007,71	706´215,87	79,019
24/03/2025	3´007,71	709´223,58	79,355
25/03/2025	3´007,71	712´231,29	79,692
26/03/2025	3´007,71	715´239,00	80,028
27/03/2025	3´007,71	718´246,71	80,365
28/03/2025	3´007,71	721´254,42	80,701

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
31/03/2025	3´007,71	724´262,13	81,038
01/04/2025	3´007,71	727´269,84	81,375
02/04/2025	3´007,71	730´277,55	81,711
03/04/2025	3´007,71	733´285,27	82,048
04/04/2025	3´007,71	736´292,98	82,384
07/04/2025	3´007,71	739´300,69	82,721
08/04/2025	3´007,71	742´308,40	83,057
09/04/2025	3´007,71	745´316,11	83,394
10/04/2025	3´007,71	748´323,82	83,730
11/04/2025	3´007,71	751´331,53	84,067
14/04/2025	3´007,71	754´339,24	84,403
15/04/2025	3´007,71	757´346,95	84,740
16/04/2025	3´007,71	760´354,66	85,076
17/04/2025	3´007,71	763´362,37	85,413
18/04/2025	3´007,71	766´370,08	85,749
22/04/2025	3´007,71	769´377,80	86,086
23/04/2025	3´007,71	772´385,51	86,423
24/04/2025	3´007,71	775´393,22	86,759
28/04/2025	3´007,71	778´400,93	87,096
29/04/2025	3´007,71	781´408,64	87,432
30/04/2025	3´007,71	784´416,35	87,769
02/05/2025	3´007,71	787´424,06	88,105
05/05/2025	3´007,71	790´431,77	88,442
06/05/2025	3´007,71	793´439,48	88,778
07/05/2025	3´007,71	796´447,19	89,115
08/05/2025	3´007,71	799´454,90	89,451
09/05/2025	3´007,71	802´462,61	89,788
12/05/2025	3´007,71	805´470,33	90,124
13/05/2025	3´007,71	808´478,04	90,461
14/05/2025	3´007,71	811´485,75	90,797
15/05/2025	3´007,71	814´493,46	91,134
16/05/2025	3´007,71	817´501,17	91,471
19/05/2025	3´007,71	820´508,88	91,807
20/05/2025	3´007,71	823´516,59	92,144
21/05/2025	3´007,71	826´524,30	92,480
22/05/2025	3´007,71	829´532,01	92,817
23/05/2025	3´007,71	832´539,72	93,153
26/05/2025	3´007,71	835´547,43	93,490
27/05/2025	3´007,71	838´555,14	93,826
28/05/2025	3´007,71	841´562,86	94,163
29/05/2025	3´007,71	844´570,57	94,499
30/05/2025	3´007,71	847´578,28	94,836
03/06/2025	2´307,66	849´885,94	95,094
04/06/2025	2´307,66	852´193,60	95,352
05/06/2025	2´307,66	854´501,26	95,611
06/06/2025	2´307,66	856´808,92	95,869
09/06/2025	2´307,66	859´116,58	96,127
10/06/2025	2´307,66	861´424,24	96,385
11/06/2025	2´307,66	863´731,90	96,643
12/06/2025	2´307,66	866´039,56	96,902
13/06/2025	2´307,66	868´347,22	97,160
16/06/2025	2´307,66	870´654,88	97,418
17/06/2025	2´307,66	872´962,54	97,676
18/06/2025	2´307,66	875´270,20	97,934
19/06/2025	2´307,66	877´577,86	98,193
20/06/2025	2´307,66	879´885,52	98,451
23/06/2025	2´307,66	882´193,18	98,709
24/06/2025	2´307,66	884´500,84	98,967
25/06/2025	2´307,66	886´808,50	99,225
26/06/2025	2´307,66	889´116,16	99,484
27/06/2025	2´307,66	891´423,82	99,742
30/06/2025	2´307,66	893´731,48	100,000

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
Tecnico			
