Committente:

COMUNE DI ARENZANO

Via S. Pallavicino, 39 - 16011 Arenzano (GE)

Oggetto:

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DI ARENZANO
LOTTO 1: SCOGLIERA SOMMERSA DI PONENTE, RIFIORIMENTO SCOGLIERA PIAZZALE DEL MARE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Titolo elaborato:

PISTE DI CANTIERE : APPROFONDIMENTO

Progettista:

INGEPRO Ingegneri Associati

Corso Torino 17/6 sc.A - 16129 Genova
Tel. 010.5740568 - fax : 010.4211059
e-mail: studio@ingepro.eu - PEC: studio@pec.ingepro.eu
C.F. e P. IVA: 02726060995

Firmato digitalmente da
Riccardo Giammarini
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
C = IT

Revisione	Data	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:	Descrizione
0	02.08.2024	RX	SC	RG	Emissione

Nome file:	Scala:	Commessa:	Livello prog:	Elaborato:
P087.PF.R06.00_Piste-cantiere-approfondimento		P087	PF	R06

1. PISTE DI CANTIERE

La costruzione della **scogliera sommersa** avverrà esclusivamente da mare, pertanto non sono previste piste di cantiere.

Per il potenziamento della **scogliera del piazzale del mare** è previsto che parte della costruzione avvenga da terra: l'accesso da terra potrà avvenire come sotto rappresentato, senza la realizzazione di piste di cantiere.



Figura 1.1: stralci foto aerea con indicazione in tratteggio rosso dei possibili accessi alla scogliera da terra

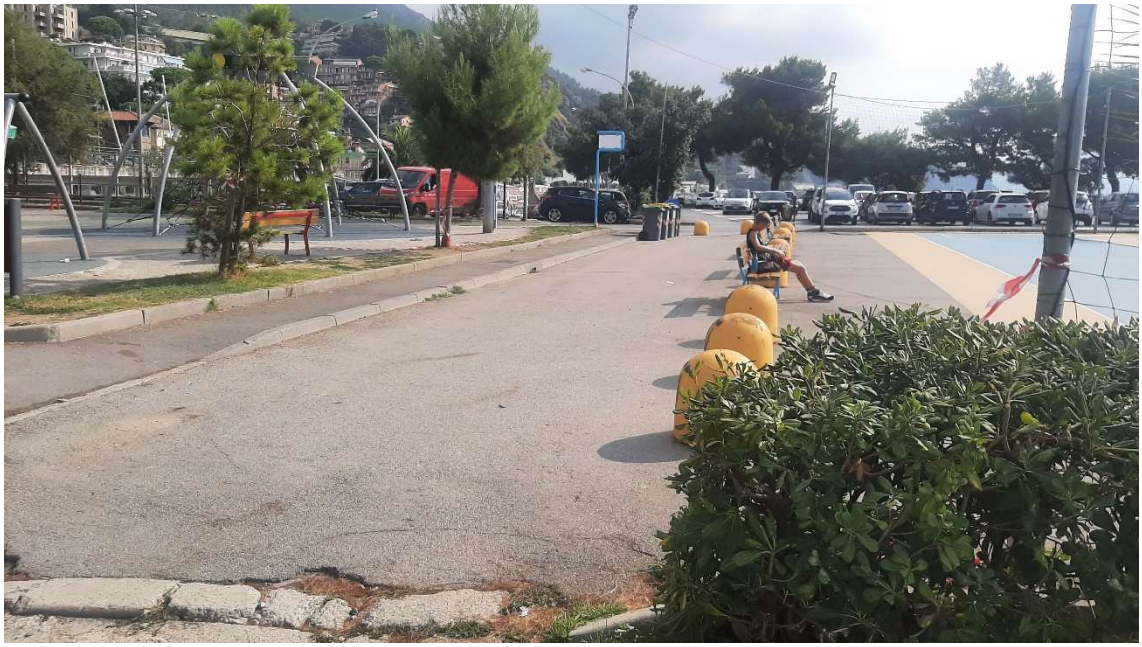


Foto 1.2: vista dell'accesso dal margine Nord del campo da basket



Foto 1.3: vista verso Nord dell'area in sponda sinistra del T. Cantarena dalla quale è possibile l'accesso alla scogliera



Foto 1.4: vista verso Sud dell'area in sponda sinistra del T. Cantarena dalla quale è possibile l'accesso alla scogliera

Per il transito dell'escavatore sulla scogliera potranno essere utilizzato pietrame di cava scelto e con percentuali di pelite inferiori al 5%, come previsto per i tratti di costa sensibile nei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" di cui alla D.G.R. 1209/2016 e n. 95/2017.
