AVAILABLE LANGUAGE: IT

Regione Liguria

Provincia di Savona

Comuni di Quiliano, Altare e Mallare

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

CRONOPROGRAMMA

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File:C24G&GWLI002P010R00 - Cronoprogramma

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	03/12/2024	Prima emissione	A. Leonetti	D. Morelli	L. Sblendido

INTRODUZIONE

L'impianto eolico in progetto è costituito da 5 aerogeneratori (anche detti WTG) di potenza nominale unitaria pari a 6 MWp, per una potenza nominale complessiva pari a 30 MW. L'impianto è integrato da un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW e corredato dalle opere di connessione e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso. Tutte le turbine e le opere di connessione ricadono all'interno dei confini comunali di Quiliano, Altare e Mallare, in provincia di Savona.

Per come riportato nella STMG (cod. pratica: 202402184), la centrale utente verrà *collegata in antenna a 36 kV con la futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Magliano – Vado Ligure".*

L'energia elettrica prodotta dall'impianto concorrerà al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, coerentemente con gli accordi siglati a livello comunitario dall'Italia.

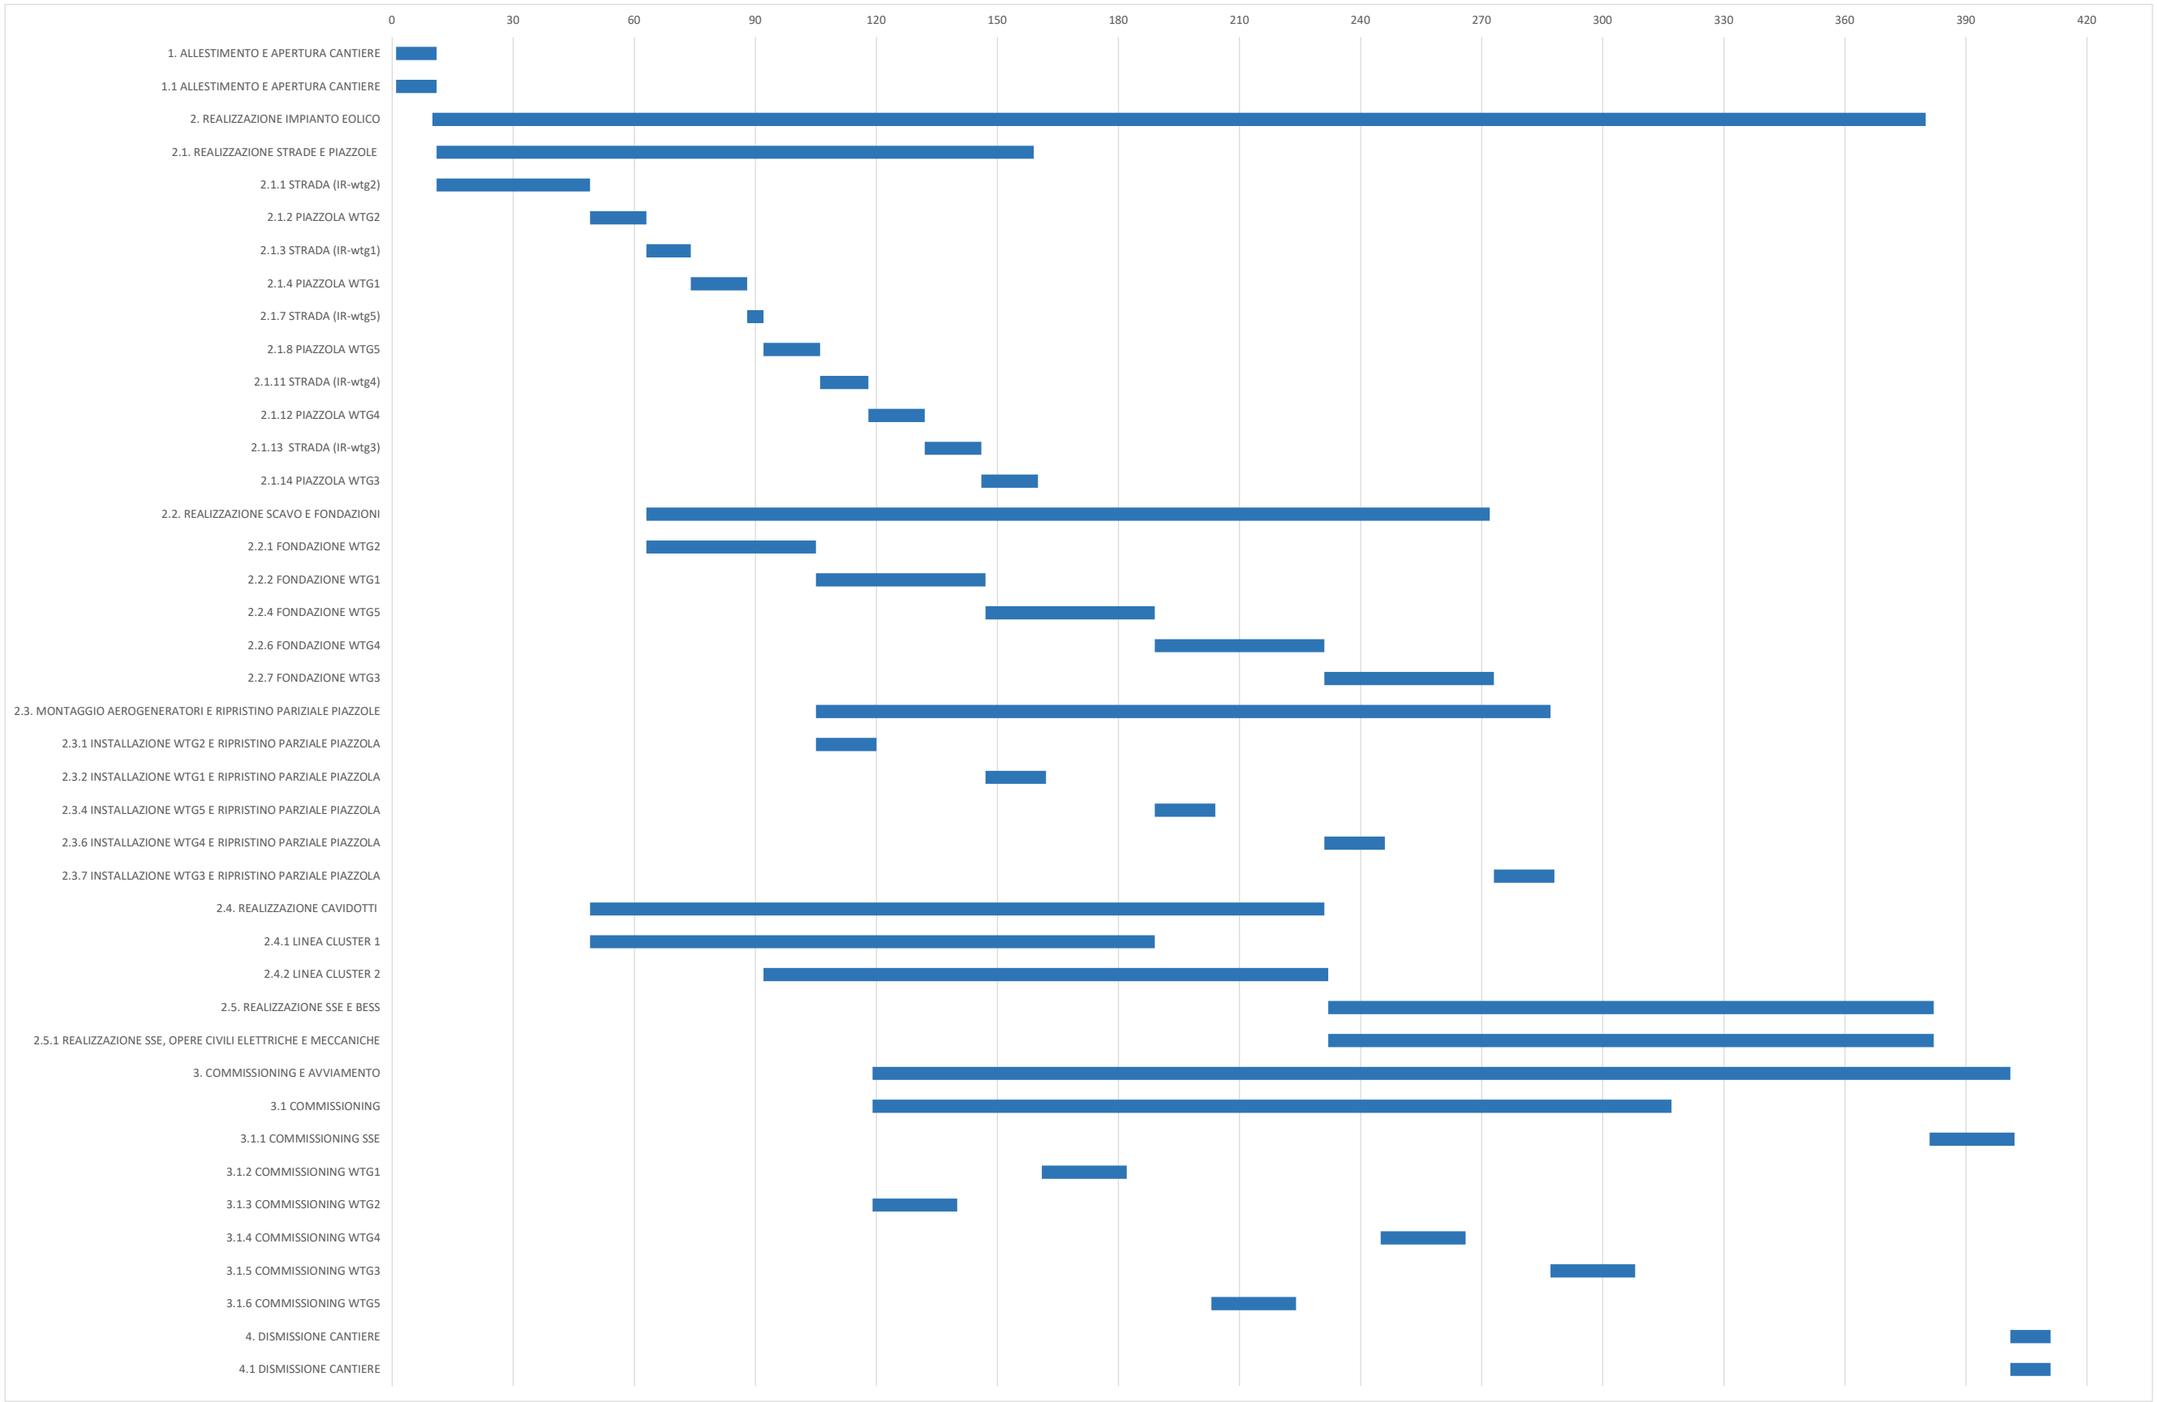
L'impianto sarà destinato a funzionare in parallelo alla rete elettrica nazionale, in modo da immettere energia da fonte rinnovabile in rete; l'iniziativa, oltre a contribuire al potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su territorio nazionale, sarà a servizio dei futuri fabbisogni energetici comunali.

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]
PARCO EOLICO QUILIANO (SV)			
REALIZZAZIONE QUILIANO	**410**	**-**	**-**
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	10	10
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	10	10
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO	10	381	370
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE	11	159	148
2.1.1 STRADA (IR-wtg2)	11	48	38
2.1.2 PIAZZOLA WTG2	49	62	14
2.1.3 STRADA (IR-wtg1)	63	73	11
2.1.4 PIAZZOLA WTG1	74	87	14
2.1.7 STRADA (IR-wtg5)	88	91	4
2.1.8 PIAZZOLA WTG5	92	105	14

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]
2.1.11 STRADA (IR-wtg4)	106	117	12
2.1.12 PIAZZOLA WTG4	118	131	14
2.1.13 STRADA (IR-wtg3)	132	145	14
2.1.14 PIAZZOLA WTG3	146	159	14
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI	63	272	209
2.2.1 FONDAZIONE WTG2	63	104	42
2.2.2 FONDAZIONE WTG1	105	146	42
2.2.4 FONDAZIONE WTG5	147	188	42
2.2.6 FONDAZIONE WTG4	189	230	42
2.2.7 FONDAZIONE WTG3	231	272	42
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARIZIALE PIAZZOLE	105	287	182
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG2 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	105	119	15
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG1 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	147	161	15
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG5 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	189	203	15
2.3.6 INSTALLAZIONE WTG4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	231	245	15
2.3.7 INSTALLAZIONE WTG3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	273	287	15
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI	49	231	182
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	49	188	140
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	92	231	140
2.5. REALIZZAZIONE SSE E BESS	232	381	150
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	232	381	150
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO	119	401	282
3.1 COMMISSIONING	119	401	198
3.1.1 COMMISSIONING SSE	381	401	21
3.1.2 COMMISSIONING WTG1	161	181	21
3.1.3 COMMISSIONING WTG2	119	139	21
3.1.4 COMMISSIONING WTG4	245	265	21
3.1.5 COMMISSIONING WTG3	287	307	21
3.1.6 COMMISSIONING WTG5	203	223	21
4. DISMISSIONE CANTIERE	401	410	10
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	401	410	10

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido


0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE
2.1.1 STRADA (IR-wtg2)
2.1.2 PIAZZOLA WTG2
2.1.3 STRADA (IR-wtg1)
2.1.4 PIAZZOLA WTG1
2.1.7 STRADA (IR-wtg5)
2.1.8 PIAZZOLA WTG5
2.1.11 STRADA (IR-wtg4)
2.1.12 PIAZZOLA WTG4
2.1.13 STRADA (IR-wtg3)
2.1.14 PIAZZOLA WTG3
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI
2.2.1 FONDAZIONE WTG2
2.2.2 FONDAZIONE WTG1
2.2.4 FONDAZIONE WTG5
2.2.6 FONDAZIONE WTG4
2.2.7 FONDAZIONE WTG3
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARIZIALE PIAZZOLE
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG2 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG1 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG5 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA
2.3.6 INSTALLAZIONE WTG4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA
2.3.7 INSTALLAZIONE WTG3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI
2.4.1 LINEA CLUSTER 1
2.4.2 LINEA CLUSTER 2
2.5. REALIZZAZIONE SSE E BESS
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO
3.1 COMMISSIONING
3.1.1 COMMISSIONING SSE
3.1.2 COMMISSIONING WTG1
3.1.3 COMMISSIONING WTG2
3.1.4 COMMISSIONING WTG4
3.1.5 COMMISSIONING WTG3
3.1.6 COMMISSIONING WTG5
4. DISMISSIONE CANTIERE
4.1 DISMISSIONE CANTIERE
