REGIONE LIGURIA

COMUNE DI AMEGLIA

(Provincia di La Spezia)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SENZA NOME N.98666 IN LOCALITÀ LA FERRARA NEL COMUNE DI AMEGLIA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA LOTTO 2

OGGETTO:

ELABORATI GENERALI
Relazione sulla gestione delle materie

IL PROGETTISTA:

ethos engineering S.r.l.
Engineering and TecHnology for develOpment and Sustainability

Via San Giacomo della Vittoria, 64
15121 Alessandria - ITALY
Tel - fax +39 0131 235460
e-mail:info@ethosengineering.it
http://www.ethosengineering.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabrizio FOLTRAN

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI CIVILE AMB. INDUSTR. - INFORM.
FABRIZIO FOLTRAN
INGEGNERE
N° A-1506
SEZIONE A

Firmato digitalmente da:
FOLTRAN FABRIZIO
Firmato il 2025/10/23 17:34
Seriale Certificato: 3438324
Valido dal 29/03/2024 al 29/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DIRETTORE TECNICO
Ing. Andrea PANIZZA

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI CIVILE AMB. INDUSTR.- INFORM.
ANDREA PANIZZA
INGEGNERE
N° A-1217
SEZIONE A

Firmato digitalmente da:
Panizza Andrea
Firmato il 2025/10/24 09:27
Seriale Certificato: 3181121
Valido dal 11/01/2024 al 11/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL COMMITTENTE:
COMUNE DI AMEGLIA

COMMESSA	LOTTO	DETT.	TIPO	ARG.	PROGR.	REV.	FILE	SCALA	DATA CONSEGNA
ETH_37_23	02	PF	R	01	02	01	ETH_37_23_02PFR01_02_01.pdf		Ottobre 2025

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	Ottobre 2025	Aggiornamento	F.Foltran	F.Foltran	F.Foltran
00	Febbraio 2024	Emissione	F.Foltran	F.Foltran	F.Foltran

paper size:		plot style:	plot scale:
UNI A4		ETHOS.ctb	1:1

INDICE

1. GENERALITÀ 2

2. FABBISOGNI DI MATERIALI DA APPROVVIGIONARE DA CAVA AL NETTO DEI VOLUMI REIMPIEGATI 2

3. ESUBERI DI MATERIALI DI SCARTO PROVENIENTI DAGLI SCAVI 2

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DEPOSITO PER LO SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SCARTO 2

1. GENERALITÀ

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. i del D.P.R. n. 207/2010 consta nella descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, con l'individuazione delle stesse, e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto.

2. FABBISOGNI DI MATERIALI DA APPROVVIGIONARE DA CAVA AL NETTO DEI VOLUMI REIMPIEGATI

Nell'ambito del progetto non è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali approvvigionati da cava o da impianto di trattamento inerti:

- materiale sabbioso;
- materiale per sottofondo stradale (tout-venant stabilizzato).

3. ESUBERI DI MATERIALI DI SCARTO PROVENIENTI DAGLI SCAVI

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti quantitativi di materiale inerte da conferire a discarica:

- materiale proveniente da sovrastruttura stradale: 64,80 m^3;
- materiale terroso proveniente da scavo: 2053,98 m^3.(*)

(*) Il quantitativo totale di materiale di scavo è pari a 3388,32 m^3; considerando il parziale riutilizzo per opere di reinterro per complessivi 1334,34 m^3, risulta un quantitativo netto di materiali in esubero da conferire a discarica pari a 2053,98 m^3.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DEPOSITO PER LO SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SCARTO

Sulla base di una ricerca effettuata sugli operatori economici autorizzati, a livello locale, al conferimento di materiali inerti provenienti da scavi e da opere di demolizione sono state individuate le ditte seguenti:

- ditta Galletto Bruno s.r.l., il cui impianto dista circa 4 km dal cantiere;
- ditta Servizi Industriali s.r.l. di Carrara, il cui impianto dista circa 12 km dal cantiere.

La carta di seguito riportata indica la localizzazione degli impianti e del sito di cantiere.

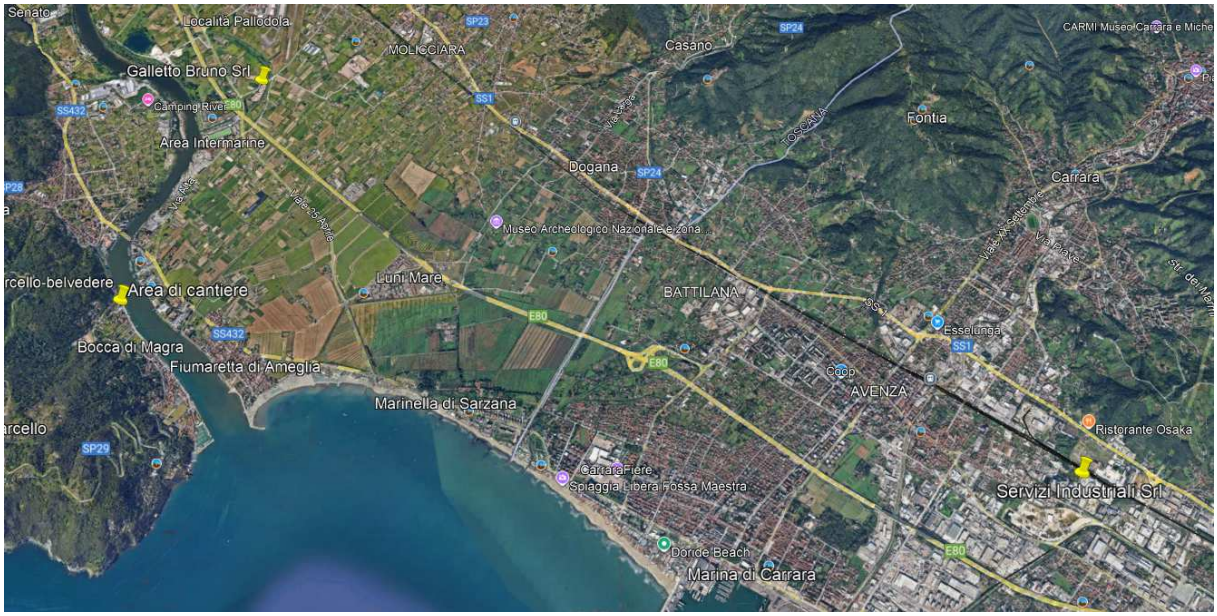


Figura 1 – Localizzazione impianti autorizzati per il conferimento dei materiali in esubero
