
SCHEMA GRAFICO DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DI ABBANCAMENTOA FORMARE LA PISTA GRADONE A QUOTA 85 m. ZONA SE DEL FRONTE - 5° FASE DI ABBANCAMENTO DEL NUOVO PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE DEL FRONTE DI CAVA

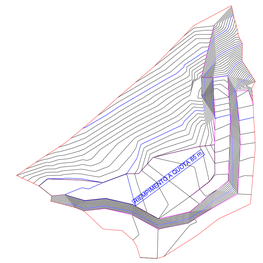

Seconda fase di riempimento lato SE - rilevato a 85 m.	
superficie	1203.43 mq.
perimetro	193.23 m.l.
pendenza	3,5%
volume riporto	20.324,42 mc

SCALA 1: 1.000

VASCA DI ACCUMULO 6 CON RECAPITO F. BISAGNO AUTORIZZAZIONE UNICA

quota 70,0 m.

quota 75,0 m.

quota 110 m.

canale di raccolta acque dilavamento

LEGENDA:

- canalette captazione acque trasversali ai gradoni
- Vasche di decantazione in roccia
- Cunette di regimazione acque meteoriche
- Direzione di deflusso delle acque meteoriche
- Canale di drenaggio delle acque accumulate nella vasca di raccolta fanghi attuale con recapito al bacino di accumulo n. 6 e smaltimento in osservanza del A.U.A. n. 232/2015 rilasciata dalla Citta Metropolitana

N.B. : lo schema delle opere di captazione e regimazione acque nell'area di coltivazione costituisce schema esemplificativo, ma non esecutivo delle opere idrauliche per il quale si rimanda alle tavole di progettazione idraulica n° 1 idr. e 2 idr.

- Area di realizzazione del canale raccolta acque e della pista di arroccamento alla zona da bonificare
- Zona di scoronamento del ciglio superiore della scarpata disgaggio massi instabili e eduazione della vegetazione ad alto fusto instabilizzante la testa della scarpata
- Area soggetta a riprofilatura (pettinatura) ed idrosemina
- Berma artificiale in terra e roccia da scavo propedeutica al ripristino ambientale dei gradoni di cava
- Limite "CA" del PTRAC approvato con D.C.R n° 7 del 27/02/2008
- Zone fine coltivazione antecedentemente luglio 2001 (coltivazione conclusa ante rinnovo 2003)

COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA

CAVA DI CALCARE "MONTANASCO"

COMMITTENTE

FRANTOI s.r.l

DICIASSETTESIMA FASE - ABBANCAMENTO - RILEVATO A 85 m. ZONA SE

DATA febbraio 2017

SCALA 500

TAVOLA 19 p.c.

Studio di geologia tecnica
Dott. Geol. Guido Carieri
Via Untoria, 31r – 17100 Savona (SV)
Tel. – fax. 0182989633
