
SCHEMA GRAFICO DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DI PROFILATURA DELLA PISTA GRADONE TRA QUOTA 115 E 110 m. - 2° FASE DI SCAVO DEL NUOVO PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE DEL FRONTE DI CAVA

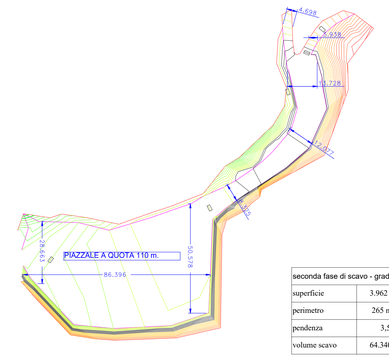

seconda fase di scavo - gradone a 110 m.	
superficie	3.962 mq.
perimetro	265 m.l.
pendenza	3,5%
volume scavo	64.340 mc

SCALA 1: 1.000

VASCA DI ACCUMULO E CON RECAPITO F. BISAGNO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 232/2015

PIAZZALE A QUOTA 110 m.

canale di raccolta acque dilavamento

LEGENDA:

- canalette captazione acque trasversali ai gradoni
- Vasche di decantazione in roccia
- Cunette di regimazione acque meteoriche
- Direzione di deflusso delle acque meteoriche

N.B. : lo schema delle opere di captazione e regimazione acque nell'area di coltivazione costituisce schema esemplificativo, ma non esecutivo delle opere idrauliche per il quale si rimanda alle tavole di progettazione idraulica n° 1 idr. e 2 idr.

- Area di realizzazione del canale raccolta acque e della pista di arroccamento alla zona da bonificare
- Zona di scoronamento del ciglio superiore della scarpata disgaggio massi instabili e ceduazione della vegetazione ad alto fusto instabilizzante la testa della scarpata
- Area soggetta a riprofilatura (pettinatura) ed idrosemina
- Berma artificiale in terra e roccia da scavo propedeutica al ripristino ambientale dei gradoni di cava
- Limite "CA" del PTRAC approvato con D.C.R n° 7 del 27/02/2008
- Zone fine coltivazione antecedentemente luglio 2001 (coltivazione conclusa ante rinnovo 2003)

COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA

CAVA DI CALCARE "MONTANASCO"

COMMITTENTE

FRANTOI s.r.l

SECONDA FASE DI SCAVO - GRADONE 110 m.

DATA febbraio 2017
SCALA 500

TAVOLA 4.p.c.

Studio di geologia tecnica
Dott. Geol. Guido Carieri
Via Untoria, 31r – 17100 Savona (SV)
Tel. – fax. 0182989633
