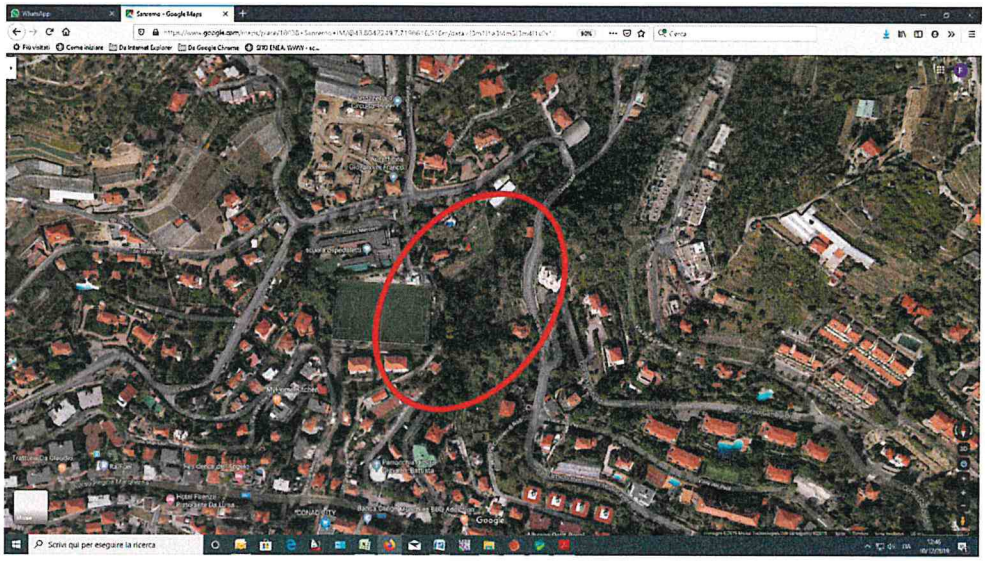
MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

| | |
|---|---|
| TIPO PROCEDIMENTO | **VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)** |
| PROPONENTE | **COMUNE OSPEDALETTI** |
| Indirizzo sede legale | **VIA XX SETTEMBRE 34 - OSPEDALETTI** |
| Indirizzo per corrispondenza | **VIA XX SETTEMBRE 34 - OSPEDALETTI** |
| Telefono/fax | **0184 68221** |
| Posta Elettronica | **salsi.massimo@comune.ospedaletti.im.it** |
| Posta Elettronica certificata | **comune@pec.comune.ospedaletti.im.it** |
| DENOMINAZIONE | **GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO CROSIO NEL TRATTO COMPRESO FRA CORSO MARCONI (A MONTE) E LA TOMBINATURA A LATO DI VIA DELLA NORIA (A VALLE), IN ZONA DI PIANO DI BACINO CLASSIFICATA COME PG3B, CON GRAVE PERICOLO PER IL CENTRO ABITATO DI OSPEDALETTI - LOTTO A** |
| LOCALITA' | - |
| COMUNE | OSPEDALETTI |
| PROVINCIA | IMPERIA |
| BREVE DESCRIZIONE | Descrizione delle opere e dei potenziali impatti<br>Le opere in progetto riguardano la sistemazione di un tratto del Rio Crosio. Nello specifico le opere previste sono quelle regolarizzazione della sezione di deflusso in un tratto a monte dell'esistente tombinatura che sottopassa il centro abitato.<br>**Il corso d'acqua presenta nel tratto in esame difese spondali già esistenti realizzate in: pietra e cemento, solamente in pietra o con gabbionature metalliche (v. planimetria e sezioni stato attuale).**<br>Le opere prevedono pertanto l'adeguamento del torrente con una larghezza minima di 5 metri fino a 14 metri per conformarsi alle esistenti sponde. In particolare è prevista una specifica zona di intervento volta al deposito del materiale trasportato dalla corrente con realizzazione di 3 briglie a pettine.<br>Le opere in progetto saranno realizzate tramite opere di ingegneria naturalistica (geostuoie e gabbionature metalliche).<br>Si allegano alla presente tavole esplicative di stato attuale (planimetria e sezioni) e di progetto (planimetria e sezioni) per quanto all'oggetto.<br><br>I potenziali impatti saranno quelli dovuti alle operazioni di cantiere per la realizzazione delle opere. In particolare si svilupperanno durante le lavorazioni emissioni sonore (mezzi d'opera) e polveri in riferimento alla movimentazione del materiale per l'adeguamento del corso del torrente.<br>Dal punto di vista faunistico e ambientale l'area in oggetto non rileva avere vincoli particolari ne di tipo ambientale ne di tipo faunistico.<br>L'area è sottoposta unicamente a vincolo di tipo paessaggistico (Bellezze d'insieme). |
| ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE | Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;* | | | |
| Ara protetta | Indicare se interno o prossimo ad area protetta | | | |
| | ZSC | ☐ si - x no | ZPS | ☐ si - x no |
| Estratto Cartografico | *INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE*  | | | |

Ospedaletti, 3.1.2020

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Massimo SALSI

COMUNE DI OSPEDALETTI
IMPERIA
