C.S. ING. società di ingegneria

SEDE LEGALE: C.so Italia n° 6 - 15076 - Ovada (AL)
SEDE OPERATIVA: Piazza V. Emanuele II, 8 - 27050 Cervesina (PV)
Tel/Fax 0383 75987 info@csingsrl.it csing@dataconsultsrl.legalmail.it

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
PIAZZA MAZZINI, 46
16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA ELISUPERFICIE DA REALIZZARE ALLA RADICE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe Manca

IL TECNICO
Ing. Daniele Barbera

01_14 CRONOPROGRAMMA

Rev.	Data:	Descrizione revisione	Eseguito:	Controllato:	Approvato:

Santa Margherita Ligure, Novembre 2020

INDIRIZZO CANTIERE:
PORTO TURISTICO - SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

OPERA DA REALIZZARE:
Realizzazione di Elisuperficie sulla radice del molo di sopraflutto del porto turistico di santa Margherita Ligure

COMMITTENTE:
Arch. Manca Giuseppe
Comune di Santa Margherita Ligure


Cronoprogramma

Il coordinatore per la progettazione

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

1.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio
1	**Diagramma di Gantt**	**182/273**	**01/09/2020**
2	**Allestimento cantiere**	**19/25**	**01/09/2020**
3	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	5/5	07/09/2020
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	5/5	07/09/2020
5	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	5/5	14/09/2020
6	Baracche di cantiere	4/4	01/09/2020
7	Locale spogliatoio	4/4	01/09/2020
8	Servizi igienici di cantiere	4/4	01/09/2020
9	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	5/5	07/09/2020
10	Delimitazione dell'area con elementi in legno	5/5	21/09/2020
11	Installazione e smontaggio cantiere generico	19/19	01/09/2020
12	Lavori in prossimità di corsi d'acqua	19/19	01/09/2020
13	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	5/5	21/09/2020
14	Lavori di carico e salpamento di massi naturali	8/8	30/09/2020
15	Demolizione di calcestruzzo ammalorato	2/2	28/09/2020
16	Accesso e transito dei mezzi in cantiere	5/5	12/10/2020
17	Operazioni di pompaggio	5/5	12/10/2020
18	Formazione di strato di base	8/8	19/10/2020
19	Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici	3/3	26/10/2020
20	Posa di condutture in materiale plastico pesante	7/7	29/10/2020
21	Formazione letto di posa e rinfianco tubi con cls	1/1	09/11/2020
22	Getto di sottofondo con autobetoniera	1/1	10/11/2020
23	Posa di pozzetto disoleatore	3/3	11/11/2020
24	Posa di tubazione per linee elettriche	5/5	16/11/2020
25	Fondazioni in cls armato (2)	27/27	26/11/2020
26	Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo	10/10	15/02/2021

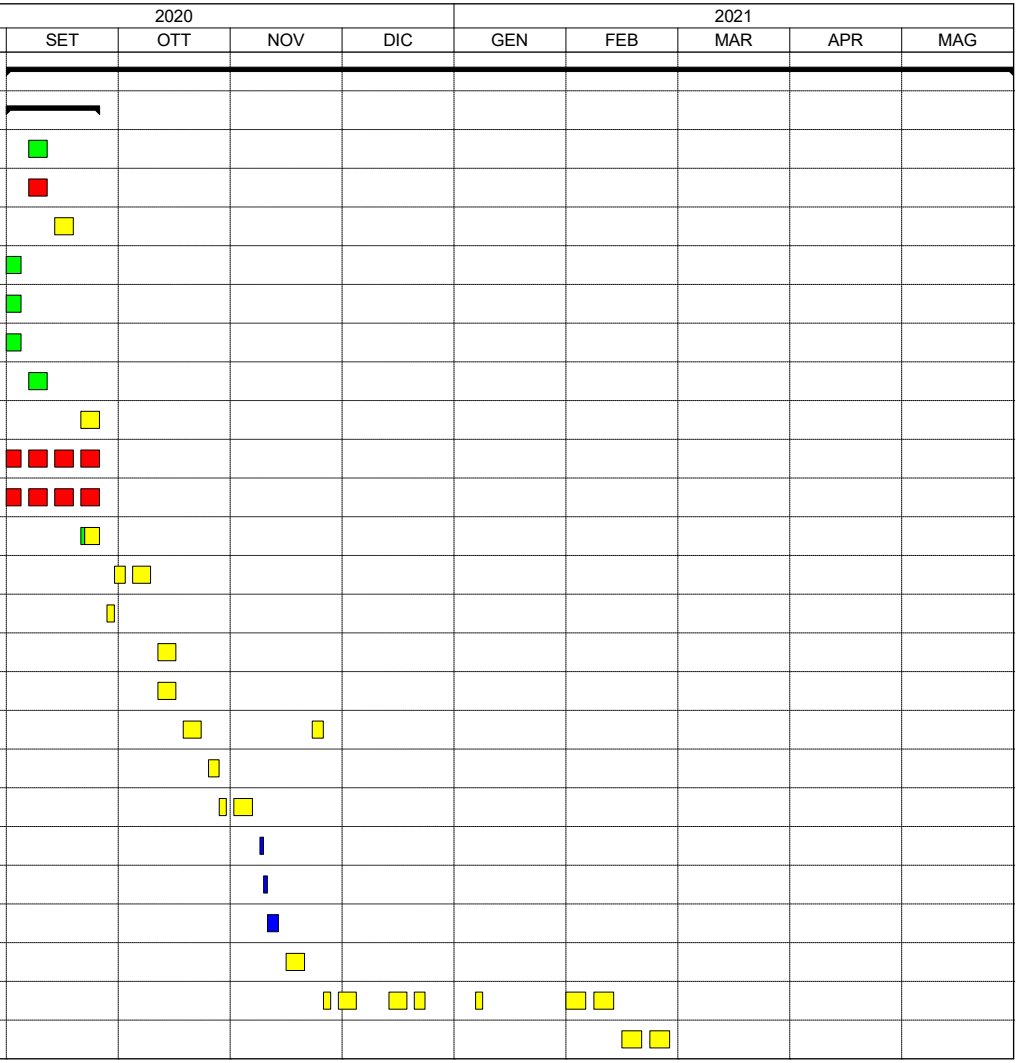

Cronoprogramma

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2020					2021				
				AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG
27	Posa di canalette lineari per raccolta acqua	15/15	11/01/2021										
28	Posa di palo di sostegno manuale	1/1	01/03/2021										
29	Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte	12/12	02/03/2021										
30	Posa di armadio di alimentazione impianto	2/2	15/03/2021										
31	Posa di corpi illuminanti	14/14	22/03/2021										
32	Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro	21/21	29/03/2021										
33	Montaggio cancello metallico	3/3	28/04/2021										
34	**Smobilizzo cantiere**	**21/29**	**03/05/2021**										
35	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	2/2	24/05/2021										
36	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	2/2	24/05/2021										
37	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	5/5	03/05/2021										
38	Locale spogliatoio	3/3	26/05/2021										
39	Servizi igienici di cantiere	3/3	26/05/2021										
40	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	5/5	10/05/2021										
41	Delimitazione dell'area con elementi in legno	5/5	17/05/2021										
42	Installazione e smontaggio cantiere generico	21/21	03/05/2021										

Cronoprogramma

Legenda:

	Intero cantiere
	AREA SPOGLIATOI
	AREA ELISUPERFICIE
	STRADA DI ACCESSO ALLA ELISUPERFICIE
