Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n° 2 aerogeneratori in località Bric del Borro – Bric Prà Boè lungo il crinale tra i comuni di Mallare ed orco Feglino ed opere connesse.

RAPPORTO SEMESTRALE AVANZAMENTO LAVORI

Luglio - Dicembre 2023

luglio – dicembre: stesa cavi nel cavidotto esistente

giugno – luglio: lavori di preparazione piazzali di stoccaggio A5 e A6



luglio: montaggio basket fondazione ed armature plinto A3





luglio - agosto: lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso al campo







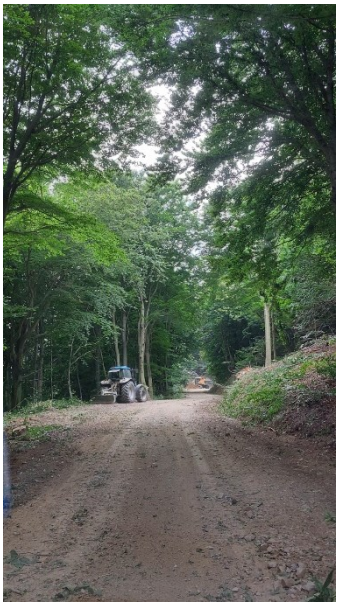

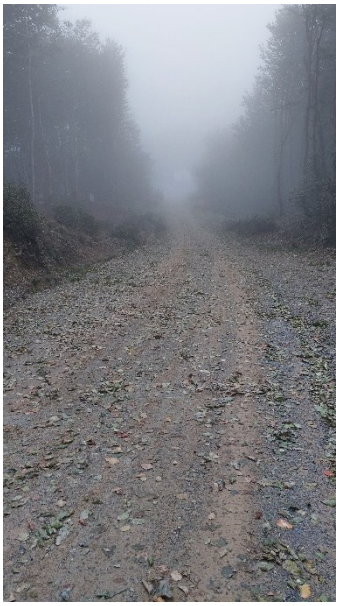

11 luglio: getto plinto torre A4



luglio - agosto: ritombamento plinto e preparazione piazzale di montaggio torre A4









1 agosto: getto plinto torre A3



7/8 agosto: stesa corda in rame per messa a terra

9 agosto: posa e verifica planarità del concio di base – prova di messa a terra





10/11 agosto: getto conci di collegamento

agosto - settembre: montaggio torre A4





settembre - ottobre: montaggio torre A3

