AREA FOCE - CARIGNANO

CRONOPROGRAMMA CANTIERE ZONA FOCE - CARIGNANO

FASE	LAVORAZIONE	DURATA
0	**Cantierizzazione Foce - Carignano**	5 gg
1	**Preparazione aree operative**	150 gg
	ORMEGGIO	
	CARICO E SCARICO PERSONALE, MEZZI E MATERIALI	
	DISORMEGGIO	
2	**Realizzazione del plinto di fondazione (WTG 32-34)**	45 gg
	DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE	
	REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DEL PLINTO	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
3	**Realizzazione del collegamento Aerogeneratore-diga (WTG 35-39)**	20 gg
	ESECUZIONE DEI FORI	
	REALIZZAZIONE DELL'INGHISAGGIO	
	REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI BASE	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
4	**Assemblaggi propedeutici (WTG 32-39)**	24 gg
	SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALE	
	IRRIGIDIMENTO CONCIO BASE	
	ASSEMBLAGGIO TORRE	
	ASSEMBLAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
5	**Realizzazione Cabina di trasformazione (WTG 35-39 + 1)**	36 gg
	OPERE DI FONDAZIONE	
	SETTO DI PROTEZIONE IN CA	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
6	**Realizzazione Cavidotto su diga (WTG 32-39)**	86 gg
	REALIZZAZIONE DEL MURETTO LATERALE	
	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI POZZETTI	
	PASSAGGIO CAVI	
	GETTO DI CHIUSURA	
7	**Montaggio torre su diga (WTG 32-39)**	12 gg
	MONTAGGIO ELEMENTO BASE TORRE	
	MONTAGGIO 2° ELEMENTO TORRE	
8	**Montaggio aerogenarori su diga (WTG 32-39)**	16 gg
	ORMEGGIO	
	MONTAGGIO 3° ELEMENTO TORRE	
	MONTAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
	SERRAGGIO DEI COLLEGAMENTI	
	DISORMEGGIO	
9	**Realizzazione Cabina di attraversamento (E1-E2)**	8 gg
	CAVIDOTTO DI ATTRAVERSAMENTO	
	PASSAGGIO CAVI E CHIUSURA CAVIDOTTO	
	STRUTTURE DI FONDAZIONE	
	SETTO DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DEL "CAVIDOTTO" DI DISCESA	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
10	**Realizzazione del cavidotto Sub-portuale E1-E2**	61 gg
	SCAVO DELLA TRINCEA	
	PASSAGGIO CAVI	
	REINTERRO E CHIUSURA DELLO SCAVO	
11	**Realizzazione Cabina di consegna (WTG 21-39)**	10 gg
	OPERE DI FONDAZIONE	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
	OPERE IMPIANTISTICHE	
	FINITURE	
12	**Elettrificazione**	24 gg
13	**Commissioning**	24 gg

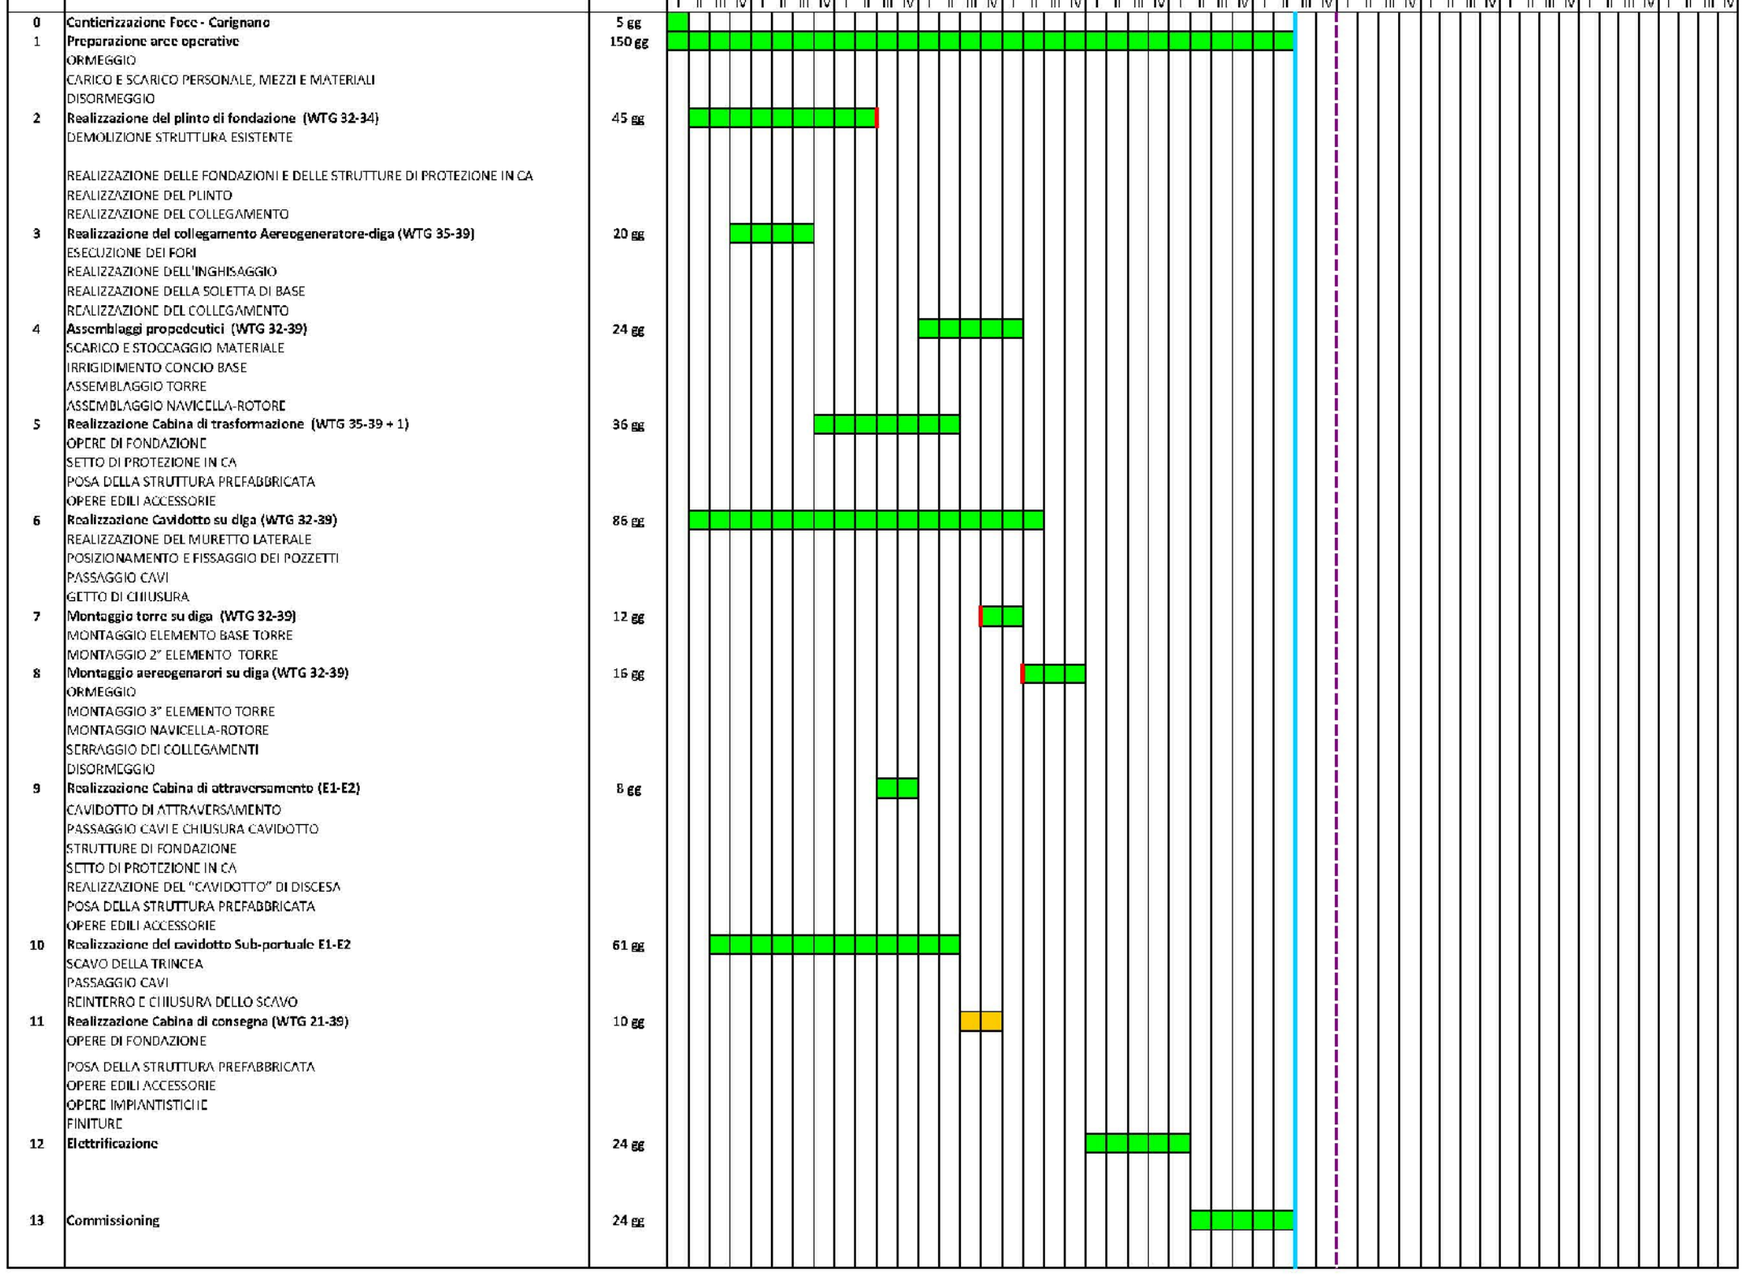


FIGURA 7.2a

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
