AREA SAMPIERDARENA

CRONOPROGRAMMA CANTIERE ZONA SAMPIERDARENA

FASE	LAVORAZIONE	DURATA
0	**Cantierizzazione Sampierdarena**	5 gg
1	**Preparazione aree operative**	180 gg
	ORMEGGIO	
	CARICO E SCARICO PERSONALE, MEZZI E MATERIALI	
	DISORMEGGIO	
2	**Realizzazione del basamento di fondazione (WTG 28-31)**	60 gg
	DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE	
	REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
3	**Realizzazione del collegamento Aereogeneratore-diga (WTG 21-27)**	28 gg
	ESECUZIONE DEI FORI	
	REALIZZAZIONE DELL'INGHISAGGIO	
	REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI BASE	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
4	**Assemblaggi propedeutici (WTG 21-31)**	35 gg
	SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALE	
	ASSEMBLAGGIO TORRE	
	ASSEMBLAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
5	**Realizzazione Cabina di trasformazione (WTG 21-27)**	42 gg
	OPERE DI FONDAZIONE	
	SETTO DI PROTEZIONE IN CA	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA - (WTG 21-31)	
	OPERE EDILI ACCESSORIE - (WTG 21-31)	
6	**Realizzazione Cavidotto su diga (WTG 21-31)**	80 gg
	REALIZZAZIONE DEL MURETTO LATERALE	
	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI POZZETTI	
	PASSAGGIO CAVI	
	GETTO DI CHIUSURA	
7	**Montaggio torre su diga (WTG 21-31)**	17 gg
	MONTAGGIO ELEMENTO BASE TORRE	
	MONTAGGIO 2° ELEMENTO TORRE	
8	**Montaggio aereogenarori su diga (WTG 32-39)**	22 gg
	ORMEGGIO	
	MONTAGGIO 3° ELEMENTO TORRE	
	MONTAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
	DISORMEGGIO	
9	**Realizzazione Cabina di attraversamento (B1-C)**	8 gg
	CAVIDOTTO DI ATTRAVERSAMENTO	
	PASSAGGIO CAVI E CHIUSURA CAVIDOTTO	
	STRUTTURE DI FONDAZIONE	
	SETTO DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DEL "CAVIDOTTO" DI DISCESA	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
10	**Realizzazione del cavidotto Sub-portuale B1-C**	48 gg
	SCAVO DELLA TRINCEA	
	PASSAGGIO CAVI	
	REINTERRO E CHIUSURA DELLO SCAVO	
11	**Realizzazione del cavidotto di allacciamento**	15 gg
	SCAVO DELLA TRINCEA	
	REALIZZAZIONE DEL CASSONETTO IN CLS	
	POSA E FISSAGGIO DEI POZZETTI	
	PASSAGGIO CAVI	
	REINTERRO E CHIUSURA DELLO SCAVO	
12	**Realizzazione della cabina di consegna (WTG 21-39)**	10 gg
	OPERE CIVILI	
	STRUTTURE	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
	OPERE IMPIANTISTICHE	
	FINITURE	
13	**Elettrificazione**	33 gg
14	**Commissioning**	33 gg

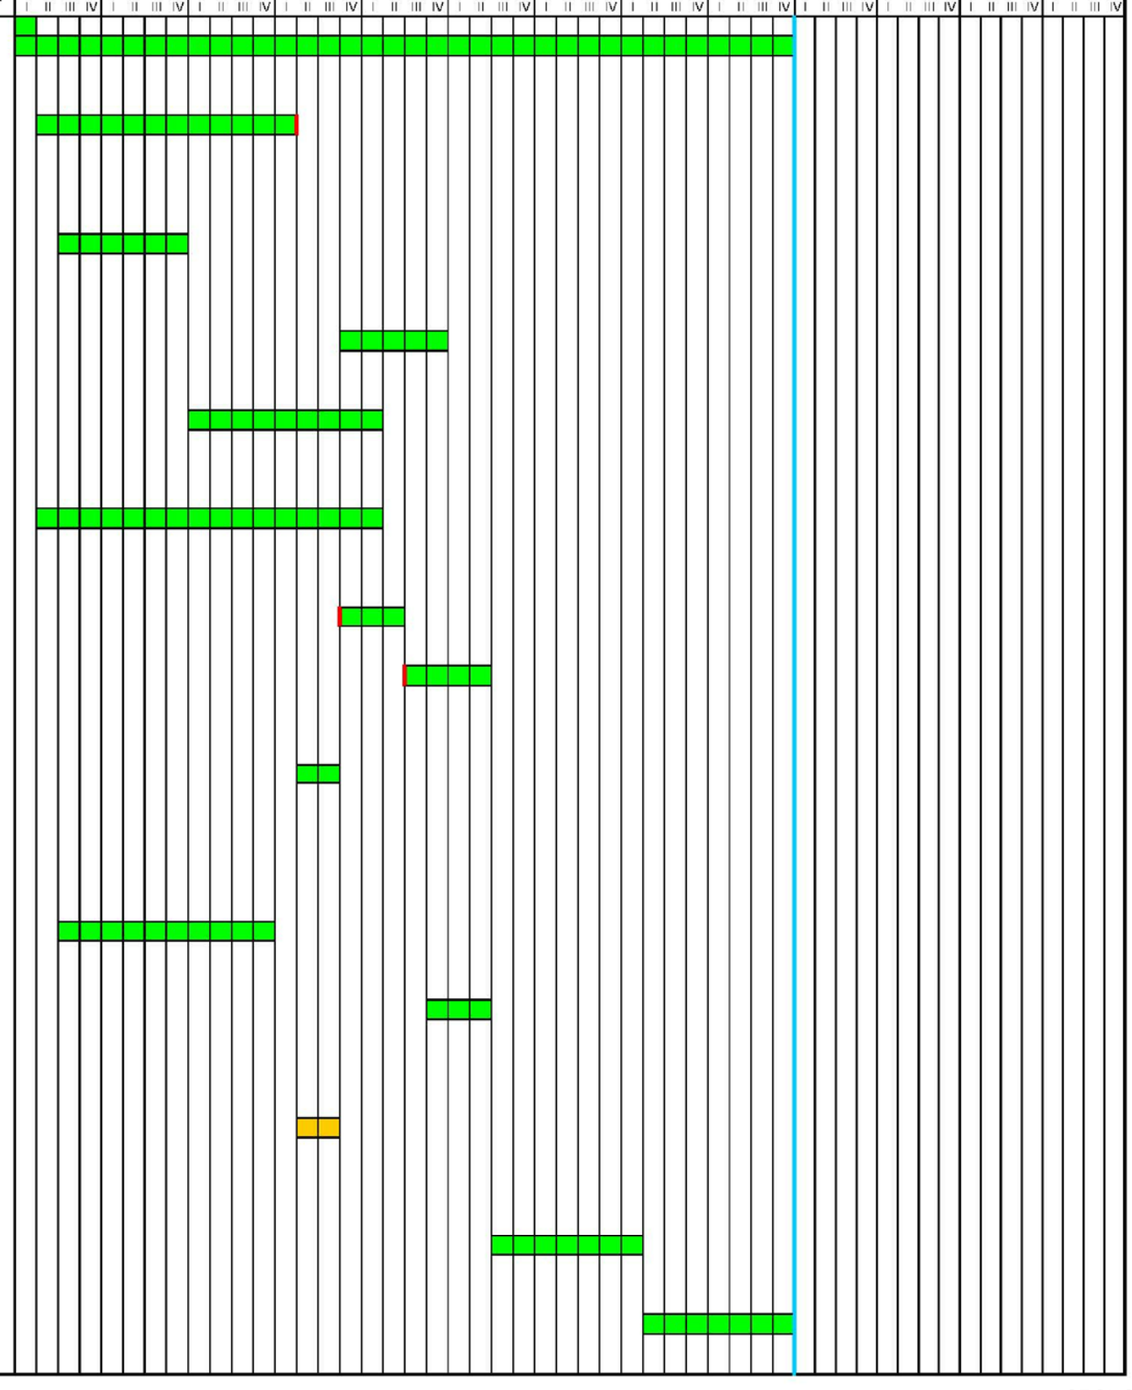


FIGURA 7.2b

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
