Il Progetto “Variante al Piano di Utilizzo di Campasso” descrive nello specifico una valutazione relativa all’impatto acustico connessa all’impianto di frantumazione utilizzato per le attività di normale pratica industriale condotte a cura dell’Appaltatore MICOS nell’ambito dei lavori del Parco Ferroviario.

In particolare, seppur quanto di seguito rappresentato costituisca valore puramente indicativo in quanto per la corretta misurazione del differenziale (art.2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991) dovrà esser verificata durante il corso d’opera della attività lavorative, si riportano di seguito i valori dei livelli differenziali calcolati per i tre livelli di rumore ambientale (uno per ciascuna isofonica) considerando come livello di rumore residuo il valore di 57.4 dBA calcolato presso il ricettore limitrofo al cantiere rappresentato di seguito.

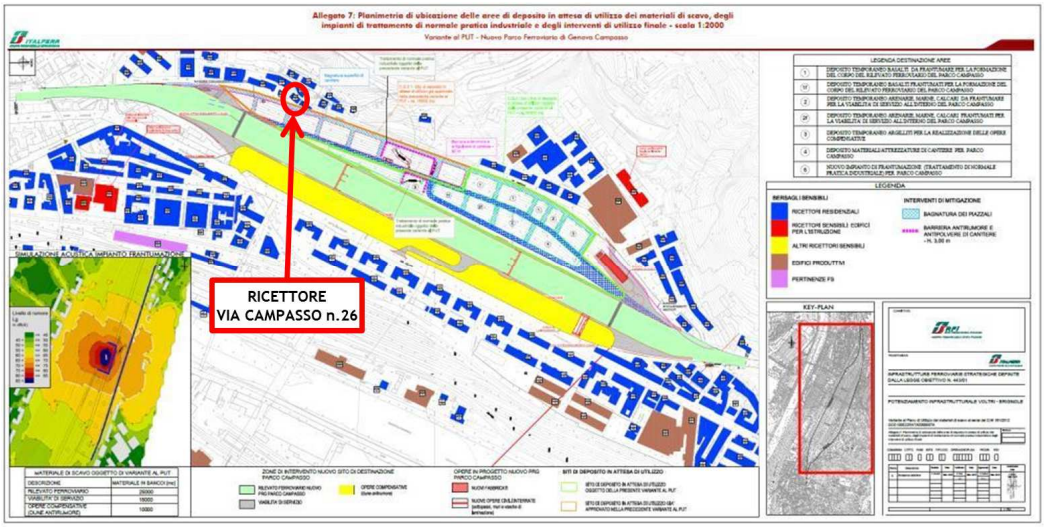


Foto1-localizzazione ricettore di riferimento.

Livello di emissione Sorgente: 60 dBA

Livello di rumore residuo: 57.4 dBA

Livello di rumore ambientale (Ls + LR): 61.9 dBA

Livello differenziale di rumore: 4.5 dBA

Livello di emissione Sorgente: 55 dBA

Livello di rumore residuo: 57.4 dBA

Livello di rumore ambientale (Ls + LR): 59.4 dBA

Livello differenziale di rumore: 2.0 dBA

Livello di emissione Sorgente: 50 dBA

Livello di rumore residuo: 57.4 dBA

Livello di rumore ambientale (Ls + LR): 58.1 dBA

Livello differenziale di rumore: 0.70 dBA

Da quanto sopra rappresentato emerge che non risultano valori differenziali superiori ai 5 dBA.
