
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**P4**
prova n.°:	**1**
data:	11/09/2007
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	700	cm
profondità del rivestimento da p.c.	600	cm
diametro foro di sonda	12	cm
altezza rivestimento dal p.c.	15	cm
livello di falda o fondo foro	700	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**8,61E-06**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**2,32E-08**	m/s

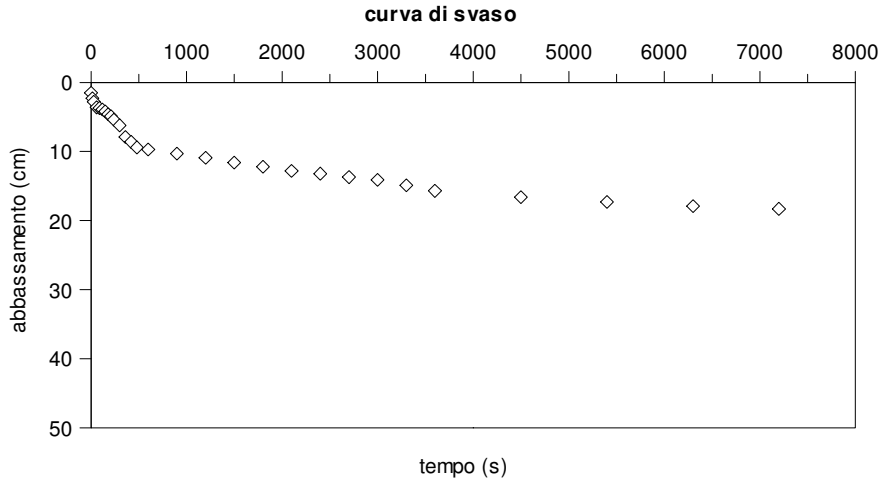

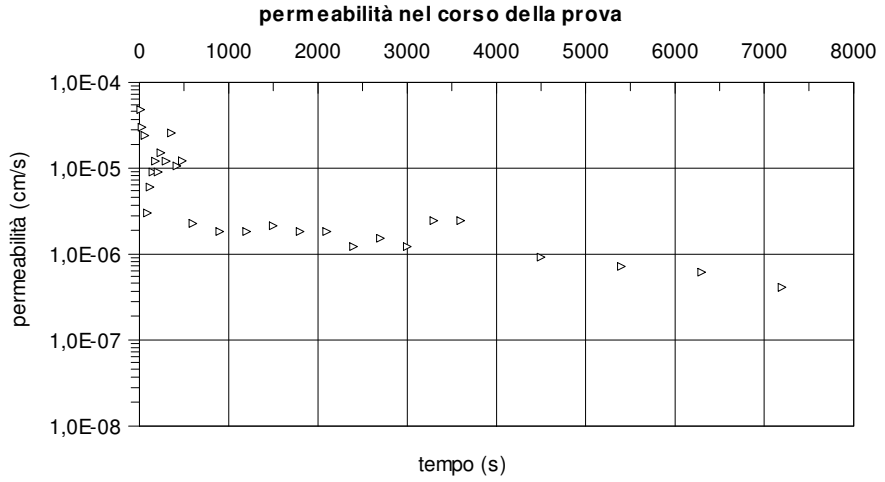

tempo (s)	discesa (cm)
0	1,5
15	2,3
30	2,8
60	3,6
90	3,7
120	3,9
150	4,2
180	4,6
210	4,9
240	5,4
300	6,2
360	7,9
420	8,6
480	9,4
600	9,7
900	10,3
1200	10,9
1500	11,6
1800	12,2
2100	12,8
2400	13,2
2700	13,7
3000	14,1
3300	14,9
3600	15,7
4500	16,6
5400	17,3
6300	17,9
7200	18,3
