
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**P3**
prova n.°:	**1**
data:	11/09/2007
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	700	cm
profondità del rivestimento da p.c.	600	cm
diametro foro di sonda	12	cm
altezza rivestimento dal p.c.	15	cm
livello di falda o fondo foro	700	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**2,10E-05**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**3,47E-08**	m/s

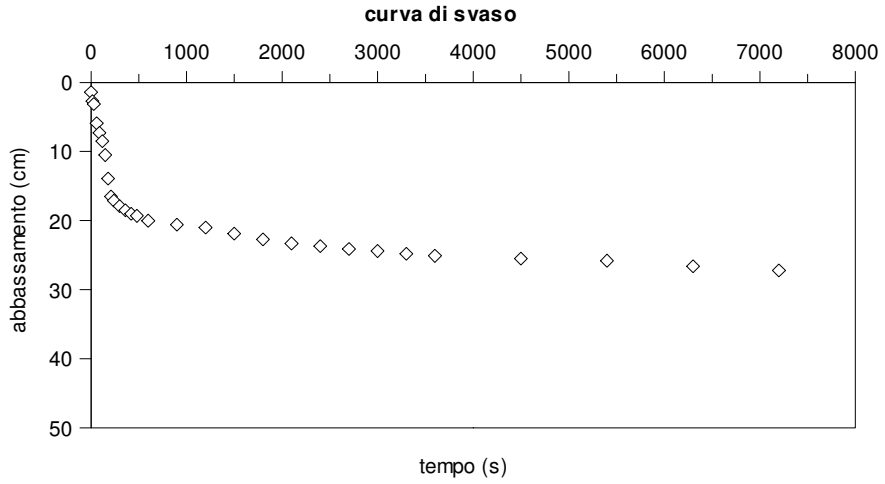

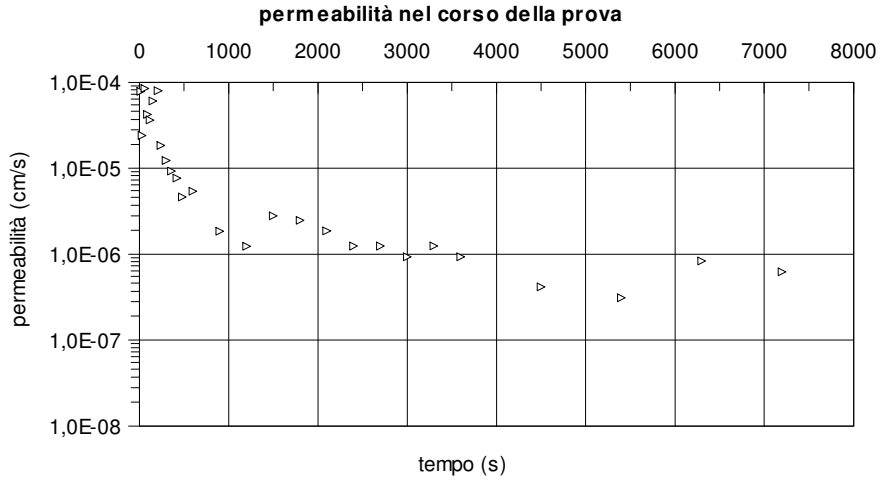

tempo (s)	discesa (cm)
0	1,4
15	2,7
30	3,1
60	5,9
90	7,3
120	8,5
150	10,5
180	13,9
210	16,5
240	17,1
300	17,9
360	18,5
420	19
480	19,3
600	20
900	20,6
1200	21
1500	21,9
1800	22,7
2100	23,3
2400	23,7
2700	24,1
3000	24,4
3300	24,8
3600	25,1
4500	25,5
5400	25,8
6300	26,6
7200	27,2
