
FASE 1


POSA BONIFICO – Spessore ~2.00 m

PIANTA

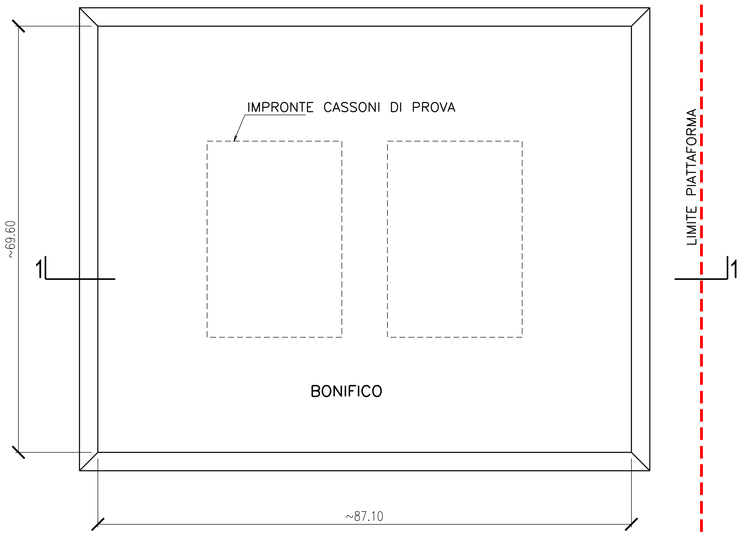


1– POSA DEL BONIFICO CON GRAPPO O METODOLOGIA SIMILE

SEZIONE 1–1

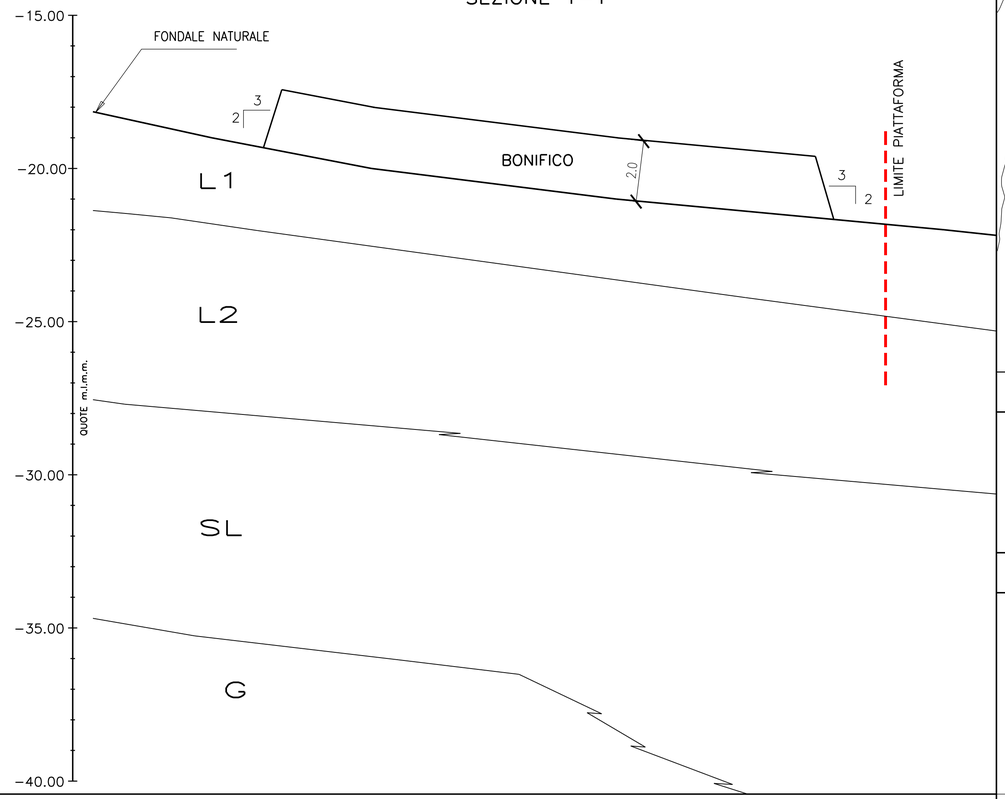

PIANTA CHIAVE

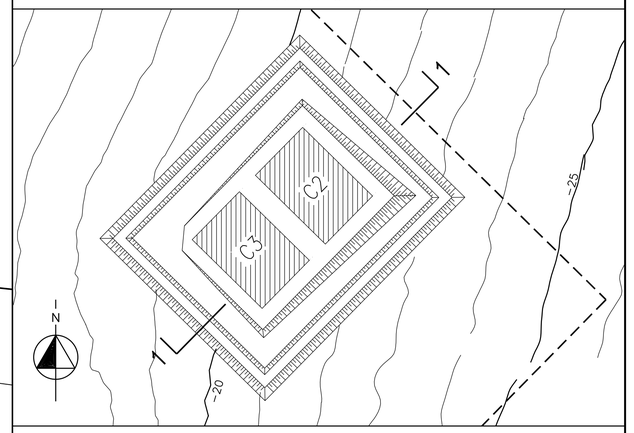

NOTE

-TUTTE LE QUOTE SONO INDICATE RISPETTO AL LIVELLO MEDIO MARE

-TUTTE LE MISURE SONO IN m

MONITORAGGI DA ESEGUIRE

-PER CIASCUNA INCLUSIONE ANDRANNO RESTITUITE LE DIAGRAFIE DI:
- _VELOCITA' DI AVANZAMENTO,
- _VOLUMI INIETTATI,
- _PRESSIONI DI INIEZIONE,
- _VERTICALITA'

-ALLA FINE DELLE FASI 1 E 2, SI ESEGUE UN RILIEVO MULTIBEAM


-ANDRANNO PRELEVATI CAMPIONI DI MISCELA ALL'IMPIANTO SU CUI EFFETTUARE PROVE DI COMPRESSIONE MONOASSIALE A 7, 14 E 28 GIORNI

0 10 20 30 40 50m

FASE 2


ESECUZIONE INCLUSIONI RIGIDE

PIANTA

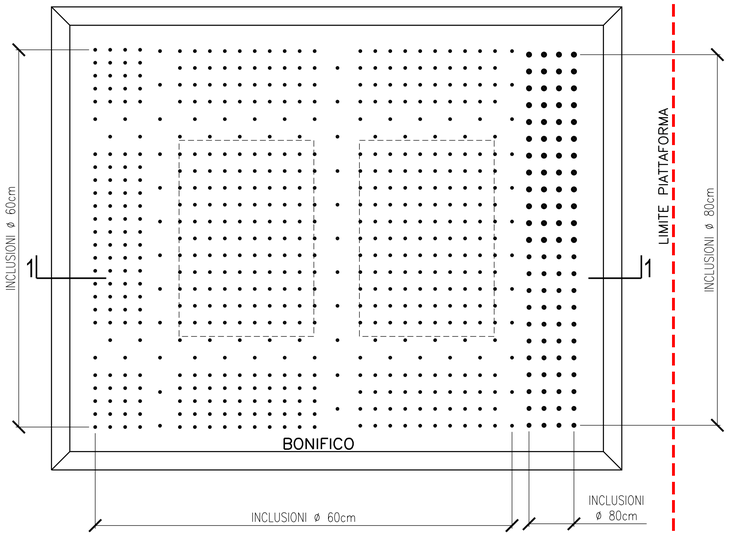

– LE INCLUSIONI SI IMMORSANO DI 50cm NELLO STRATO DI GHIAIA (G) E SI ALLARGANO ALL'INTERNO DELLO STRATO DI BONIFICO DI 40cm

SEZIONE 1–1

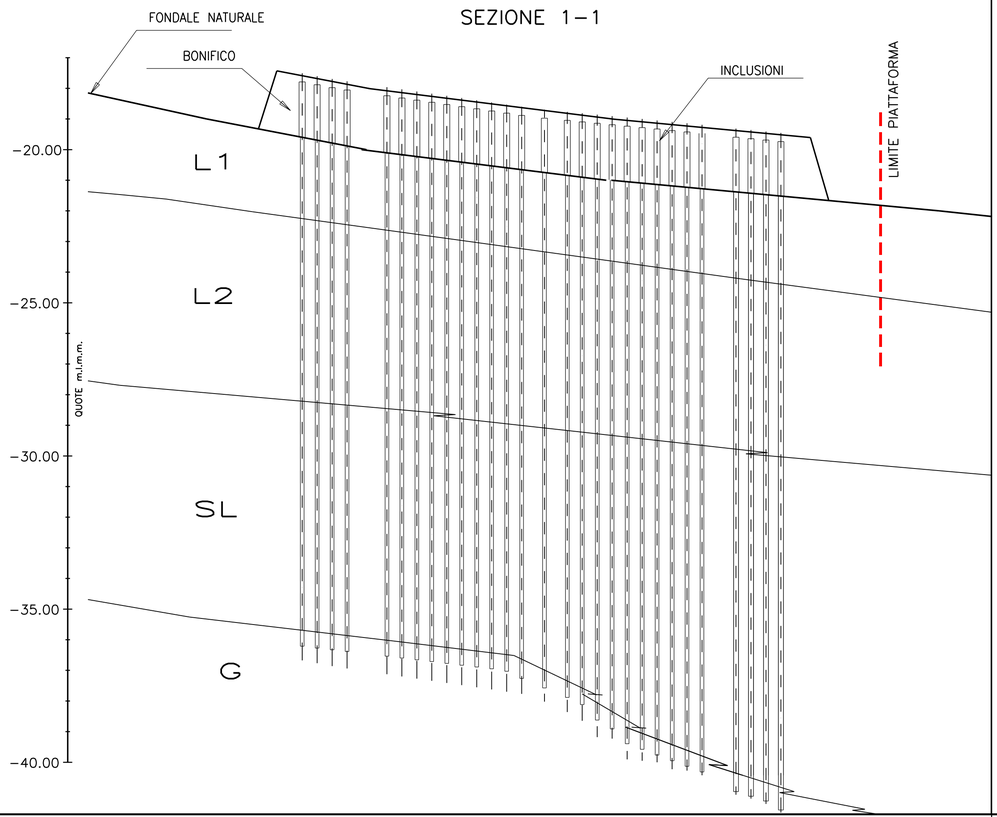

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK | GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 1 - STRALCIO 1
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
CAMPO PROVA E AREA VERIFICA MODALITA' DI COSTRUZIONE
FASI COSTRUTTIVE 1, 2

MI010P-PV-G-G-D-3117-C0

DATA			
Luglio 2013	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	MG. BANDERA	F.CANEPARO–F.CARNEVALE	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PV-G-G-D-3117-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
