

FASE 4

VERSAMENTO STRATO GHIAIA – Spessore ~1.00 m

PIANTA

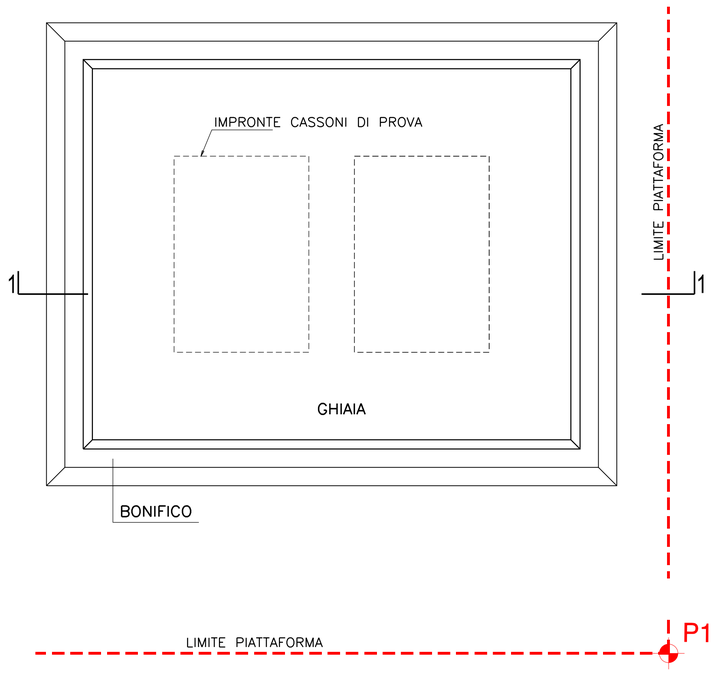


SEZIONE 1–1

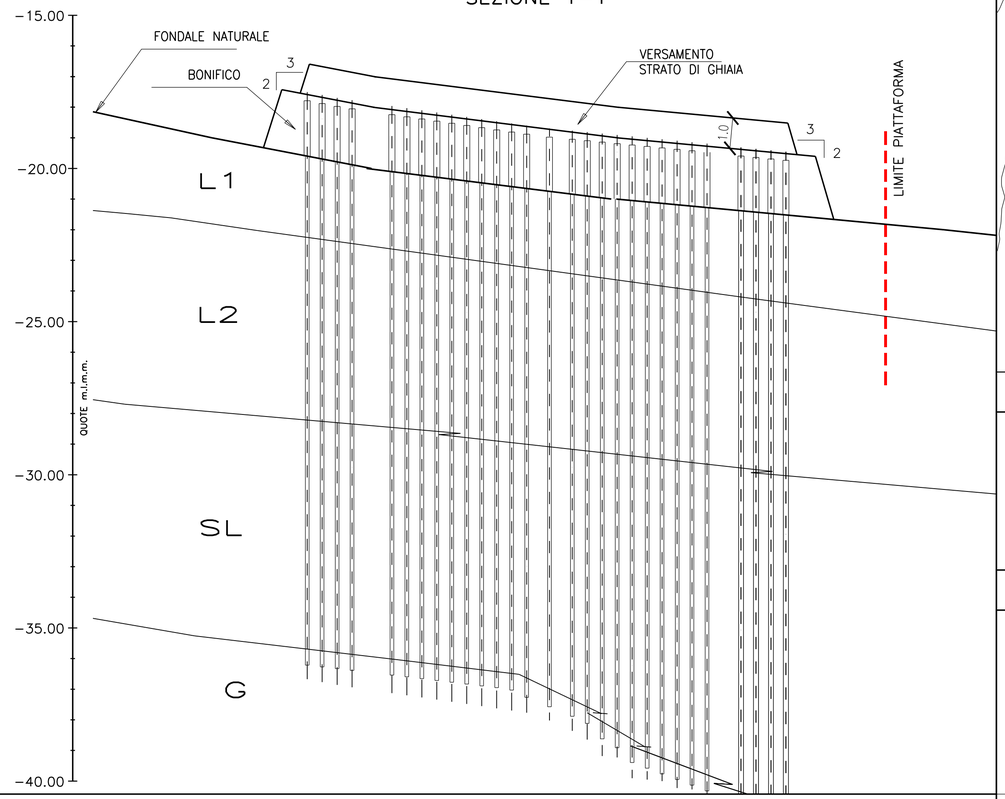


FASE 5

VERSAMENTO GHIAIA PER STRATO DI IMBASAMENTO CASSONI


PIANTA

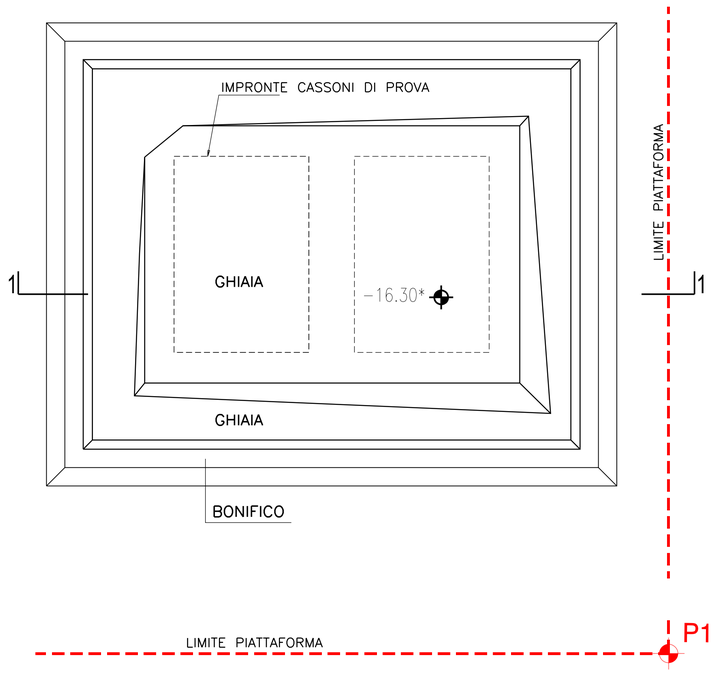

SEZIONE 1–1

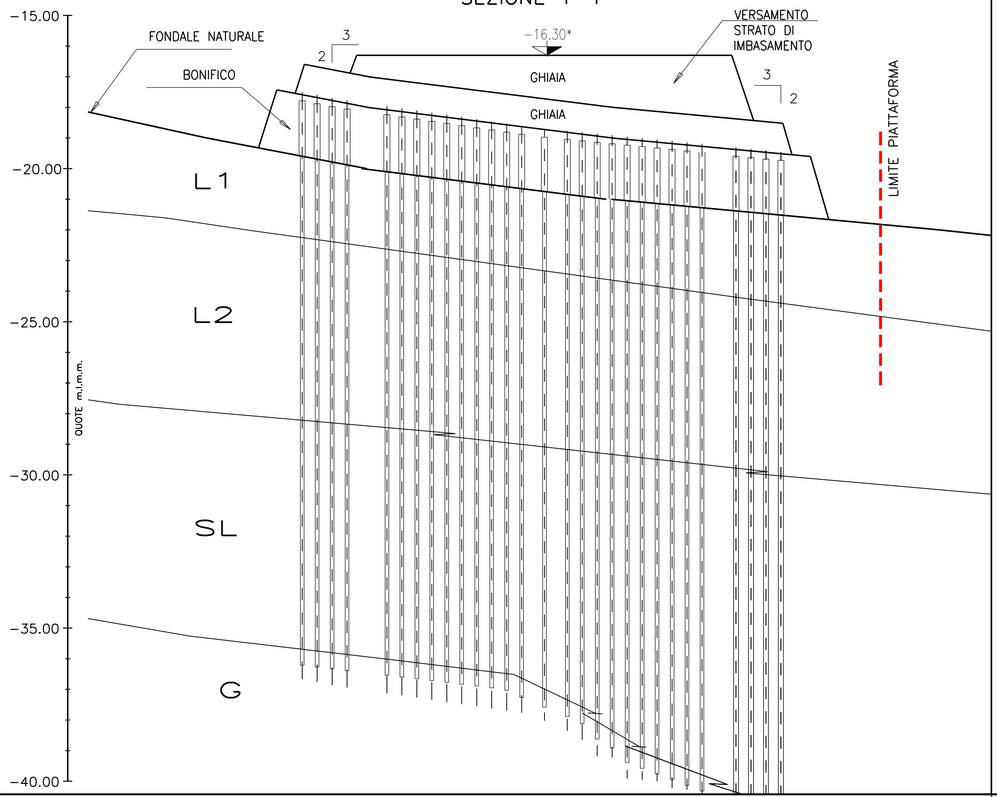

PIANTA CHIAVE

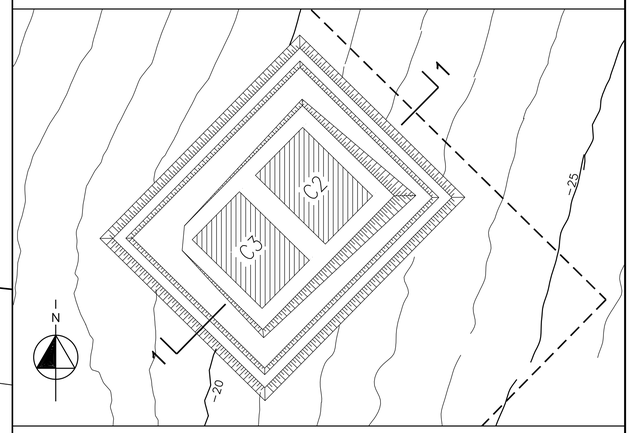

NOTE

-TUTTE LE QUOTE SONO INDICATE RISPETTO AL LIVELLO MEDIO MARE

-TUTTE LE MISURE SONO IN m

* LA QUOTA DI -16.30 TIENE CONTO DI UN SOVRASPESSORE DI 20cm PER COMPENSARE IL CEDIMENTO DEI CASSONI

MONITORAGGI DA ESEGUIRE

-ALLA FINE DELLA FASE 5, SI ESEGUE UN RILIEVO MULTIBEAM

0 10 20 30 40 50m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 1 - STRALCIO 1
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

CAMPO PROVA E AREA VERIFICA MODALITA' DI COSTRUZIONE
FASI COSTRUTTIVE 4, 5

MI010P-PV-G-G-D-3119-C0

DATA			
Luglio 2013	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	MG. BANDERA	F.CANEPARO-F.CARNEVALE	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PV-G-G-D-3119-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
