


FASE 1 - POSA BONIFICO, SCANNO E PROTEZIONI

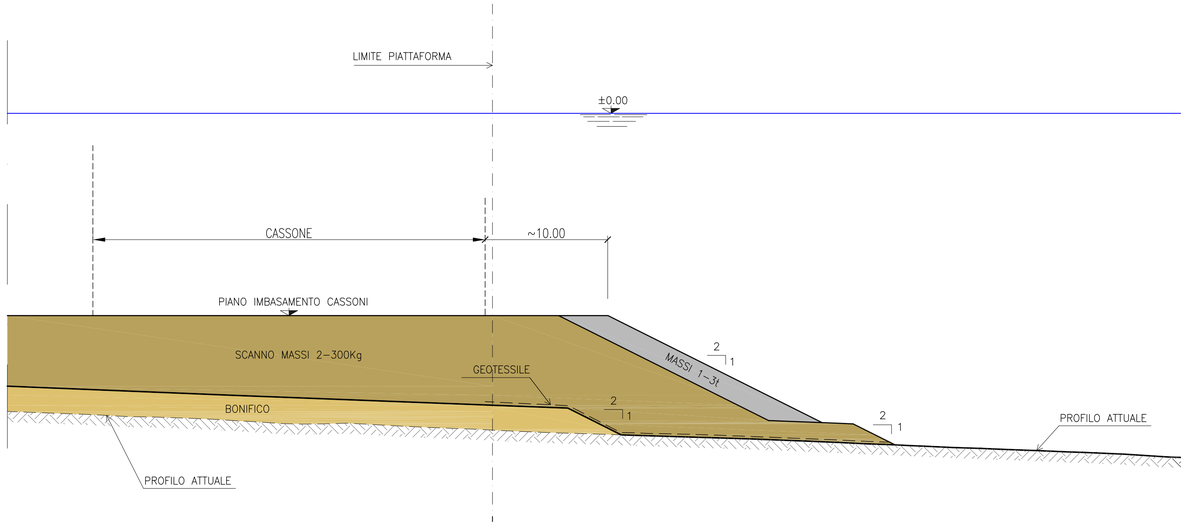

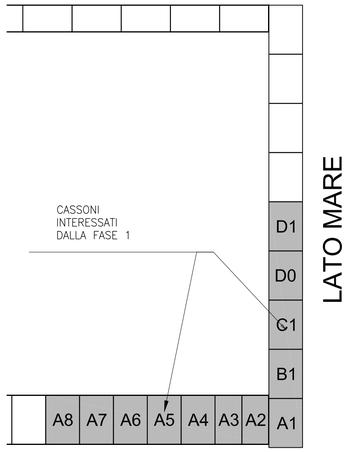


PIANTA CHIAVE

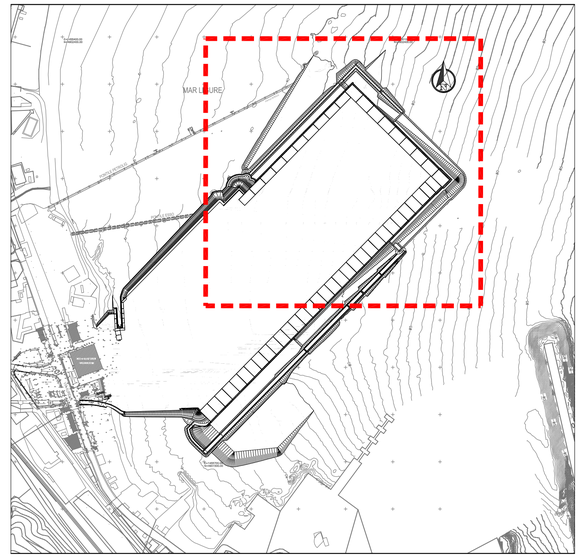

NOTE:

- PER I CASSONI DA A1 A D1 DELLA BANCHINA RINFUSE E PER I CASSONI DA A1 AD A8 DELLA BANCHINA CONTAINER SARA' OPPORTUNO ANTICIPARE LA POSA DI TUTTO LO SCANNO E DELLE PROTEZIONI FINO AL PIANO DI POSA DEI CASSONI, COSI' DA GARANTIRE LA PRESENZA DI UNA BERMA DI 10 m DA FILO CASSONE PER LE FASI SUCCESSIVE.
- AL FINE DI COMPENSARE IL CEDIMENTO DELLE FASI SUCCESSIVE E GARANTIRE COSI' LA QUOTA DI IMBASAMENTO VOLUTA, LO SCANNO DOVRA' ESSERE MESSO IN OPERA CON UNA MONTA PARI AL CEDIMENTO PREVISTO

FASE 2 - POSA CASSONE

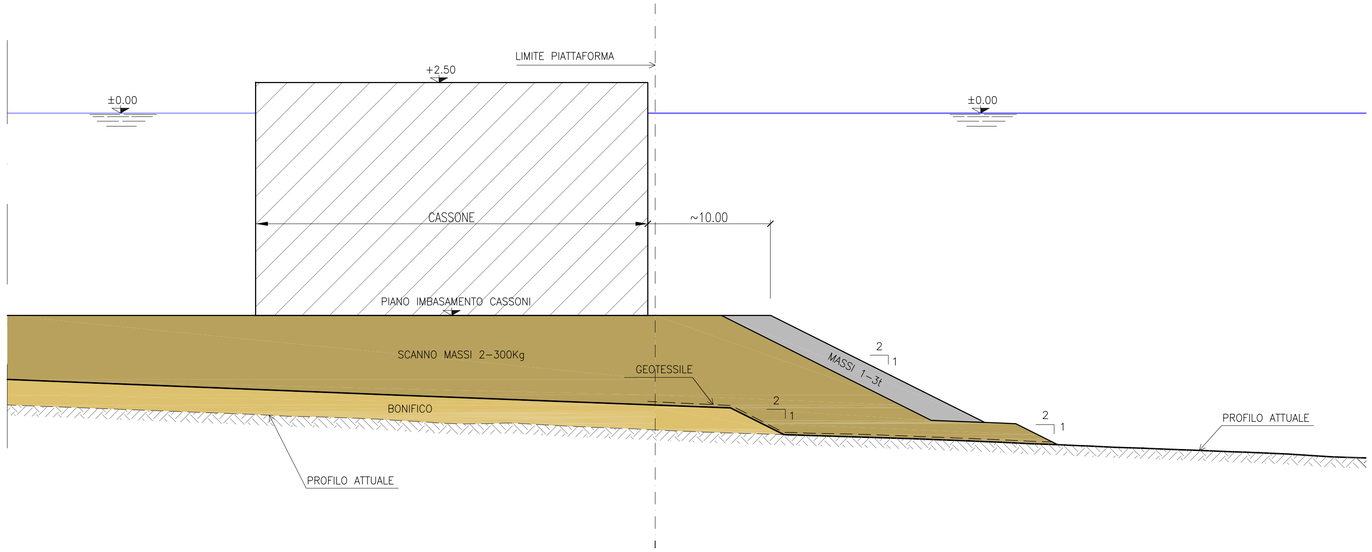

NOTE:

- IL CASSONE ANDRA' AFFONDATO E ZAVORRATO SECONDO LA SEGUENTE FASISTICA:

1) AFFONDAMENTO qmax = 100 kPa (SCARICO MASSIMO IN FONDAZIONE)
2) ATTESA 5 gg.
3) ZAVORRAMENTO FINALE t ≅ 1 MESE
   IN TALE TEMPO SI INTENDE CHE LO ZAVORRAMENTO SUL CASSONE IN OGGETTO E SUI CASSONI ADIACENTI POTRA' AVVENIRE IN CONTEMPORANEA.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
GEOTECNICA
FASI COSTRUTTIVE
TAVOLA 1 DI 4

MI0102-PV-G-G-D-200-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	R. MINOIA	F. CANEPARO	G. FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:

MI0102-PV-G-G-D-200-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
