
FASE 3 - RIEMPIMENTO IN TERRA A TERGO DEI CASSONI

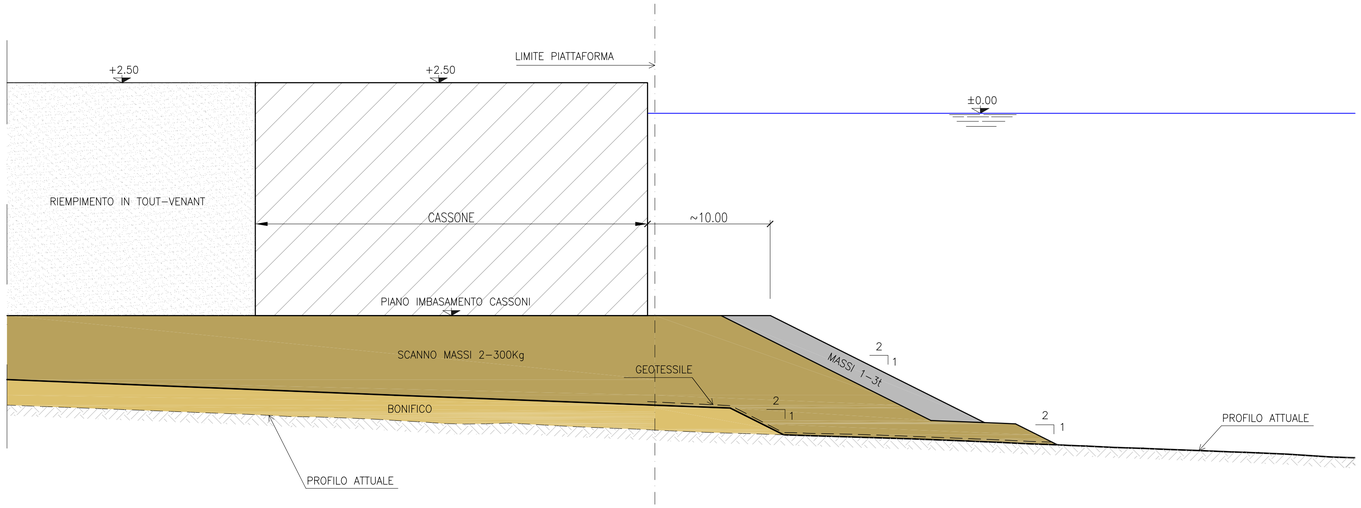


NOTE:

- IL RIEMPIMENTO A TERGO DOVRA' ESSERE ESEGUITO IN NON MENO DI 2 MESI, A MENO DEI CASSONI DELLA BANCHINA PETROLI, DOVE, ESSENDO SU FONDALI INFERIORI, IL RIEMPIMENTO POTRA' ESSERE ESEGUITO IN 1.5 MESI INTENDENDO CHE QUESTO POSSA COINVOLGERE IL CASSONE STESSO ED I CASSONI ADIACENTI.
- AL TERMINE DEL RIEMPIMENTO SI DOVRA' LASCIARE PASSARE UN TEMPO DI ALMENO 2 MESI PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRECARICA, OSSIA FINO ALL'ESAURIMENTO DEI CEDIMENTI DEL RIEMPIMENTO STESSO E DEL CASSONE, DA VERIFICARE CON IL MONITORAGGIO TOPOGRAFICO IN CORSO.
- PER IL CASSONE D'ANGOLO A1 QUESTA FASE NON E' PRESENTE MA SARA' SOSTITUITA DALLA POSA DEI CASSONI ADIACENTI, AL TERMINE DELLA QUALE SI DOVRA' COMUNQUE ATTENDERE ALMENO 2 MESI PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRECARICA, OSSIA FINO ALL'ESAURIMENTO DEI CEDIMENTI DEL CASSONE A1 E DEI CASSONI ADIACENTI, DA VERIFICARE CON IL MONITORAGGIO TOPOGRAFICO IN CORSO.

FASE 4 - PRECARICA


PIANTA ENTITA' PRECARICHE

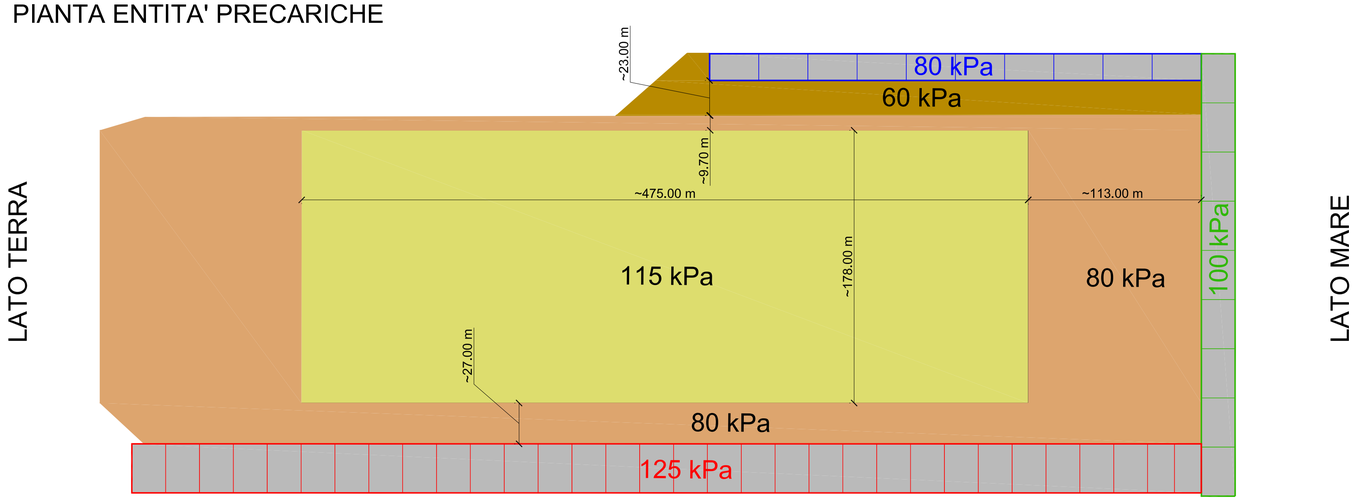

NOTE:

- TALI CARICHI SONO INTESI ESSERE APPLICATI DALLA QUOTA + 2.50 m m.s.l

PIANTA CHIAVE

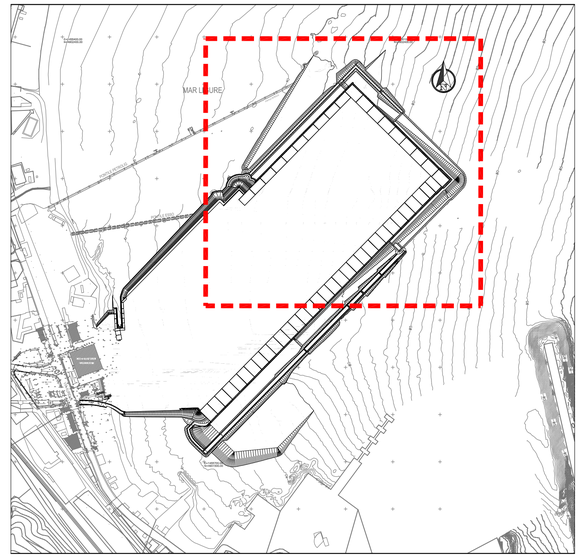

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK | GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
GEOTECNICA
FASI COSTRUTTIVE
TAVOLA 2 DI 4

MI0102-PV-G-G-D-201-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	R. MINOIA	F. CANEPARO	G. FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE: MI0102-PV-G-G-D-201-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
