


MONITORAGGIO RIEMPIMENTO IN TERRA

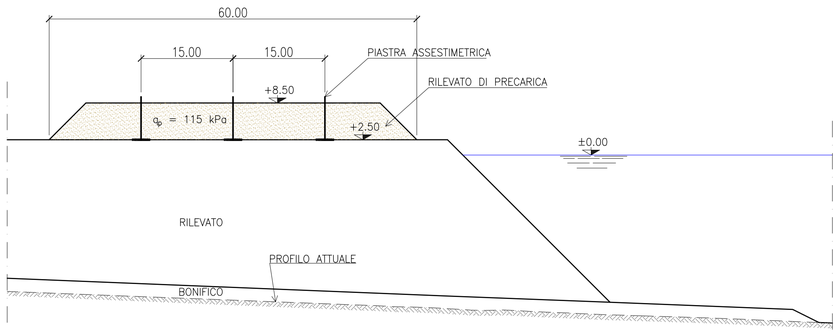

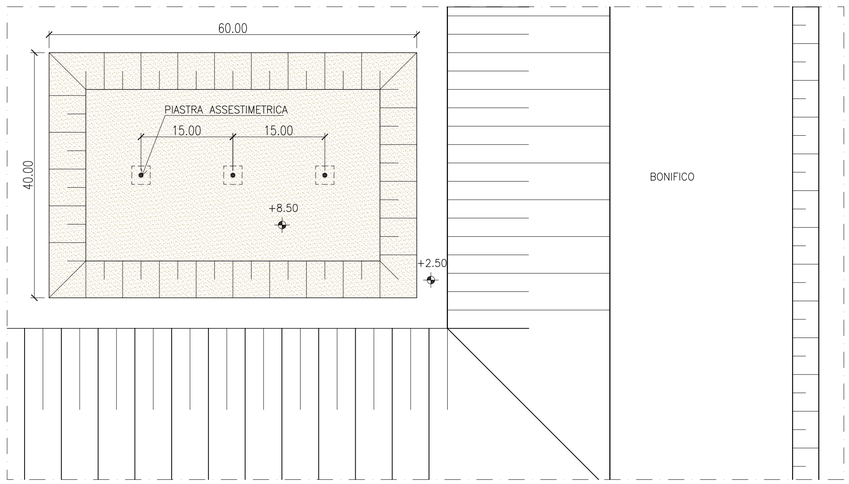

PIANTA CHIAVE

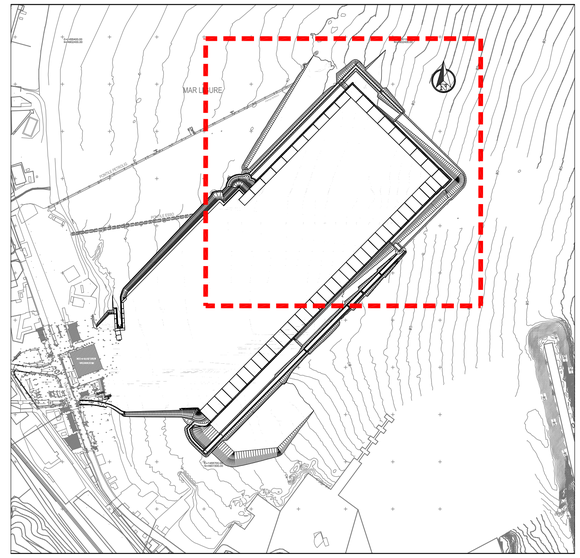


NOTE:


- PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL RILEVATO DI PRECARICA, ALLA QUOTA +2.50 m ANDRANNO POSIZIONATE 3 PIASTRE ASSESTIMETRICHE PER MONITORARE I CEDIMENTI DURANTE L'APPLICAZIONE DEL CARICO DI PRECARICA E LA SUCCESSIVA CONSOLIDAZIONE DI ALMENO 20 gg.
- LE PIASTRE ANDRANNO OPPORTUNAMENTE PROTETTE, METTENDOLE ENTRO UN TUBO DI PROTEZIONE PRIMA DI INIZIARE LA COSTRUZIONE DEL RILEVATO DI PRECARICA.
- IL MONITORAGGIO DELLE PIASTRE DOVRÀ PREVEDERE ALMENO UNA LETTURA OGNI 3 GIORNI, PER TUTTA LA DURATA DELLA PRECARICA.

MONITORAGGIO CASSONI

DETTAGLIO PIANTA



SEZIONE TIPICA

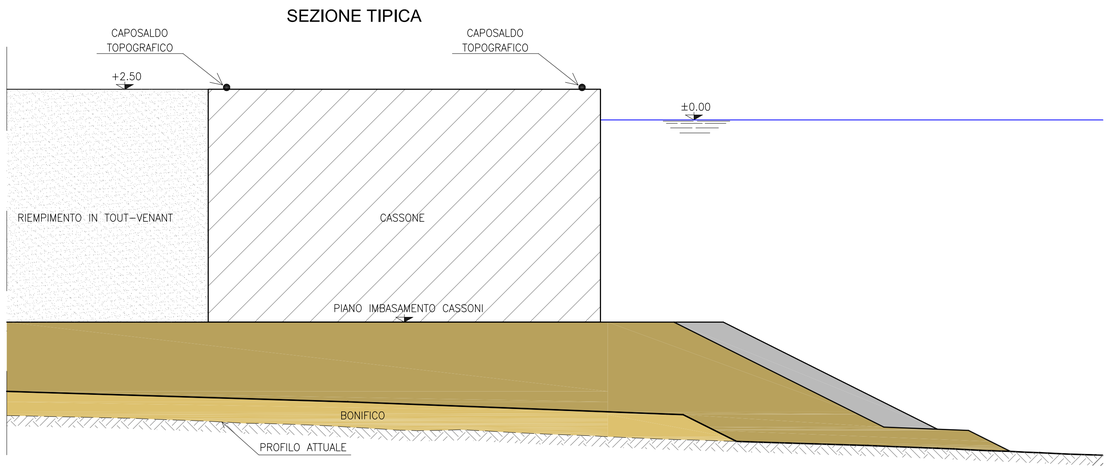

NOTE:

- CIASCUN CASSONE DOVRÀ ESSERE DOTATO DI 4 CAPOSALDI TOPOGRAFICI, POSTI NEI 4 ANGOLI ALLA QUOTA +2.50 m l.m.m.
- SI DOVRANNO MONITORARE PERTANTO I CEDIMENTI DURANTE TUTTE LE FASI:
  - POSA E ZAVORRAMENTO
  - RIEMPIMENTO A TERGO
  - PRECARICA
- DURANTE TALI FASI IL MONITORAGGIO ANDRÀ ESEGUITO ALMENO OGNI 2 GIORNI O PIÙ, NEI RESTANTI PERIODI POTRÀ ESSERE ESEGUITO SOLO 2 VOLTE A SETTIMANA.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
GEOTECNICA
MONITORAGGI IN
CORSO D'OPERA

MI0102-PV-G-G-D-204-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	C. ROSSI	F. CANEPARO	G. FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:
MI0102-PV-G-G-D-204-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
