

FASE 1

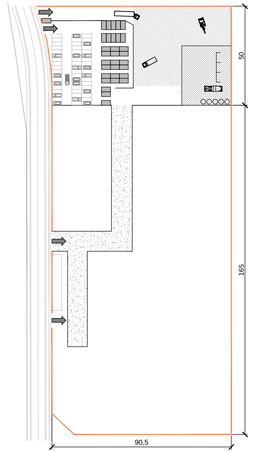


MESE 1
- Realizzazione recinzione di cantiere;
- tracciamento segnaletica stradale;
- realizzazione campo logistico;
- realizzazione strada di cantiere;
- realizzazione impianto di betonaggio.

FASE 2




MESI 2-5
- Scavo di sbancamento digestori anaerobici;
- realizzazione pali di fondazione;
- realizzazione platea di fondazione;
- delimitazione area di stoccaggio in prossimità dei digestori;
- realizzazione dei digestori.

FASE 3




MESI 6-8
- Ultimazione impianti digestori anaerobici;
- scavo di sbancamento edificio trattamento fanghi;
- realizzazione pali di fondazione;
- realizzazione platea di fondazione;
- realizzazione dei edificio trattamento fanghi;
- accantonamento materiale edificio trattamenti biologici.

FASE 4




MESI 9-10
- Ultimazione impianti edificio trattamento fanghi;
- scavo di sbancamento cabina elettrico/termica ed edificio trattamenti preliminari;
- realizzazione pali di fondazione;
- realizzazione platea di fondazione cabina elettrico/termica;
- realizzazione dei edificio cabina elettrico termica.

FASE 5




MESI 11-12
- Ultimazione impianti cabina elettrico/termica;
- scavo di sbancamento gasometro;
- realizzazione pali di fondazione;
- realizzazione platea di fondazione gasometro;
- realizzazione gasometro.

FASE 6




MESI 13-18
- ultimazione impianti gasometro;
- scavo di sbancamento edificio trattamenti biologici;
- realizzazione pali di fondazione;
- realizzazione platea di fondazione;
- dismissione area di stoccaggio in prossimità del gasometro.

FASE 7




MESI 19-24
- Montaggio prefabbricato edificio trattamenti preliminari;
- montaggio gru a torre;
- realizzazione vasche trattamento biologico;
- realizzazione copertura edificio trattamenti biologici;
- accantonamento materiali per impianti trattamenti preliminari.

FASE 8




MESI 25-28
- Realizzazione struttura interna edificio trattamenti preliminari;
- montaggi elettro-meccanici edificio trattamenti biologici;
- accantonamento materiali per impianti trattamenti preliminari.

FASE 9



MESI 25-28
- Ultimazione impianti edificio trattamenti preliminari;
- cablaggi elettrici edificio trattamenti biologici.

FASE 10



MESE 29
- Realizzazione recinzione definitiva e pavimentazione interna;
- rimozione del campo logistico;
- ripristino della segnaletica sulla viabilità esterna.

IRETI

Comune
GENOVA

Provincia
GENOVA

Titolo del progetto

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CENTRALE DI GENOVA D.A.C.

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
D-DEFINITIVO	I2 - DEPURAZIONE	GEN-GENERALE

Numero	Titolo	Scala
SIC.02	PSC IN FASE DEFINITIVA - FASI DI CANTIERE	1:1000

ID Progetto	Titolo sintetico	Codifica WBS
2016GESI0025-00	SIC.02 - PSC FASE DEFINITIVA	C10I2-L058-01-0004

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05 /12 /2017	Emissione	GP	AC	MG

Redatto: ing. Alessandro Romelli

Verificato: ing. Cosimo Parabita - IRETI

Approvato: ing. Claudio Casale - IRETI

IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

Redazione PSC in fase definitiva
STUDIO DI PROGETTAZIONE
Via Molfino 2/1 16154 GENOVA
tel. 0106517614 fax. 0106517614
mail prd@fastwebnet.it
