COROGRAFIA GENERALE

SCALA 1:5000

AMBITO AREA EX-CANILE –AMBITO GALLERIA				
MATERIALI PRODOTTI IN CANTIERE		**DESTINAZIONE**		
Tipologia	**Quantitativi**	**Destinazione**	**Quantitativo (m^3 in banco)**	**Distanza media**
DETRITO DA DEMOLIZIONE (MURATURE, CALCESTRUZZI)	0	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI EDILI	0	65
DEMOLIZIONE E SCARIFICA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	0	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI BITUMINOSI	0	65
MATERIALE TERRE E ROCCE DA SCAVO	703.685	INERTI REIMPIEGABILI – CENTRO RECUPERO	212.410	20
		INERTI NON REIMPIEGABILI - DISCARICA INERTI	49.967	120
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIPASCIMENTO	353.847	Varie
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIUTILIZZO PER C.A.	87.460	0
MATERIALE DERIVANTE DA BONIFICA	0	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	0	100

AMBITO LAVORI IN ALVEO				
MATERIALI PRODOTTI IN CANTIERE		**DESTINAZIONE**		
Tipologia	**Quantitativi**	**Destinazione**	**Quantitativo (m^3 in banco)**	**Distanza media**
DETRITO DA DEMOLIZIONE (MURATURE, CALCESTRUZZI)	1.450	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI EDILI	1.450	65
DEMOLIZIONE E SCARIFICA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	75	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI BITUMINOSI	75	65
MATERIALE TERRE E ROCCE DA SCAVO	75.170	INERTI REIMPIEGABILI – CENTRO RECUPERO	75.170	20
		INERTI NON REIMPIEGABILI - DISCARICA INERTI	0	120
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIPASCIMENTO	0	Varie
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIUTILIZZO PER C.A.	0	0
MATERIALE DERIVANTE DA BONIFICA	0	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	0	100

AMBITO AREA EX-CANILE – PIAZZALE CANTIERE				
MATERIALI PRODOTTI IN CANTIERE		**DESTINAZIONE**		
Tipologia	**Quantitativi**	**Destinazione**	**Quantitativo (m^3 in banco)**	**Distanza media**
DETRITO DA DEMOLIZIONE (MURATURE, CALCESTRUZZI)	5.800	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI EDILI	5.800	65
DEMOLIZIONE E SCARIFICA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	490	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI BITUMINOSI	490	65
MATERIALE TERRE E ROCCE DA SCAVO	20.942	INERTI REIMPIEGABILI – CENTRO RECUPERO	20.942	20
		INERTI NON REIMPIEGABILI - DISCARICA INERTI	0	120
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE – RIPASCIMENTO	0	Varie
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIUTILIZZO PER C.A.	0	0
MATERIALE DERIVANTE DA BONIFICA	1.626	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	1.626	100

AMBITO SBOCCO C.SO ITALIA				
MATERIALI PRODOTTI IN CANTIERE		**DESTINAZIONE**		
Tipologia	**Quantitativi**	**Destinazione**	**Quantitativo (m^3 in banco)**	**Distanza media**
DETRITO DA DEMOLIZIONE (MURATURE, CALCESTRUZZI)	350	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI EDILI	350	65
DEMOLIZIONE E SCARIFICA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	0	CENTRO DI RECUPERO MATERIALI BITUMINOSI	0	65
MATERIALE TERRE E ROCCE DA SCAVO	7.753	INERTI REIMPIEGABILI – CENTRO RECUPERO	7.753	20
		INERTI NON REIMPIEGABILI - DISCARICA INERTI	0	120
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE – RIPASCIMENTO	0	Varie
		INERTI FRANTUMATI IN CANTIERE - RIUTILIZZO PER C.A.	0	0
MATERIALE DERIVANTE DA BONIFICA	0	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	0	100

AREA DI CARICO MOLO FOCE BISAGNO

AREA DI CANTIERE N° 2 SBOCCO CORSO ITALIA

Via Barabino

Corso Sardegna

BISAGNO

MARASSI

Colla Panderino

Punta Vagno

BOCCADASSE

FOCE

SAN GIULIANO

LIDO D'ALBARO

PK 4+000.00

PK 3+000.00

PK 2+300.00

PK 0+063.623


PK 0+015.623

PK 0+000.00

INQUADRAMENTO GENERALE CON INDICAZIONE DELLE DISCARICHE DI MATERIALI INERTI

(FONTE REGIONE LIGURIA)

DISCARICHE IN ESERCIZIO AL DICEMBRE 2011, CON INDICAZIONE DI COMUNE, LOCALITA' E SOGGETTO GESTORE

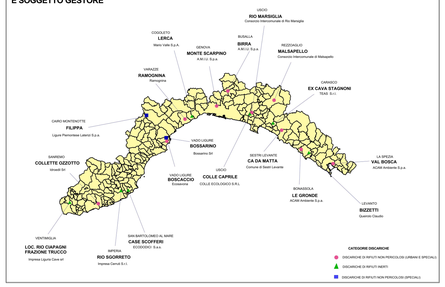


1. OPERA DI PRESA E DI SBARRAMENTO SUL TORRENTE BISAGNO
2. OPERA DI PRESA SUL RIO SCIORBA
3. GALLERIA DI SERVIZIO E CAMERONE
4. GALLERIA PRINCIPALE
5. COLLEGAMENTO AL MANUFATTO DI SBOCCO A MARE

LEGENDA TEMATISMI

- OPERE CHE RIFERISCONO AL CANTIERE N° 1
- OPERE CHE RIFERISCONO AL CANTIERE N° 2
- VIABILITA' AUTOSTRADALE
- CASELLO DI USCITA ED ENTRATA AUTOSTRADALE
- AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO
- AREA DI CARICO PONTONI

QUADRO D'UNIONE



ART AD GC FR 0734 01 09 202N 01

Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
1	09/2018	REVISIONE	CAMPI	FRESIA	CASSANI
0	11/2017	PRIMA EMISSIONE	CAMPI	FRESIA	CASSANI

REGIONE LIGURIA — #ItaliaSicura Presidenza del Consiglio dei Ministri — COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.G.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario: **Dott. Giovanni TOTI**

PROGETTISTI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: **Ing. Luca BERRUTI**

CAPOGRUPPO MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A. — CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel campo della GEOINGEGNERIA

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Ing. Stefano PINASCO**

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria. Rocksoil S.p.A. Ing. Giovanna Cassani Ord. Ingg. Milano N° 20997

MANDANTI: art ambiente risorse territorio — HYDRODATA

Ing. Mario CANGIANO — **Ing. Paolo GALLO** — **Ing. Francesco DE SANCTIS** — **Dott.ssa Francesca GIOMI**

Progettista/Progettisti responsabili elaborato
ART ambiente risorse territorio s.r.l
Ing. Ivo FRESIA
Ord. Ingg. Genova N° 12585

Ing. Giovanna CASSANI
Ord. Ingg. Milano N° 20997

Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO | N° Progr. ---- | Codice elaborato BIS2E - A - CAN02 - PL04 - 1

Oggetto della tavola

CANTIERIZZAZIONE
PIANO UTILIZZO TERRE (PUT)
Planimetria con evidenziati i flussi e movimentazioni dei materiali all'esterno del cantiere - Tav. 2/2

Scala: 1:5000

Data: 14 SETT. 2018

Codice FILE: BIS2E-A-CAN02-PL03_04-1.DWG

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
