| Regione Liguria | Comune Cairo Montenotte | Comune Savona | Provincia Savona |
|---|---|---|---|
| REGIONE LIGURIA | | | PAR PARIBVS |

# PARCO EOLICO DI SAVONA - LOC. PIANDELMELO (9 MW)

## Cronoprogramma dei lavori

## Rel. 13

*Progetto definitivo*

*Rev. 00 - Novembre 2023*


*PROGETTISTA*

Ing. Samuele Viara
Via Damilano, 24
12049 Trinità (CN)


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Bissi Marco
05.12.2023
11:15:32
GMT+00:00

Firmato digitalmente da

**samuele viara**

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
C = IT

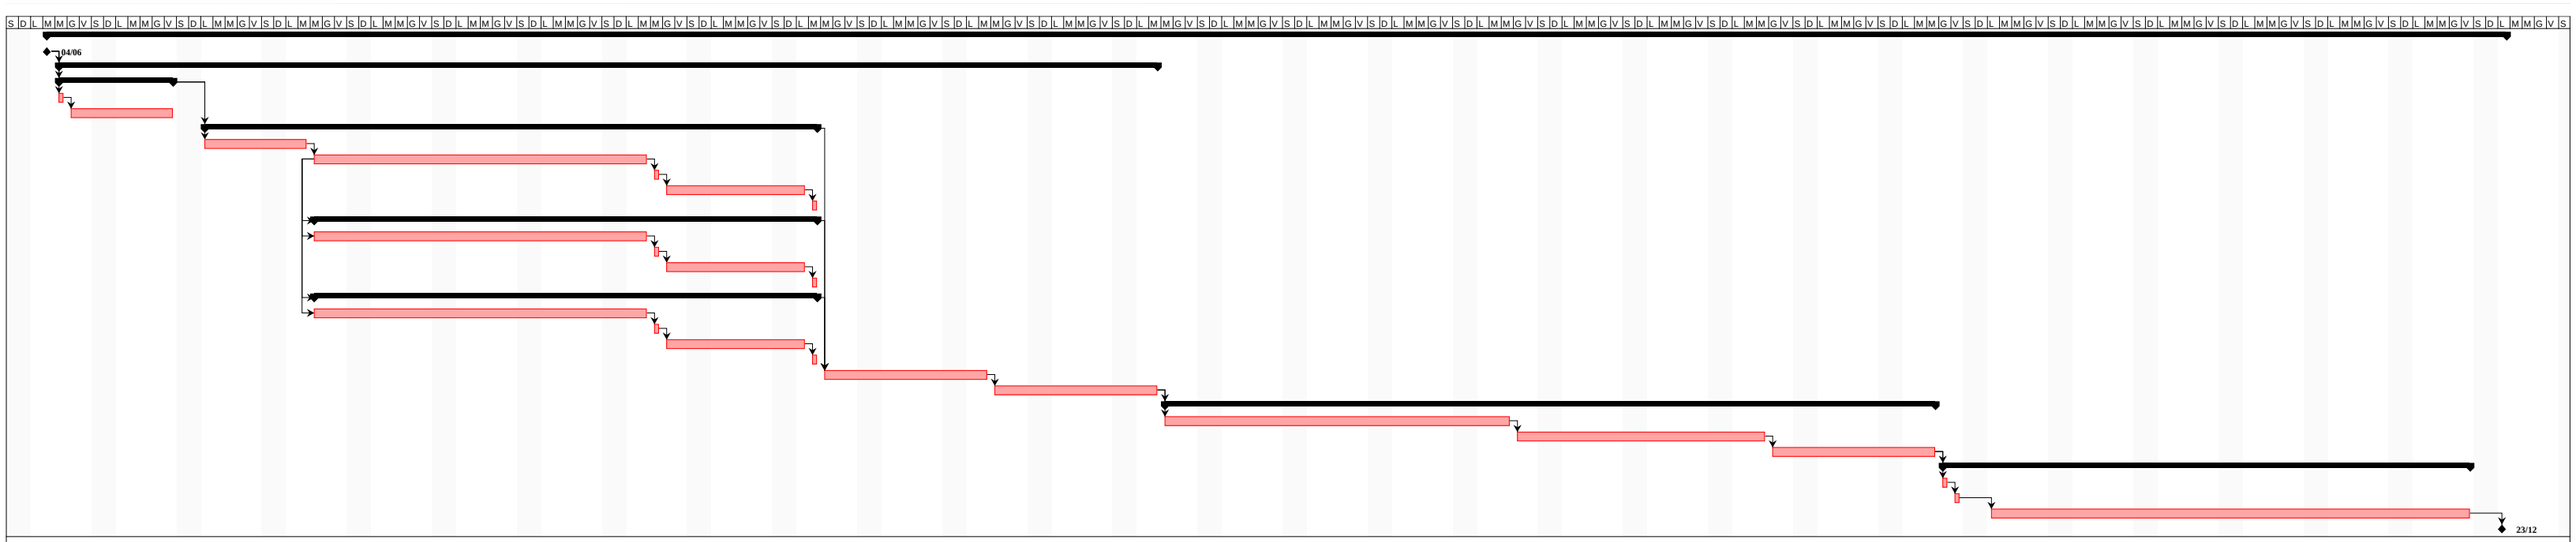

**BH Wind s.r.l.**

Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159
fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com - info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO - 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

| | Nome | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **CRONOPROGAMMA REALIZZAZIONE PARCO EOLICO DI SAVONA - LOC. PIANDELMELO (9 MW)** | **145 giorni** |
| 2 | Inizio lavori | 1 giorno |
| 3 | **Realizzazione opere civili** | **65 giorni** |
| 4 | **Allestimento cantieri e pulizia aree** | **8 giorni** |
| 5 | Delimitazione area di cantiere | 1 giorno |
| 6 | Taglio piante | 7 giorni |
| 7 | **Realizzazione WTG 01** | **37 giorni** |
| 8 | Realizzazione delle viabilità della piazzola WTG01 | 7 giorni |
| 9 | Scavi piazzola e fondazioni WTG03 | 20 giorni |
| 10 | Getto magrone | 1 giorno |
| 11 | Posa armatura plinto di fondazione | 8 giorni |
| 12 | Getto plinto di fondazione | 1 giorno |
| 13 | **Realizzazione WTG 02** | **30 giorni** |
| 14 | Scavi piazzola e fondazioni WTG02 | 20 giorni |
| 15 | Getto magrone | 1 giorno |
| 16 | Posa armatura plinto di fondazione | 8 giorni |
| 17 | Getto plinto di fondazione | 1 giorno |
| 18 | **Realizzazione WTG 03** | **30 giorni** |
| 19 | Scavi piazzola e fondazioni WTG03 | 20 giorni |
| 20 | Getto magrone | 1 giorno |
| 21 | Posa armatura plinto di fondazione | 8 giorni |
| 22 | Getto plinto di fondazione | 1 giorno |
| 23 | Realizzazione locale tecnico e cabina di consegna | 10 giorni |
| 24 | Posa dei cavidotti | 10 giorni |
| 25 | **Montaggi** | **46 giorni** |
| 26 | Montaggio strutturale Aerogeneratori | 21 giorni |
| 27 | Montaggio elettrico Aerogeneratori | 15 giorni |
| 28 | Allestimento quadri di parellelo locale utente | 10 giorni |
| 29 | **Avviamento impianto e chiusura lavori** | **32 giorni** |
| 30 | Collaudo ENEL | 1 giorno |
| 31 | Primo parallelo | 1 giorno |
| 32 | Ripristini ambientali | 30 giorni |
| 33 | Fine lavori | 1 giorno |


04/06
23/12
