
ID	Nome attività
1	**GALLERIA PRINCIPALE FEREGGIANO**
2	**Galleria Fereggiano**
3	Riattivazione imbocco
4	Scavo e rivestimento provvisorio nuovo tratto (5 m/g)
5	realizzazione aerofori/sfiati
6	realizzazione rivestimento definitivo
7	opere relative allo scivolo di raccordo di valle nella sezione a ferro di cavallo (100 m)
8	Riattivazione tratto esistente e pulitura finale (909 m)
9	**OPERE DI PRESA**
10	**RIO NOCE**
11	realizzazione allargo-confluenza
12	scavo e rivestimento galleria di collegamento (3 m/g)
13	opera di presa - lavorazioni dalla superficie (ATTIVITA' A)
14	camera di dissipazione (ATTIVITA' B)
15	realizzazione dei pozzi (ATTIVITA' C)
16	opera di presa - finiture (ATTIVITA' D)
17	**RIO ROVARE**
18	realizzazione allargo-confluenza
19	scavo e rivestimento galleria di collegamento (3 m/g)
20	opera di presa - lavorazioni dalla superficie (ATTIVITA' A)
21	camera di dissipazione (ATTIVITA' B)
22	realizzazione dei pozzi (ATTIVITA' C)
23	opera di presa - finiture (ATTIVITA' D)
24	**RIO FEREGGIANO**
25	opera di presa - lavorazioni dalla superficie (ATTIVITA' A)
26	camera di dissipazione (ATTIVITA' B)
27	realizzazione dei pozzi (ATTIVITA' C)
28	opera di presa - finiture (ATTIVITA' D)
29	**OPERA DI SBOCCO A MARE**
30	dragaggio di imposta della scogliera di protezione (lato ponente) (FASE A)
31	realizzazione scogliera di protezione (lato ponente) (FASE A)
32	realizzazione scalo di alaggio (FASE A)
33	dragaggio di imposta della scogliera di protezione (lato levante) (FASE B)
34	esecuzione pali trivellati a mare (FASE B)
35	esecuzione diaframmi (FASE B)
36	adeguamento tura per attracco provvisorio smarino e relativa rimozione (FASE B)
37	realizzazione scogliera di protezione (lato levante) (FASE B)
38	scavo a sez. obbligata (con messa in opera dei tiranti) ed event. imperm. Fondo (FASE C)
39	getto del manufatto di sbocco (FASE C)
40	getto dello scatolare di raccordo Fereggiano - opera di sbocco (FASE C)
41	demolizione parziale dei pali e sistemazione spiaggia (FASE C)

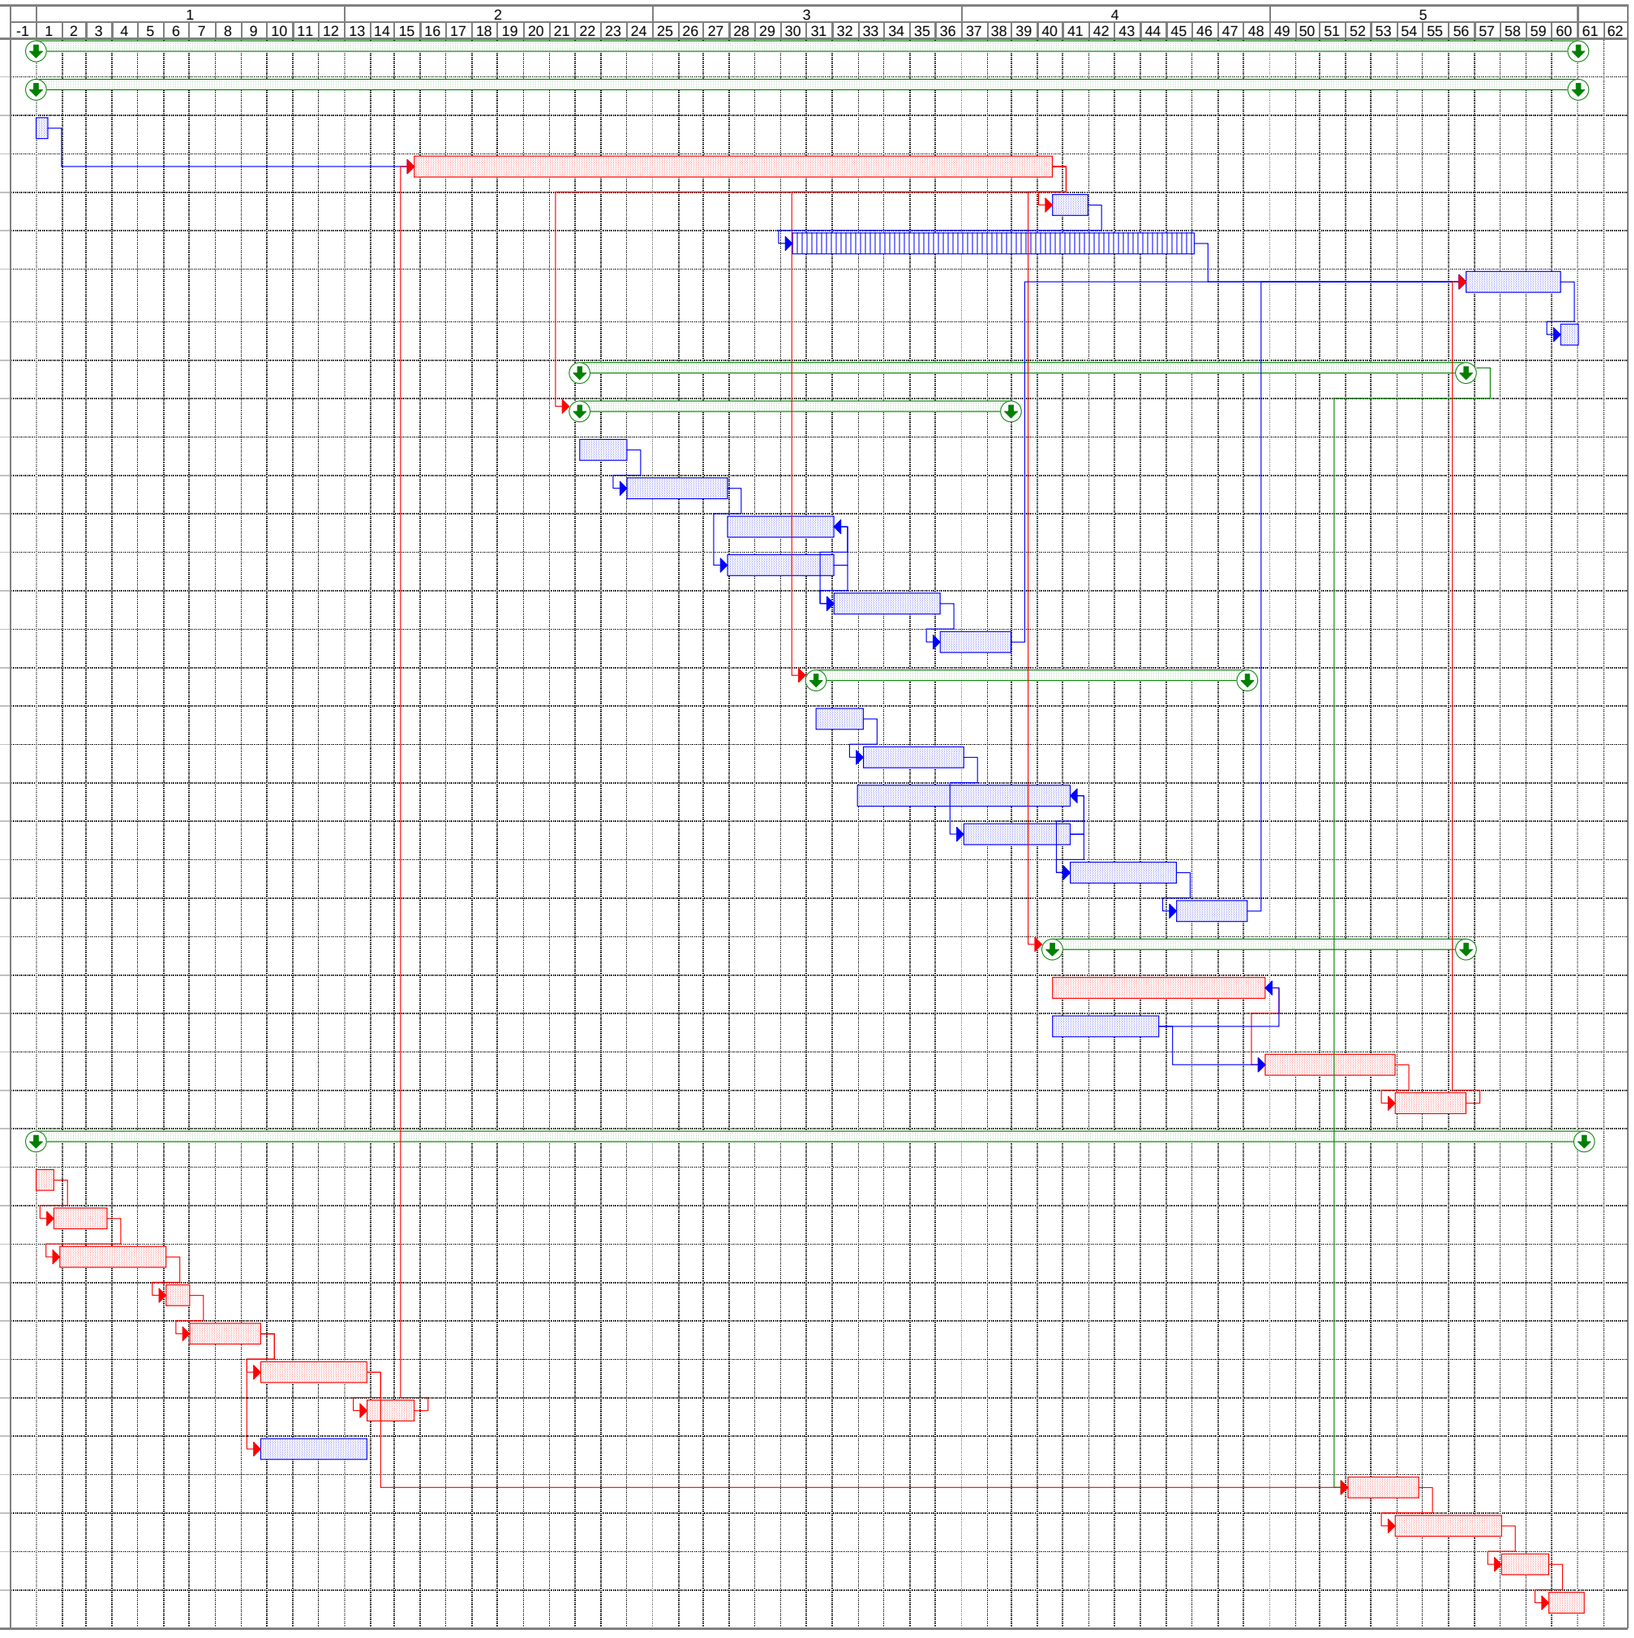

Attività Attività critica Riepilogo
