N°	OPERAZIONE
1	REALIZZAZIONE MURI DI SPINTA E PARETI LATERALI PER GUIDA MANUFATTO A SPINTA
2	REALIZZAZIONE MANUFATTO DI SPINTA MURI DI SPINTA IN AREA DI SCAVO
3	OPERAZIONI PER SOSTEGNO BINARI TRATTA GENOVA-VENTIMIGLIA DURANTE FASI DI SPINTA MANUFATTO
4	SPINTA MANUFATTO SOTTO LA DI BINARI GENOVA-VENTIMIGLIA

TUBAZIONI OLEODOTTI, PROGETTO ELABORATO DALLE SOCIETA' IPLOM - SIGEMI - SEAPAD E ALLEGATO ALLA RELAZIONE DELLE INTERFERENZE

Binari Non rilevati per treni merci parcheggiati

Binari di corsa Genova - Ventimiglia

AREA DI CANTIERE


NEW JERSEY

VIA RONCHI

MURO DI CONTROSPINTA

Quote Di Fondo Approssimate

KEY-MAP

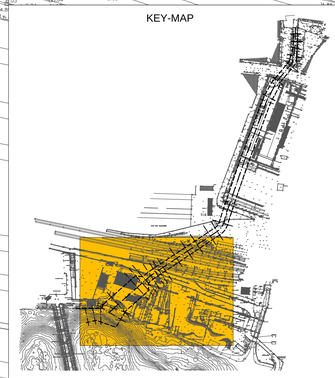

LEGENDA SOTTOSERVIZI:

- ACQUEDOTTO- MEDITERRANEA D. A. DN 200-250 750
- ACQUE BIANCHE
- ACQUE MISTE
- FOGNATURA - MEDITERRANEA D. A. DN 500
- BT (SASTERNET) e metroweb
- INTEROUTE
- FASTWEB
- E-via SPA
- METROWEB
- TELECOM
- AT (TERNA)
- ENEL_MT
- ENEL_BT_LINEA INTERRATA
- ENEL_BT_LINEA AEREA
- ASTER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- OLEODOTTI (ENI-SEAPAD-SIGEA)
- RETE GAS
- SOTTOSERVIZI DA PROGETTO
- SOTTOSERVIZI DA DISMETTERE

LEGENDA:

- OPERE IN PROGETTO
- JET GROUTING
- AREA DI CANTIERE
- DEMOLIZIONE/RICOLLOCAZIONE
- AREA DI SCAVO
- NEW JERSEY
- SOTTOSERVIZIO DA RICOLLOCARE
- ESISTENTE
- NUOVO TRACCIATO RIO MOLINASSI

Scala 1:200

0 2 4 6 8 10m

CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

COCIV

PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

LOTTO 1

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE URBANO DEL RIO MOLINASSI

FASI REALIZZATIVE
VIA RONCHI 3 di 6

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH.
BUILDING A BETTER WORLD

MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova 20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 21084 Fax +39 02 2663 0273 Mail: mwh.italia@mwhglobal.com

SCALA: 1:200

COMMESSA	FASE	LOTTO	TIPO.DOC.	PROGR.	REV.
4 5 5 0 2 3 7 6	D	1	D	0 2 6	B

PROGETTAZIONE :

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima Emissione	Vanni	30/09/2014	Lonardini	30/09/2014	Susani	30/09/2014
B	Seconda Emissione	Vanni	05/12/2014	Lonardini	05/12/2014	Susani	05/12/2014

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. M. Susani

VERIFICATO :

VALIDATO : AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Peracci	Dott. Geol. G. Carrepa Geom. L. Delleplaine Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Scutto Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi
