
N°	OPERAZIONE
1	REALIZZAZIONE TRATTO RIO MOLINASSI IN AREA RFI E DEMOLIZIONE JET GROUTING
2	ELIMINAZIONE DELLA VIABILITA' PROVVISORIA
3	REALIZZAZIONE PALANCOLE E JET GROUTING LATO SUD DI VIA RONCHI
4	DEMOLIZIONE JET GROUTING IN CORRISPONDENZA DELLO SCAVO DEL MANUFATTO DI SPINTA
5	REALIZZAZIONE PARETI RIO MOLINASSI IN AREA FOCE

TUBAZIONI OLEODOTTI, PROGETTO ELABORATO DALLE SOCIETA' IPLOM - SIGEMI - SEAPAD E ALLEGATO ALLA RELAZIONE DELLE INTERFERENZE

Binari Non rilevati per treni merci parcheggiati

Binari di corsa Genova - Ventimiglia

KEY-MAP

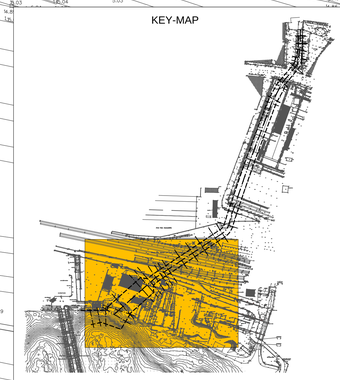

LEGENDA SOTTOSERVIZI:

- ACQUEDOTTO- MEDITERRANEA D. A. DN 200-250 750
- ACQUE BIANCHE
- ACQUE MISTE
- FOGNATURA - MEDITERRANEA D. A. DN 500
- BT (SASTERNET) e metroweb
- INTEROUTE
- FASTWEB
- E-via SPA
- METROWEB
- TELECOM
- AT (TERNA)
- ENEL_MT
- ENEL_BT_LINEA INTERRATA
- ENEL_BT_LINEA AEREA
- ASTER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- OLEODOTTI (ENI-SEAPAD-SIGEA)
- RETE GAS
- SOTTOSERVIZI DA PROGETTO
- SOTTOSERVIZI DA DISMETTERE

LEGENDA:

- OPERE IN PROGETTO
- JET GROUTING
- AREA DI CANTIERE
- DEMOLIZIONE/RICOLLOCAZIONE
- AREA DI SCAVO
- NEW JERSEY
- SOTTOSERVIZIO DA RICOLLOCARE
- ESISTENTE
- NUOVO TRACCIATO RIO MOLINASSI

Scala 1:200

0 2 4 6 8 10m

CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

LOTTO 1

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE URBANO DEL RIO MOLINASSI

FASI REALIZZATIVE
VIA RONCHI 6 di 6

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH. BUILDING A BETTER WORLD

MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Cormia 20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 21091 Fax. +39 02 2882423 Mail: mwh.italia@mwhglobal.com

SCALA: 1:200

COMMESSA	FASE	LOTTO	TIPO DOC.	PROGR.	REV.
4 5 5 0 2 3 7 6	D	1	D	0 2 6	B

PROGETTAZIONE :

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima Emissione	Vanni	30/09/2014	Lonardini	30/09/2014	Susani	30/09/2014
B	Seconda Emissione	Vanni	05/12/2014	Lonardini	05/12/2014	Susani	05/12/2014

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. P. Susani

VERIFICATO :

VALIDATO : AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Pieracci	Dott. Geol. G. Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Scutto Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vivoloni
