STUDIOd'INGEGNERIA
Calvo Delfino & Associati

Comune di Dego

Provincia di Savona

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA DI PRESA SU RIO POLLOVERO PER GARANTIRE IL RILASCIO DEL DMV E LA RISALITA DELLE SPECIE ITTICHE

DECRETO AUTORIZZATIVO

N. 6387 DEL 21.12.2017

RELAZIONE DI FINE LAVORI
E
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Committente: **VERALLIA ITALIA S.p.a.**

Direttore dei Lavori:

Ing. Giuseppe CALVO

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n° 661

Data, lì 18.12.2018

DE1090534

17043 Carcare (SV)
P.zza S. Pertini 6
Tel. 019 518 655
Fax 019 510 193
info@calvodelfino.it
C.F./P.IVA 00829170091

Premessa

I lavori, oggetto del presente progetto, riguardano interventi eseguiti sull'opera di presa presente sul Rio Pollovero, nel Comune di Dego (SV), a servizio dello Stabilimento Verallia Italia S.p.a. di Dego, richiesti dal Decreto di Screening n. 610 della Giunta Regionale Regione Liguria in data 15.02.2017 (Rifacimento ed ampliamento Forno 11) necessarie a garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e la risalita delle specie ittiche.

Le opere furono autorizzate con Decreto della Regione Liguria – Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Difesa del Suolo Savona e Imperia – n. 6387 del 21.12.2017.

Descrizione delle opere realizzate

Le opere realizzate consistono:

- nella realizzazione di uno stramazzo realizzato nella briglia di derivazione, dimensionato per il rilascio del DMV;
- nella posa in opera di una scala di risalita delle specie ittiche, consistente nella formazione di più bacini, posti ad un dislivello, tra di loro, di circa 10 cm.

Certificazione del Direttore dei Lavori

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Calvo, con studio in Carcare (SV), Piazza Pertini, n. 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 661, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopradescritte

certifica

- che i lavori si sono conclusi in data 18.12.2018
- la corretta esecuzione delle opere e la loro rispondenza, salvo ininfluenti adattamenti all'effettiva conformazione dei luoghi, agli elaborati progettuali;
- l'adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto autorizzativo.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Calvo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 01



Foto n. 02

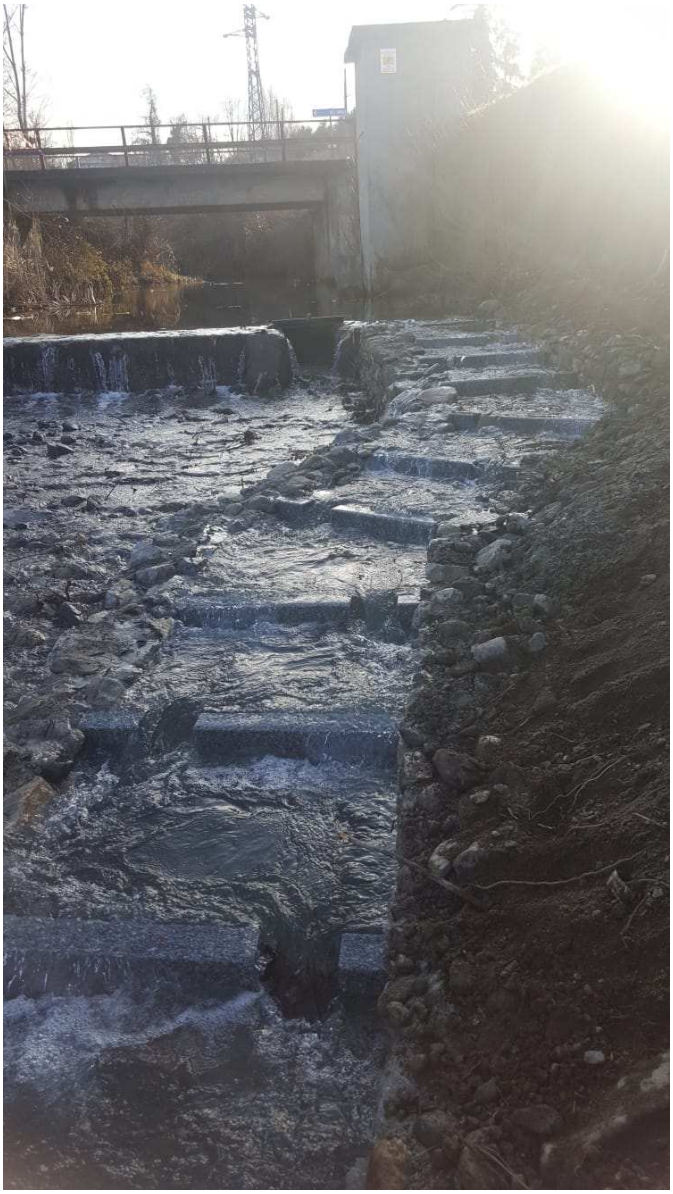


Foto n. 03



Foto n. 04
