
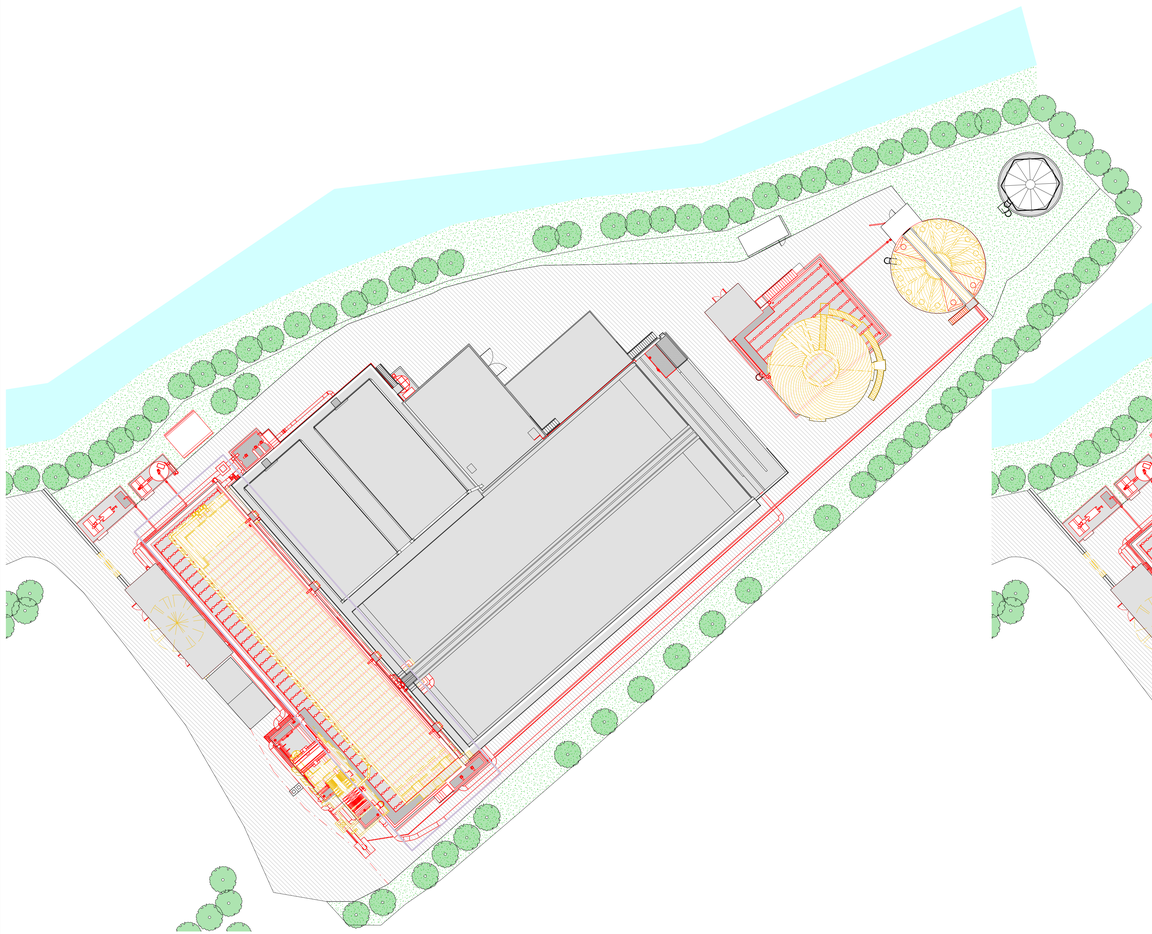


FASE 3
1 : 250

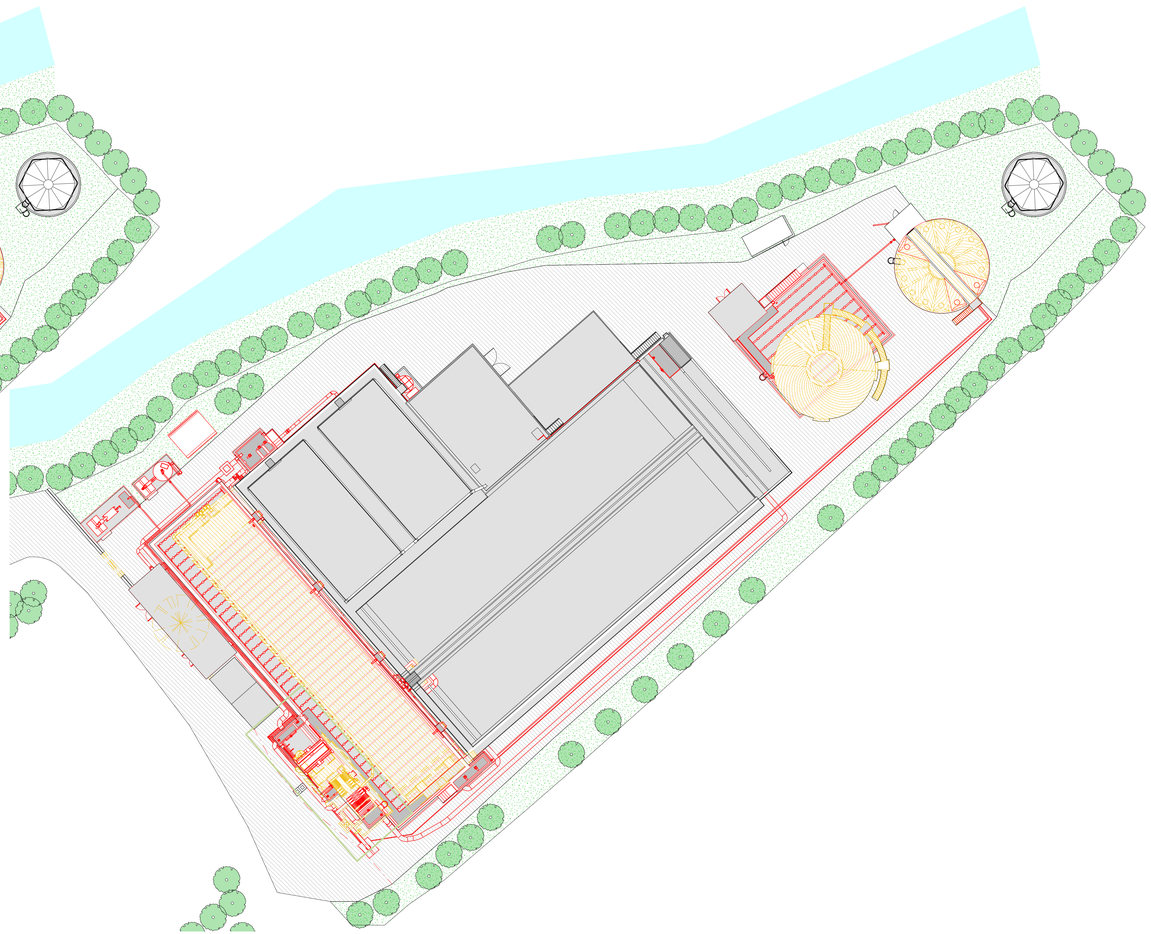

FASE 4
1 : 250

LEGENDA FASI

Comparto di intervento	Progressivo	Tipo lavoro	Descrizione lavori
FASE 3 - Demolizione sedimentatore primario e realizzazione nuovo comparto biologico			
Sedimentatore primario	1	Smantellamenti	Rimozione apparecchiature elettromeccaniche sedimentatore primario
		Demolizione	Demolizione sedimentatore primario
		Posa tubazioni	Predisposizione nuovi collegamenti fra biologia e sedimentazione
Comparto biologico (nuovo reattore) e ripartitore alla sedimentazione	2	Scavi	Scavi per la realizzazione del ripartitore al comparto biologico
		Opere civili	Realizzazione nuovo reattore biologico e ripartitore alla sedimentazione
		Carpenterie metalliche	Posa griglioli, realizzazione parapetti e scale di accesso
		Posa tubazioni	Collegamento a nuovo ripartitore alla biologia, predisposizione collegamento a sedimentazione
		Opere elettromeccaniche	Installazione apparecchiature elettromeccaniche a servizio del comparto (rete di diffusori, paratoie, strumenti)
		Opere elettriche	Posa /collegamento di cavidotti / cavi elettrici /quadri e alimentazione utenze elettromeccaniche
FASE 4 - Realizzazione nuovi pretrattamenti			
Arrivo e pretrattamenti esistenti	1	Smantellamenti	Rimozione opere elettromeccaniche fuori servizio e griglia da ricollocare
		Demolizione	Demolizione arrivo e pretrattamenti esistenti
Nuovi arrivo e pretrattamenti	2	Scavi	Scavi per la realizzazione nuovi arrivo e pretrattamenti
		Opere civili	Realizzazione nuovi arrivo e pretrattamenti
		Carpenterie metalliche	Posa griglioli, realizzazione parapetti e scale di accesso
		Posa tubazioni	Collegamento a nuovo ripartitore alla biologia, predisposizione collegamento a sedimentazione
		Opere elettromeccaniche	Installazione apparecchiature elettromeccaniche a servizio del comparto (griglia esistente)
		Opere elettriche	Posa /collegamento di cavidotti / cavi elettrici /quadri e alimentazione utenze elettromeccaniche

Comune
RONCO SCRIVIA

Provincia
GENOVA

Titolo del progetto

REVAMPING DEL DEPURATORE DI RONCO SCRIVIA (GE) LOTTI 2 E 3

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
D - DEFINITIVO	I2 - DEPURAZIONE	IMP - IMPIANTI

Numero	Titolo	Scala
EG-010	Planimetria fasi d'intervento 3-4	1:250

ID Progetto	Titolo sintetico	Codifica WBS
2016GES0046-00	2016GES0046-00-D-I2-IMP-EG-010-00.pdf	C75I2-A004-08-0001

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05/2021	Emissione	ETC	CC	FG

Redatto: Angelo Cantatore

Verificato: Claudio Casale

Approvato: Francesco Gaglio

IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A. - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

etc
E.T.C. Engineering s.r.l.
Via dei Palustri 16, 36121 Meano (TN)
Tel./Fax: 0461 825965 - e-mail: info@etc-eng.it
Cod.fisc. e P.IVA n° 02067250221
