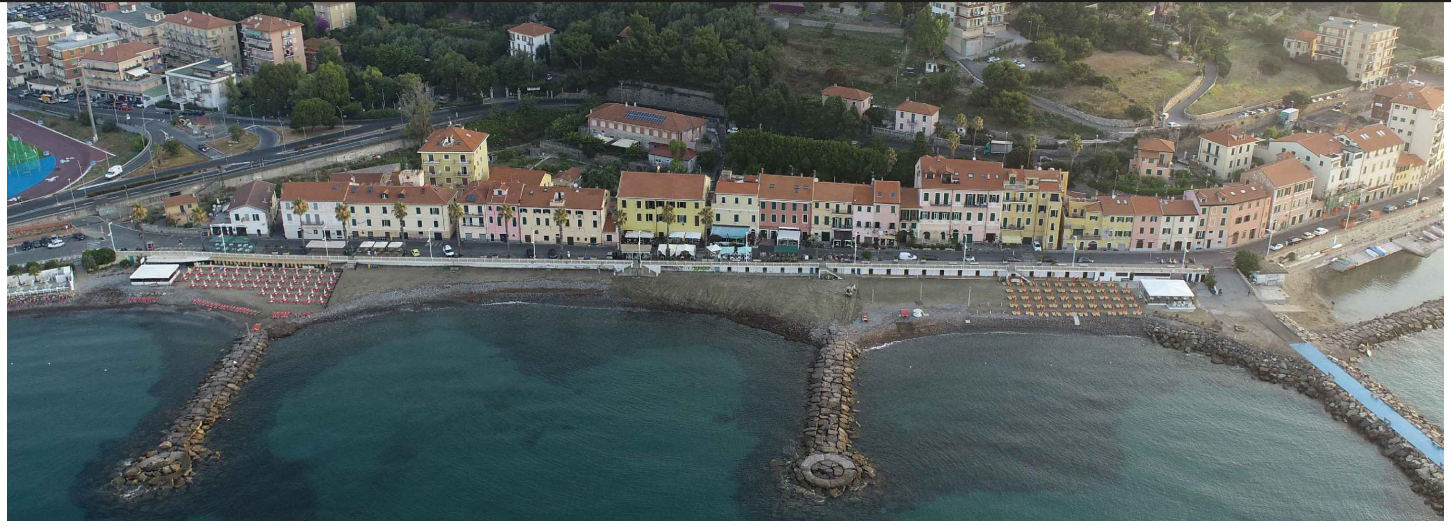


ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI

CUP D57H21001220001

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L
Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	__:___	07/12/2022

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2	07/12/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INTEGRAZIONE		F.T.	D.G.
1	27/05/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO VAR		F.T.	D.G.
0	30/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	F.T.	F.T.	D.G.

TITOLO	TAV N°
CRONOPROGRAMMA	19

ALLEGATO "A"

Comune di Imperia
Provincia di IM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 - DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO - RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI - CUP D57H21001220001 - CIG 9015068D72
COMMITTENTE:	COMUNE DI IMPERIA.
CANTIERE:	Lungomare C. Colombo, Imperia (IM)

Genova, 07/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Arch. Rizzo Silvia)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(ing Marvaldi Marco)

Arch. Rizzo Silvia
Vico delle Vele 7/2
16128 Genova (GE)
Tel.: 0102462478 - Fax: 010 42031123
E-Mail: ufficio@LDpiuSR.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	7 g
Preparazione delle aree di cantiere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g
Interventi di preparazione delle aree di cantiere	3 g
Apprestamenti del cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Impianti di servizio del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Ripascimento spiaggia	107 g
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri)	107 g
Salpamento (mezzi terrestri)	107 g
Ridifinizione pennelli, isole e scogliera	119 g
Realizzazione di pennello ed isole (mezzi terrestri)	88 g
Realizzazione di pennello ed isole (mezzi marittimi)	88 g
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)	31 g
Realizzazione di scogliera (mezzi marittimi)	31 g
Salpamento (mezzi marittimi)	31 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
MISURE PER CANTIERE	124 g
Coordinamento generale	124 g
Comitato di cantiere	3 g
Ripresa dei lavori dopo l'emergenza COVID-19	3 g
Organizzazione del lavoro	3 g
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere	3 g
Controllo della certificazione verde COVID-19	124 g
Controllo della temperatura corporea obbligatorio	124 g
Modalità d'accesso dei fornitori esterni	3 g
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica	119 g
Presidio sanitario di cantiere COVID-19	119 g
Gestione di una persona sintomatica	3 g
Caso di persona positiva a COVID-19	3 g
Informazione e formazione	3 g
Sorveglianza sanitaria	119 g
Tecnologie per controllo	119 g
Organizzazione del cantiere	9 g
Accessi	3 g
Servizi igienici	4 g
Spogliatoi	4 g
Uffici	4 g
Mezzi d'opera	4 g
Impianti di alimentazione	2 g
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali	4 g
Zone di carico e scarico	4 g
Lavorazioni	4 g
Lavoratori	4 g
Macchine e operatori	4 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = APPRESTAMENTI	
Z2 = OPERE EDILI	
Z3 = OPERE A MARE	
Z4 = ORGANIZZAZIONE COVID	

