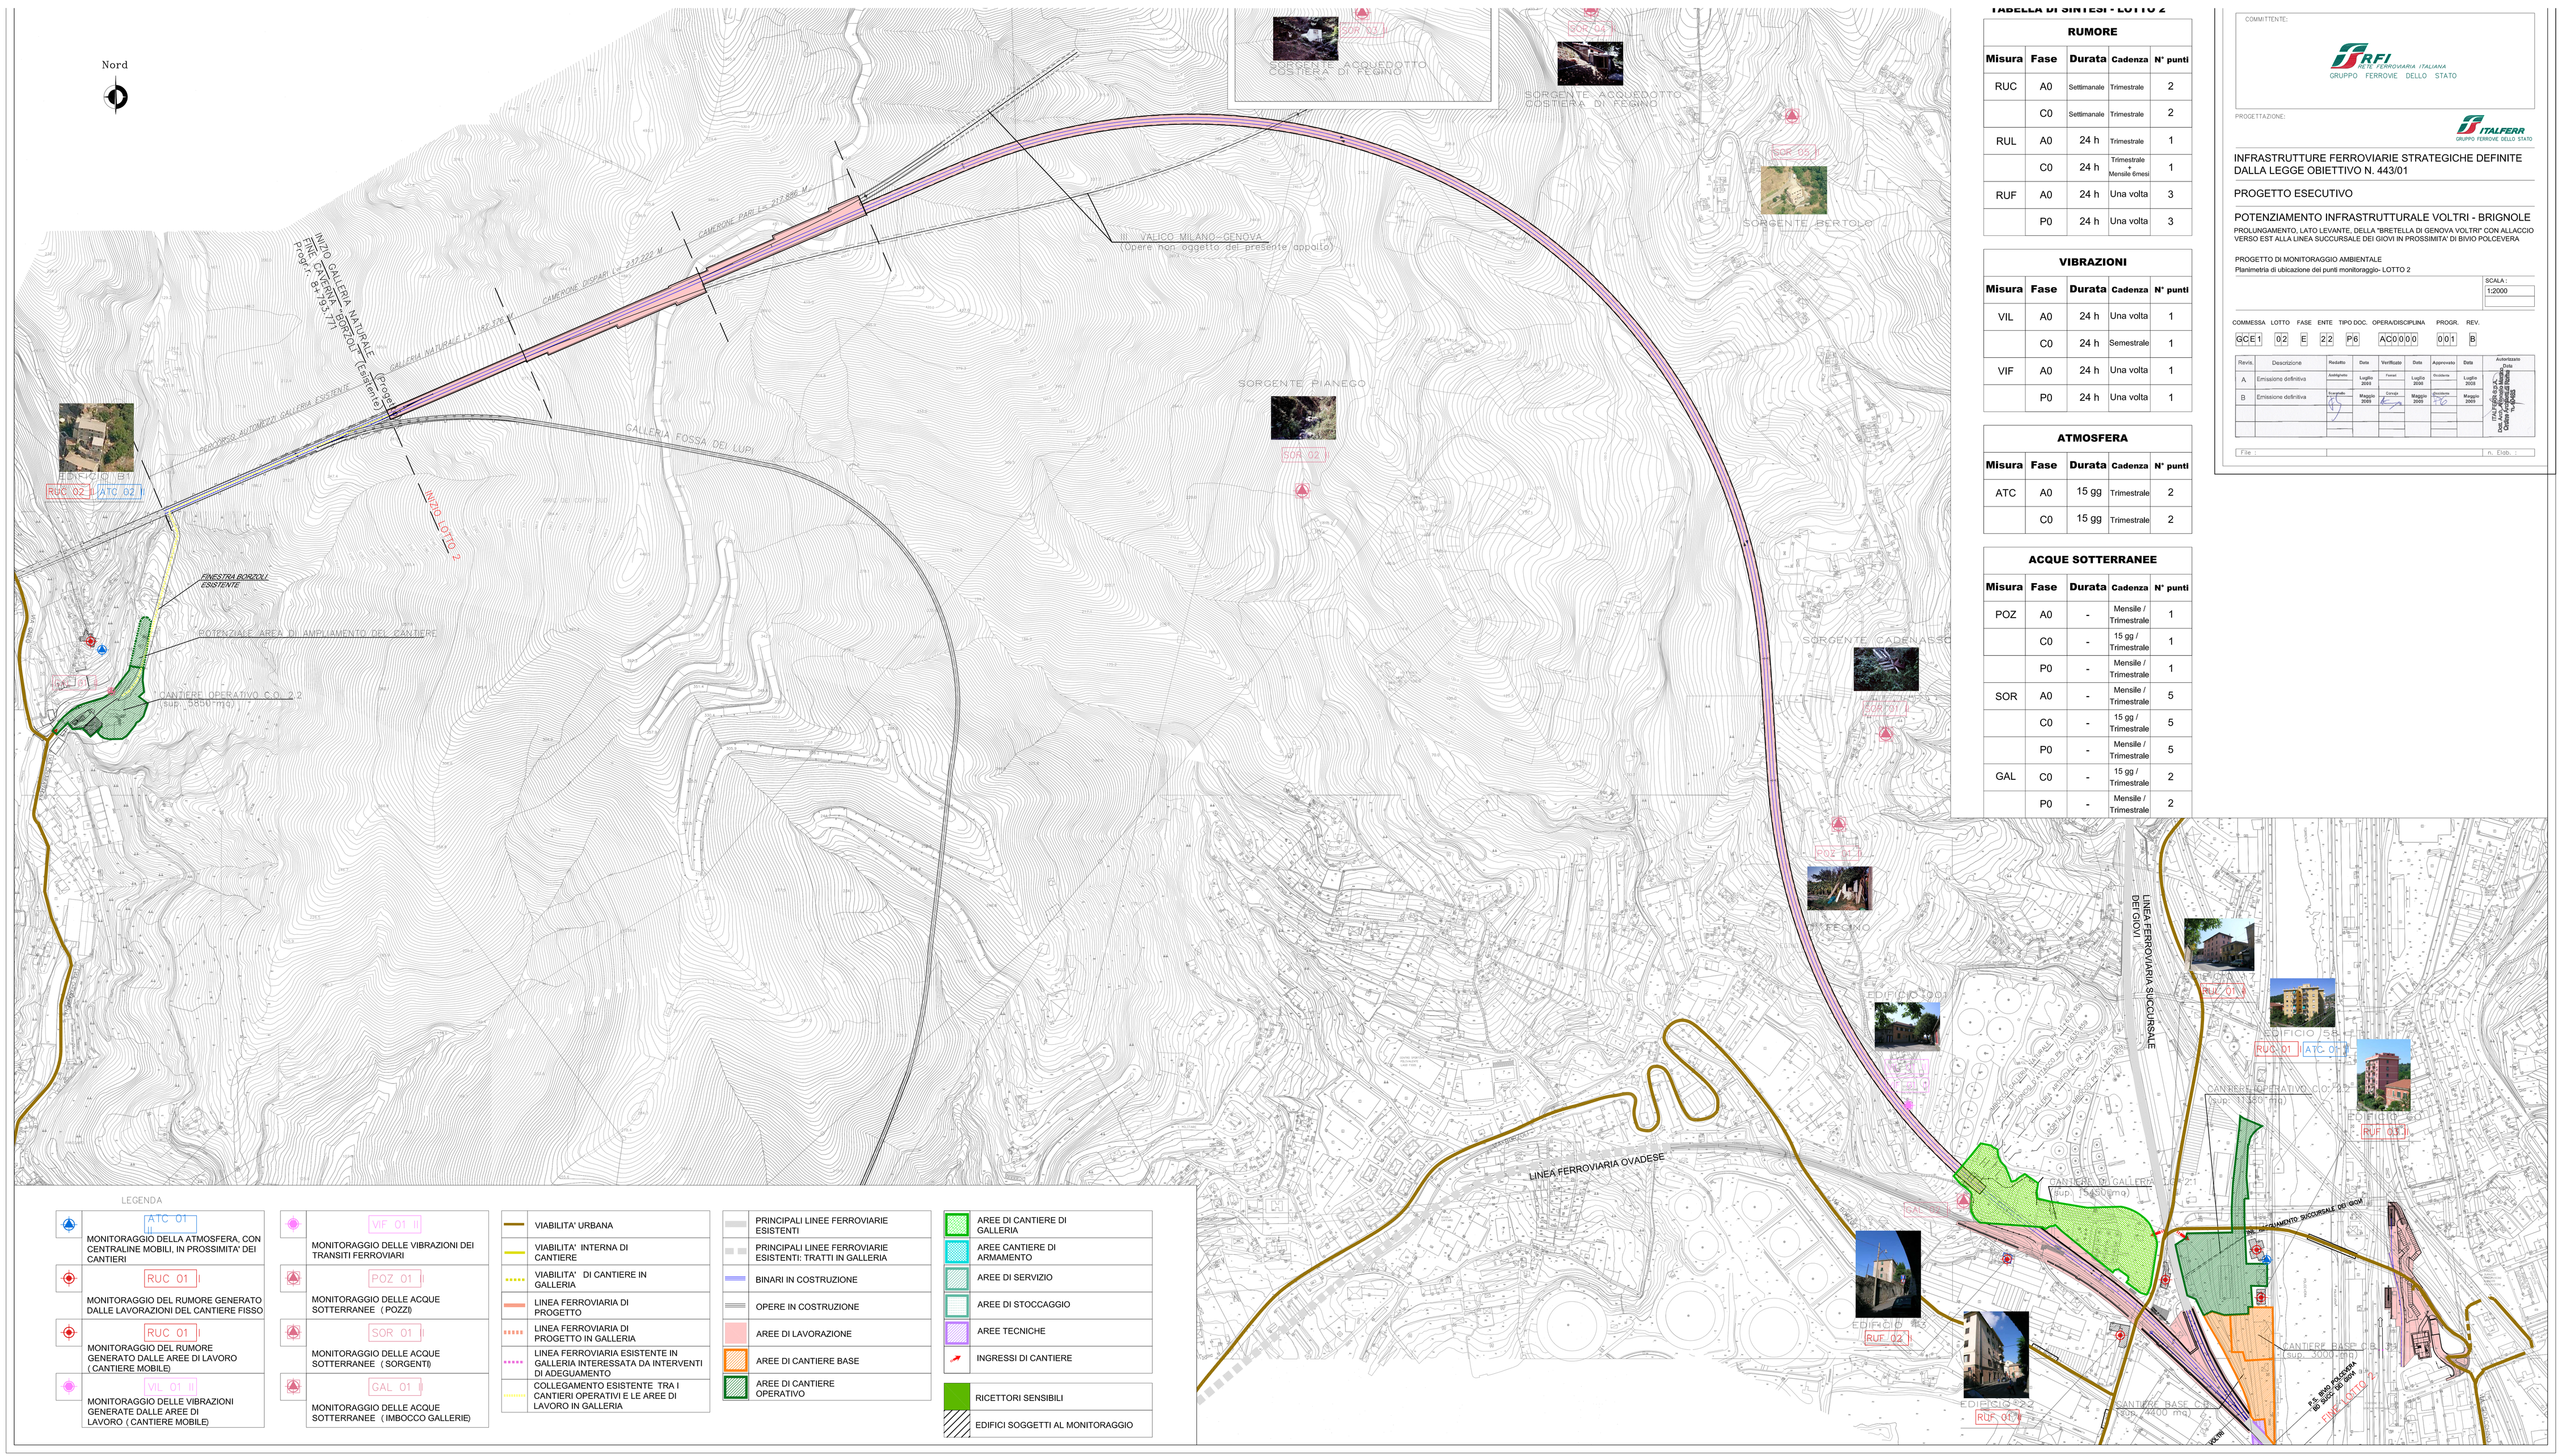


LEGENDA

- ATC_01 — MONITORAGGIO DELLA ATMOSFERA, CON CENTRALINE MOBILI, IN PROSSIMITA' DEI CANTIERI
- RUC_01 — MONITORAGGIO DEL RUMORE GENERATO DALLE LAVORAZIONI DEL CANTIERE FISSO
- RUC_01 — MONITORAGGIO DEL RUMORE GENERATO DALLE AREE DI LAVORO (CANTIERE MOBILE)
- VIL_01 — MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI GENERATE DALLE AREE DI LAVORO (CANTIERE MOBILE)
- VIF_01 — MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI DEI TRANSITI FERROVIARI
- POZ_01 — MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (POZZI)
- SOR_01 — MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (SORGENTI)
- GAL_01 — MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (IMBOCCO GALLERIE)

- VIABILITA' URBANA
- VIABILITA' INTERNA DI CANTIERE
- VIABILITA' DI CANTIERE IN GALLERIA
- LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
- LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO IN GALLERIA
- LINEA FERROVIARIA ESISTENTE IN GALLERIA INTERESSATA DA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
- COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA I CANTIERI OPERATIVI E LE AREE DI LAVORO IN GALLERIA

- PRINCIPALI LINEE FERROVIARIE ESISTENTI
- PRINCIPALI LINEE FERROVIARIE ESISTENTI: TRATTI IN GALLERIA
- BINARI IN COSTRUZIONE
- OPERE IN COSTRUZIONE
- AREE DI LAVORAZIONE
- AREE DI CANTIERE BASE
- AREE DI CANTIERE OPERATIVO

- AREE DI CANTIERE DI GALLERIA
- AREE CANTIERE DI ARMAMENTO
- AREE DI SERVIZIO
- AREE DI STOCCAGGIO
- AREE TECNICHE
- INGRESSI DI CANTIERE

- RICETTORI SENSIBILI
- EDIFICI SOGGETTI AL MONITORAGGIO

TABELLA DI SINTESI - LOTTO 2

RUMORE

Misura	Fase	Durata	Cadenza	N° punti
RUC	A0	Settimanale	Trimestrale	2
	C0	Settimanale	Trimestrale	2
RUL	A0	24 h	Trimestrale	1
	C0	24 h	Trimestrale Mensile 6mesi	1
RUF	A0	24 h	Una volta	3
	P0	24 h	Una volta	3

VIBRAZIONI

Misura	Fase	Durata	Cadenza	N° punti
VIL	A0	24 h	Una volta	1
	C0	24 h	Semestrale	1
VIF	A0	24 h	Una volta	1
	P0	24 h	Una volta	1

ATMOSFERA

Misura	Fase	Durata	Cadenza	N° punti
ATC	A0	15 gg	Trimestrale	2
	C0	15 gg	Trimestrale	2

ACQUE SOTTERRANEE

Misura	Fase	Durata	Cadenza	N° punti
POZ	A0	-	Mensile / Trimestrale	1
	C0	-	15 gg / Trimestrale	1
	P0	-	Mensile / Trimestrale	1
SOR	A0	-	Mensile / Trimestrale	5
	C0	-	15 gg / Trimestrale	5
	P0	-	Mensile / Trimestrale	5
GAL	C0	-	15 gg / Trimestrale	2
	P0	-	Mensile / Trimestrale	2

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO ESECUTIVO

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE VOLTRI - BRIGNOLE

PROLUNGAMENTO, LATO LEVANTE, DELLA "BRETELLA DI GENOVA VOLTRI" CON ALLACCIO VERSO EST ALLA LINEA SUCCURSALE DEI GIOVI IN PROSSIMITA' DI BIVIO POLCEVERA

PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Planimetria di ubicazione dei punti monitoraggio- LOTTO 2

SCALA : 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
GCE 1	0 2	E	2 2	P 6	A C 0 0 0 0	0 0 1	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	Ambrogio	Luglio 2008	Tonali	Luglio 2008	Rinaldini	Luglio 2008	ITALFERR S.p.A. Dott. Ing. Giulio Antonio Maria Ambrogio Ord. Ingegneri Roma n° 14893
B	Emissione definitiva	Ambrogio	Maggio 2009	Tonali	Maggio 2009	Rinaldini	Maggio 2009	

File :

n. Elab.
