

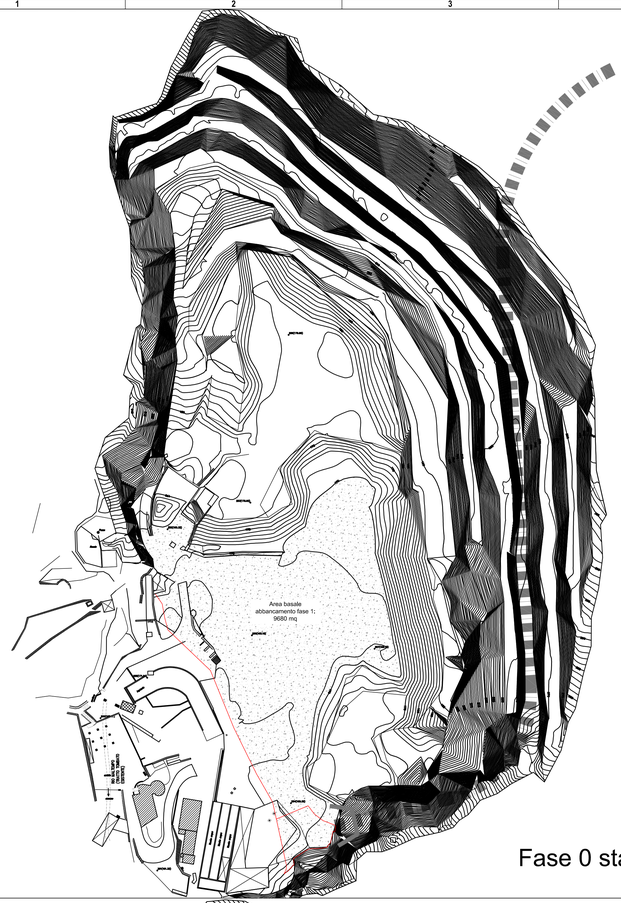



Fase 0 stato iniziale

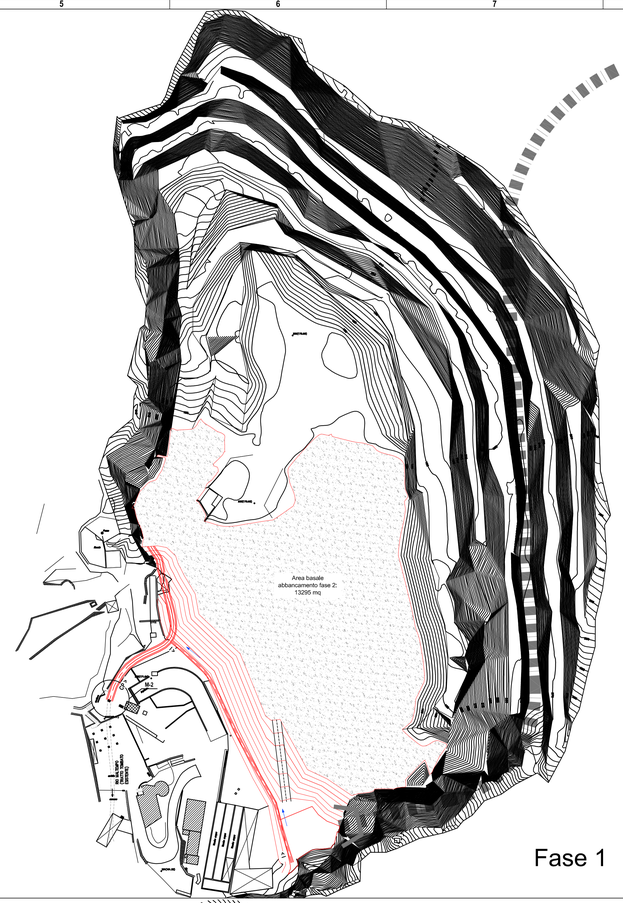

Fase 1

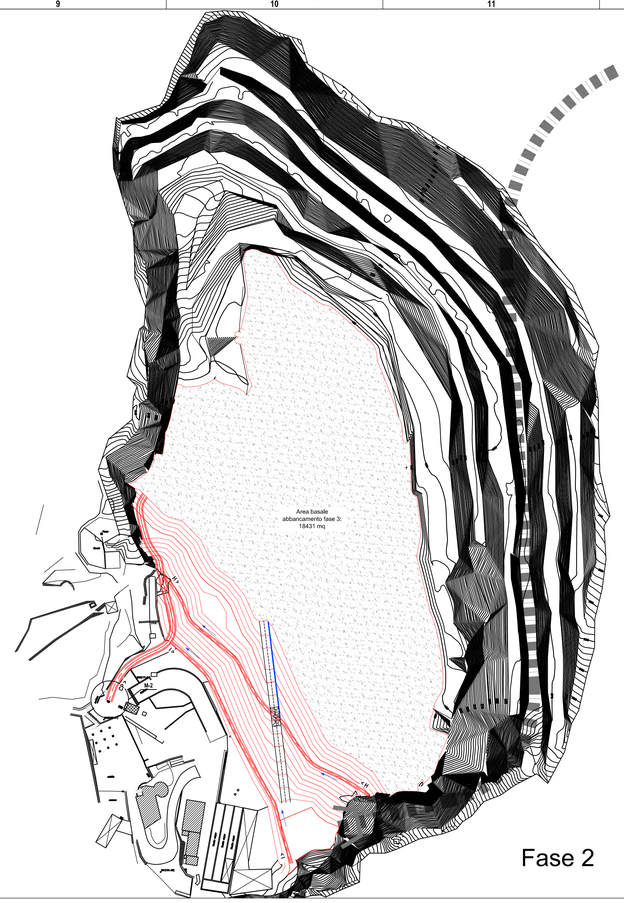

Fase 2

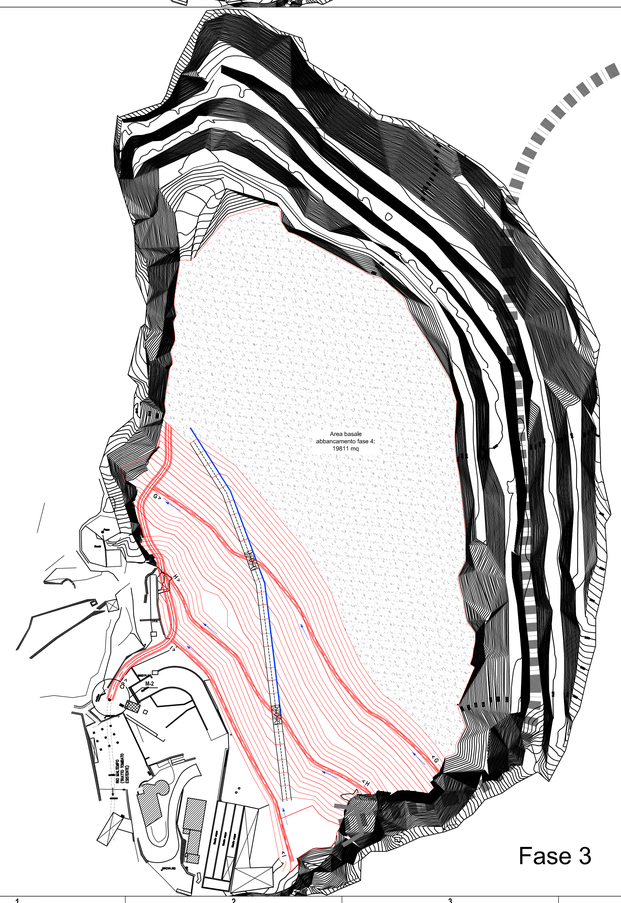

Fase 3



Fase 4: finale

Legenda fasi di abbancamento

Fase 1:
periodo di completameto **II** trimestre del 3° anno
volume complessivo allocato 85 000 mc
quota di progetto m 177 slm

Fase 2:
periodo di completamento **II** semestre del 4° anno
volume complessivo alloca 211 000 mc
quota di progetto m 184 slm

Fase 3:
periodo di completamento **II** semestre del 5° anno
volume complessivo allocato 480 000 mc
quota di progetto m 198 slm

Fase 4:
completamento abbancamento **II** trim. del 6° anno
volume complessivo allocato 1 078 000 mc
quota di progetto m 250 slm

LEGENDA ALTRI SIMBOLI

- Curve di livello in progetto
- Viabilità di cantiere
- Imbocco galleria strada minieraria
- Strada minieraria
- Cunetta principale CP (Tipologico AEPIDR-1)
- Cunette secondarie (Tipologico AEPIDR-2)
- Cunette stradali CU-ST (Tipologico AEPIDR-3)
- 219,70 Quota fondo scorrevole
- Guadi (Tipologico AEPIDR-5)
- M-1 Tombinatura piazzale di manovra (Tipologico AEPIDR-4)
- M-2 Raccordo a recapito finale (Rio Mattempo)
- A> <A Indentificativo elemento
- Direzione flusso idraulico

Nota:
I tratti di pista non muniti di cunetta di raccolta delle acque in quanto difficilmente collegabili al reticolo, sono di lunghezza tale (breve) da non presentare problemi legati al ruscellamento delle acque superficiali.

N

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

Cava Vecchie Fornaci (ex cava Buzzi)

Riqualificazione Ambientale

Planimetria delle fasi di abbancamento

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	SCALA:
Consorzio Cociv, Project Manager, Ing. Bottiglia, Data: 07/06/2012		1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO_DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	CV	P7	DP9100	001	F

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista integratore	Data	IL PROGETTISTA
EO0	Adeguamento terre e rocce da scavo	Visentin	16/03/2012	Spoglianti	20/03/2012	Pagani	23/03/2012	
F00	Istruttoria n° A30100105DPO0000004 del 14/05/2012	Visentin	04/06/2012	Spoglianti	06/06/2012	Pagani	07/06/2012	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO, Dott. Ing. Pagani Alessandro, Settore Civile e Ambientale, Sez. A, n. 19790, Data: 07/06/2012

In. Elab.	Nome File: A301105CVP7DP9100001.F00
	CUP: F81H92000000008
