

FASE 0 - STATO ATTUALE

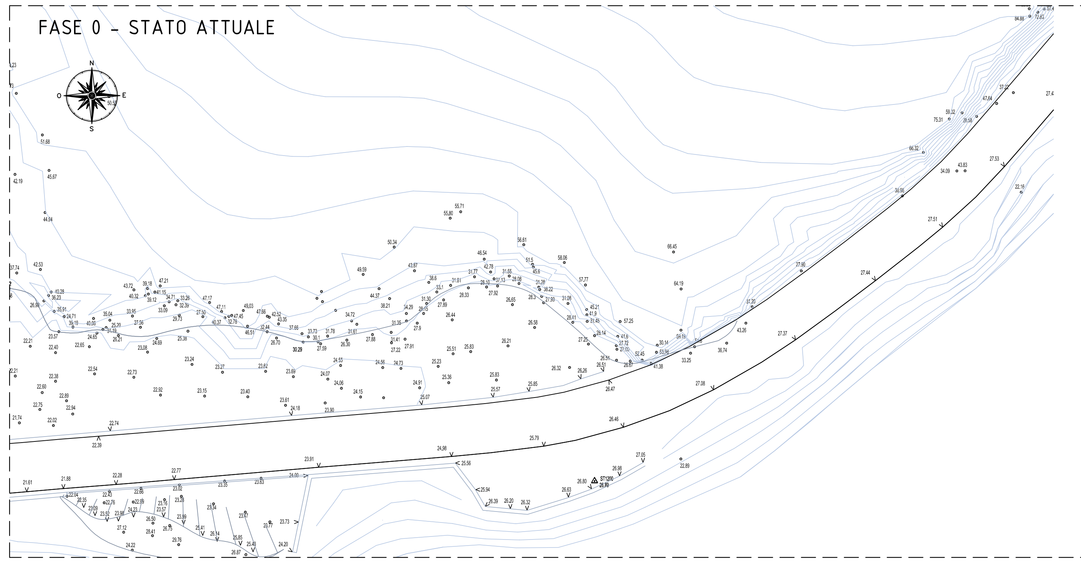

RENDERING - STATO ATTUALE

FASE 1 - SCAVI E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE

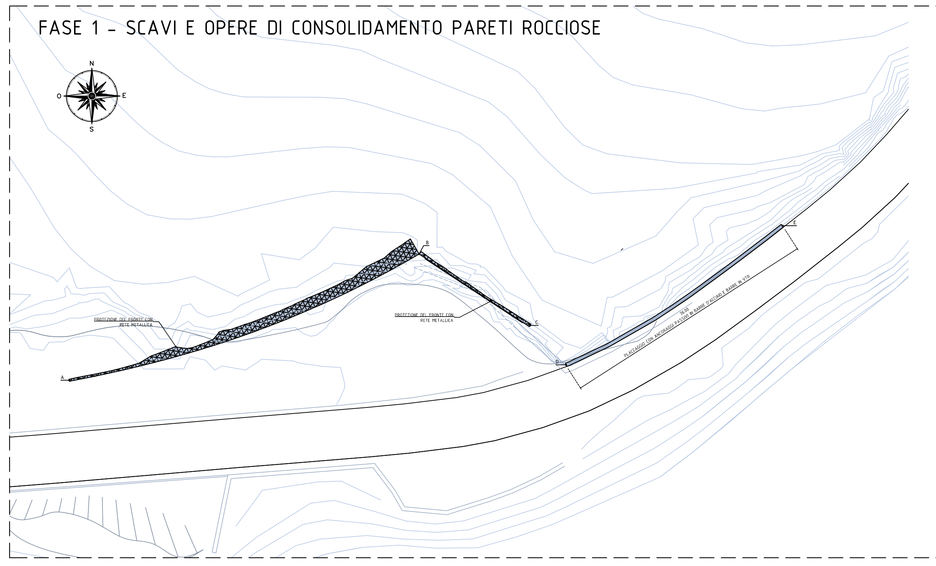


RENDERING - SCAVI


ALTEZZE DI SCAVO

DATI QUOTA SUPERFICIE			
Numero	Minima Elevazione	Massima Elevazione	Colore
1	19.899	20.497	
2	20.497	21.115	
3	21.115	21.715	
4	21.715	22.157	
5	22.157	23.180	
6	23.180	23.845	
7	23.845	24.276	
8	24.276	24.925	
9	24.925	25.483	
10	25.483	26.152	
11	26.152	26.716	
12	26.716	27.163	
13	27.163	28.092	
14	28.092	28.899	
15	28.899	29.251	
16	29.251	29.722	
17	29.722	30.442	
18	30.442	31.301	
19	31.301	32.044	
20	32.044	33.014	
21	33.014	33.859	
22	33.859	34.580	
23	34.580	35.289	
24	35.289	35.986	
25	35.986	36.163	
26	36.163	36.638	
27	36.638	37.163	
28	37.163	38.104	
29	38.104	38.752	
30	38.752	39.562	
31	39.562	40.093	
32	40.093	41.264	
33	41.264	41.913	
34	41.913	41.967	
35	41.967	42.794	
36	42.794	43.053	
37	43.053	43.587	
38	43.587	44.365	
39	44.365	45.060	
40	45.060	45.621	
41	45.621	46.197	
42	46.197	46.817	
43	46.817	47.452	
44	47.452	47.985	
45	47.985	48.413	
46	48.813	49.446	
47	49.446	50.697	
48	50.697	51.562	


FASE 2 - REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE TRATTO 1

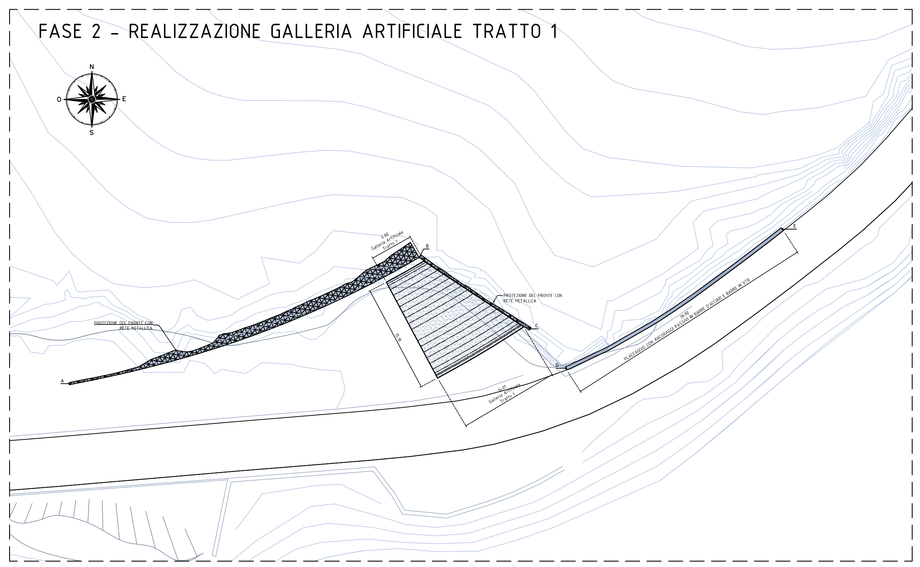

FASE 3 - REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA NATURALE DA IMBOCCO NOLI A IMBOCCO FINALE LIGURE

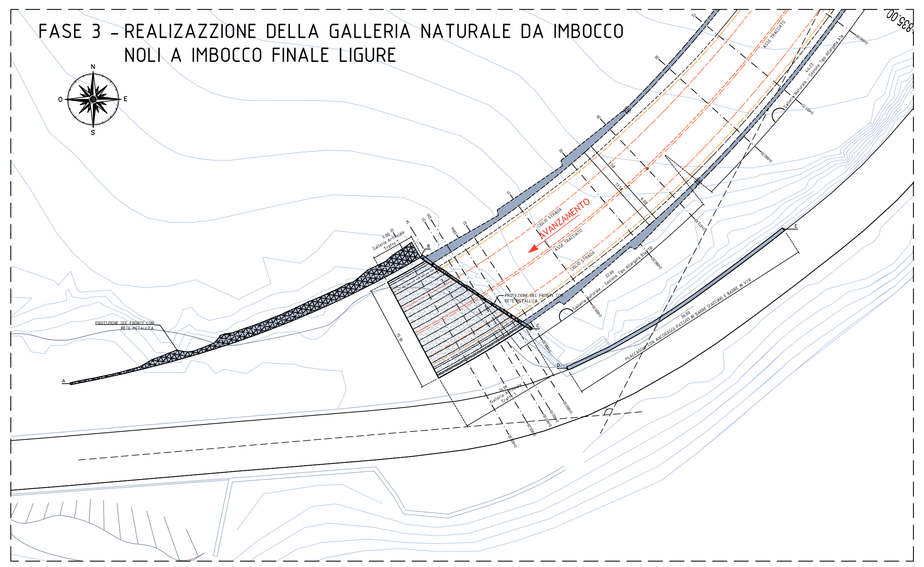

FASE 4 - REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE TRATTO 2

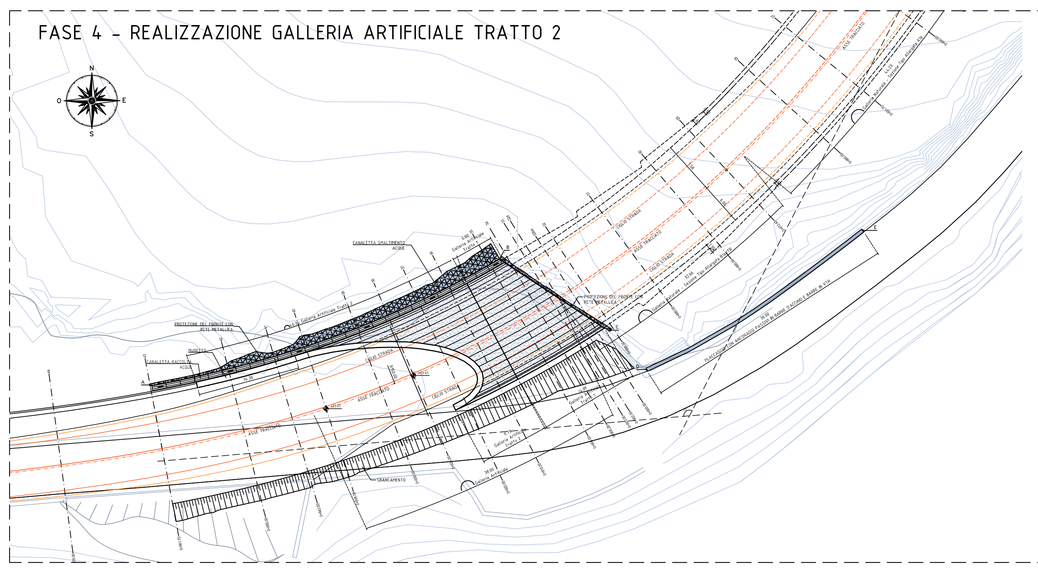

RENDERING - STATO FINALE

Note esecutive sul fronte di scavo:

Le altezze di scavo, la sistemazione finale e l'estensione degli interventi di consolidamento del fronte di imbocco potranno subire delle modifiche e ottimizzazioni in funzione di un rilievo di maggior dettaglio da eseguirsi in fase di progettazione esecutiva.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
REV.01	15/11/11	Per Emissione	VP	FB	SB

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMI REGIONALI, PORTI, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
Settore Progetti Infrastrutture Viabilità Porti e Logistica

Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

InfrastruttureLiguria
GRUPPO FILSE

CONVENZIONE DEL 14 SETTEMBRE 2009 TRA REGIONE LIGURIA E INFRASTRUTTURE LIGURIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI STUDI E PROGETTAZIONI INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE

ATTIVITA'
VARIANTE DI TRACCIATO ALLA S.S. 1 AURELIA - CAPO NOLI

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO
GALLERIA CAPO NOLI
SEZIONI TIPO A1
CARPENTERIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TIMBRO E FIRMA
sab ingegneri associati
Via Pievaiola, 77 - 06128 - Perugia
Tel. +39 075 50 05 49
Fax +39 075 50 05 49
Internet: www.sabsrl.eu
E-Mail: info@sabsrl.it

PROGETTISTI
Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Puja

TAVOLA N.
S31

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	SCALA	FORMATO	N.DOCUMENTO				REVISIONE
VP	FB	SB	15/11/11	Varie	A0	02A	DEF	STR	T031	01

SPAZIO RISERVATO ALLA CODIFICA ANAS

CODICE PROGETTO				CODICE ELABORATO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.			
DPGE08	D	11	01	T00GN03OSTSE01	*Ing. Nicola Dinnella*
