
Progettazione Definitiva Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in prossimità della Galleria Scolmatrice del torrente S.Siro in Comune di Santa Margherita Ligure

ID	Task Name	Duration
1	**Progetto Esecutivo**	**150 days**
2	Espletamento gara Appalto Integrato Progetto Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori	60 days
3	Indagini preliminari e Redazione Progetto Esecutivo	90 days
4	Consegna Progetto Esecutivo	0 days
5	**Esecuzione degli interventi di stabilizzazione del versante**	**280 days**
6	Preparazione area	7 days
7	**Fase 0**	**20 days**
8	Realizzazione della viabilità provvisoria a valle del tratto "Viabilità 2" esistente	10 days
9	Realizzazione nuova rampa provvisoria di connessione tra la "Viabilità 1" e la viabilità	5 days
10	Realizzazione area di cantiere	5 days
11	**Fase 1**	**80 days**
12	Realizzazione parziale della paratia di micropali (tratti non interferenti con la viabilità)	60 days
13	Realizzazione primo livello terre rinforzate (tratti non interferenti con la viabilità)	50 days
14	**Fase 2**	**50 days**
15	Realizzazione secondo livello terre rinforzate	50 days
16	Realizzazione gabbionate	12 days
17	**Fase 3**	**43 days**
18	Rimozione rampa provvisoria realizzata in fase 0	3 days
19	Realizzazione nuova "Viabilità 2" e parziale completamento viabilità di progetto	7 days
20	Completamento primo livello terra rinforzata e completamento parziale paratia di micropali	40 days
21	**Fase 4**	**10 days**
22	Completamento viabilità di progetto	5 days
23	Rimozione viabilità provvisoria	5 days
24	Rimozione area di cantiere Fase 0 e Fase 3	5 days
25	**Fase 5**	**70 days**
26	Completamento paratia di micropali zona imbocco galleria	25 days
27	Realizzazione opere di drenaggio superficiale	15 days
28	Realizzazione palizzate in legno	50 days
29	Inerbimento	15 days
30	Installazione strumentazione di monitoraggio	25 days

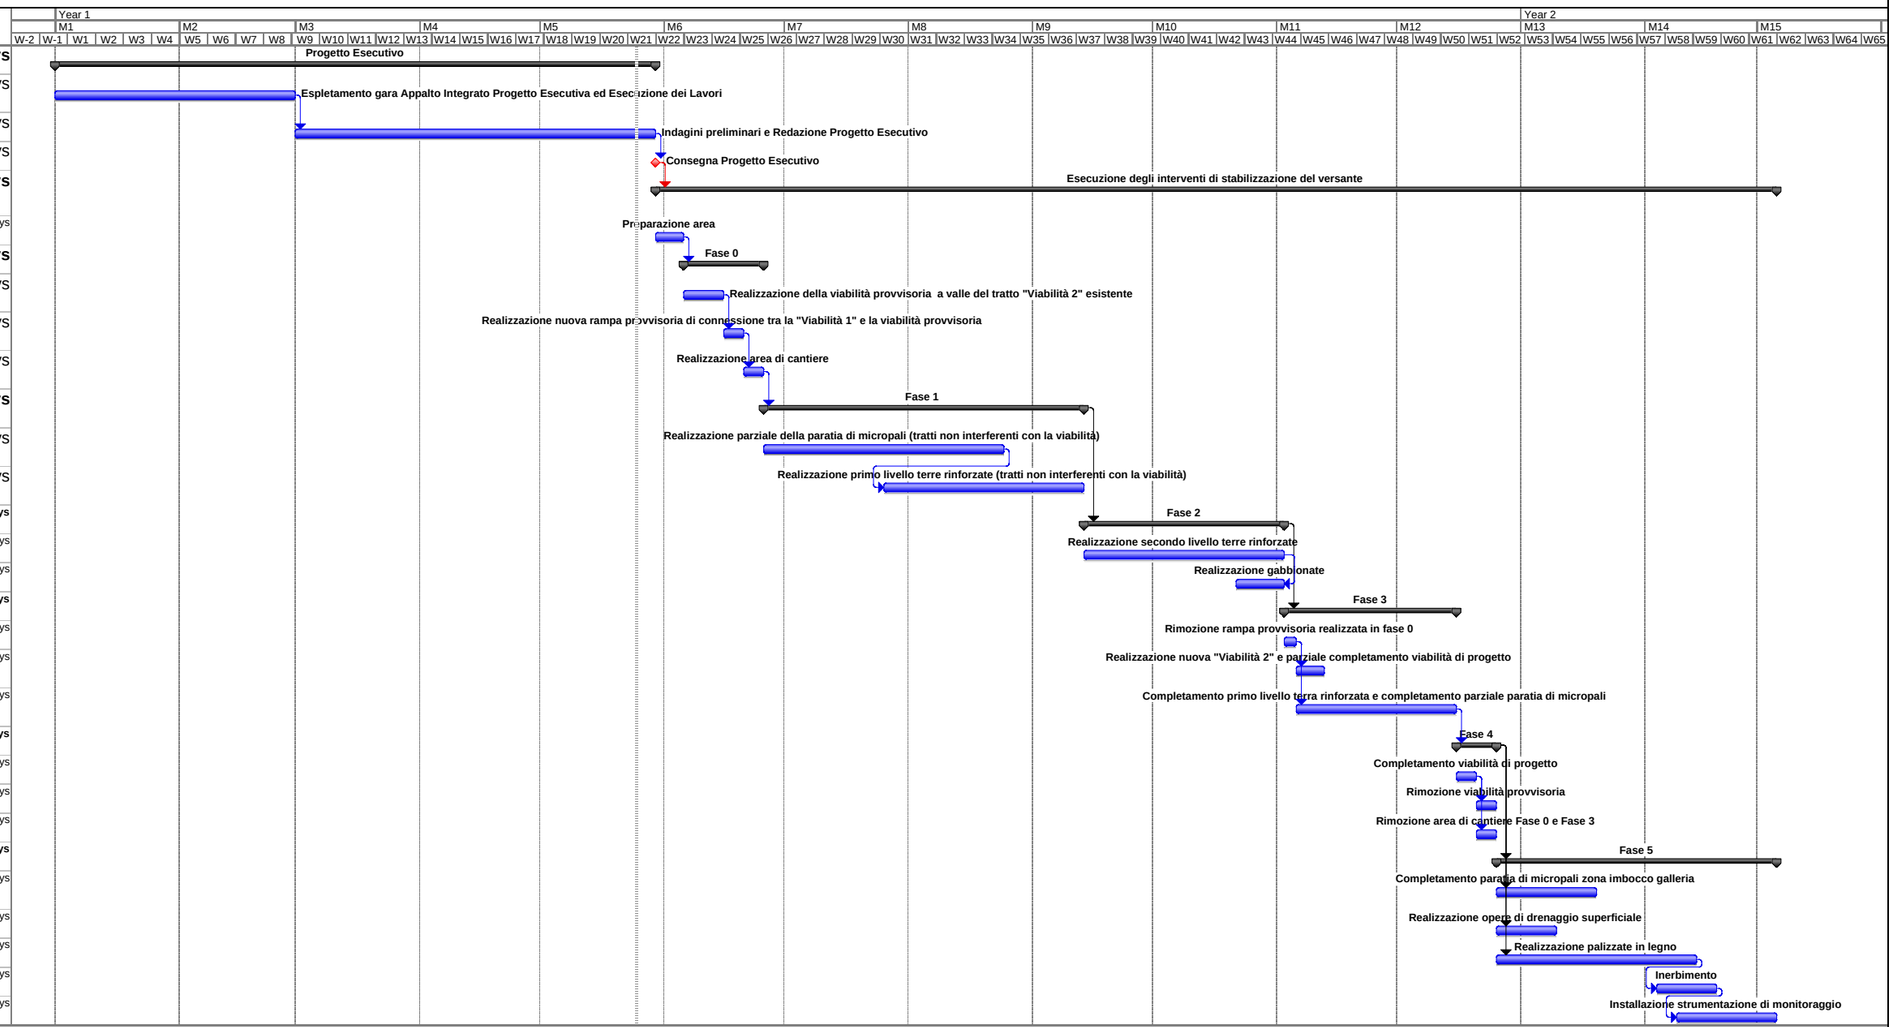

Task Progress Summary External Tasks Deadline
Split Milestone Project Summary External Milestone
