
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – DIAGRAMMA DI GANTT

Cantieri del Mediterraneo s.r.l. – Capo Verde, Sanremo | Totale 250 giorni

CRONOPROGRAMMA SEQUENZIALE – CANTIERI DEL MEDITERRANEO

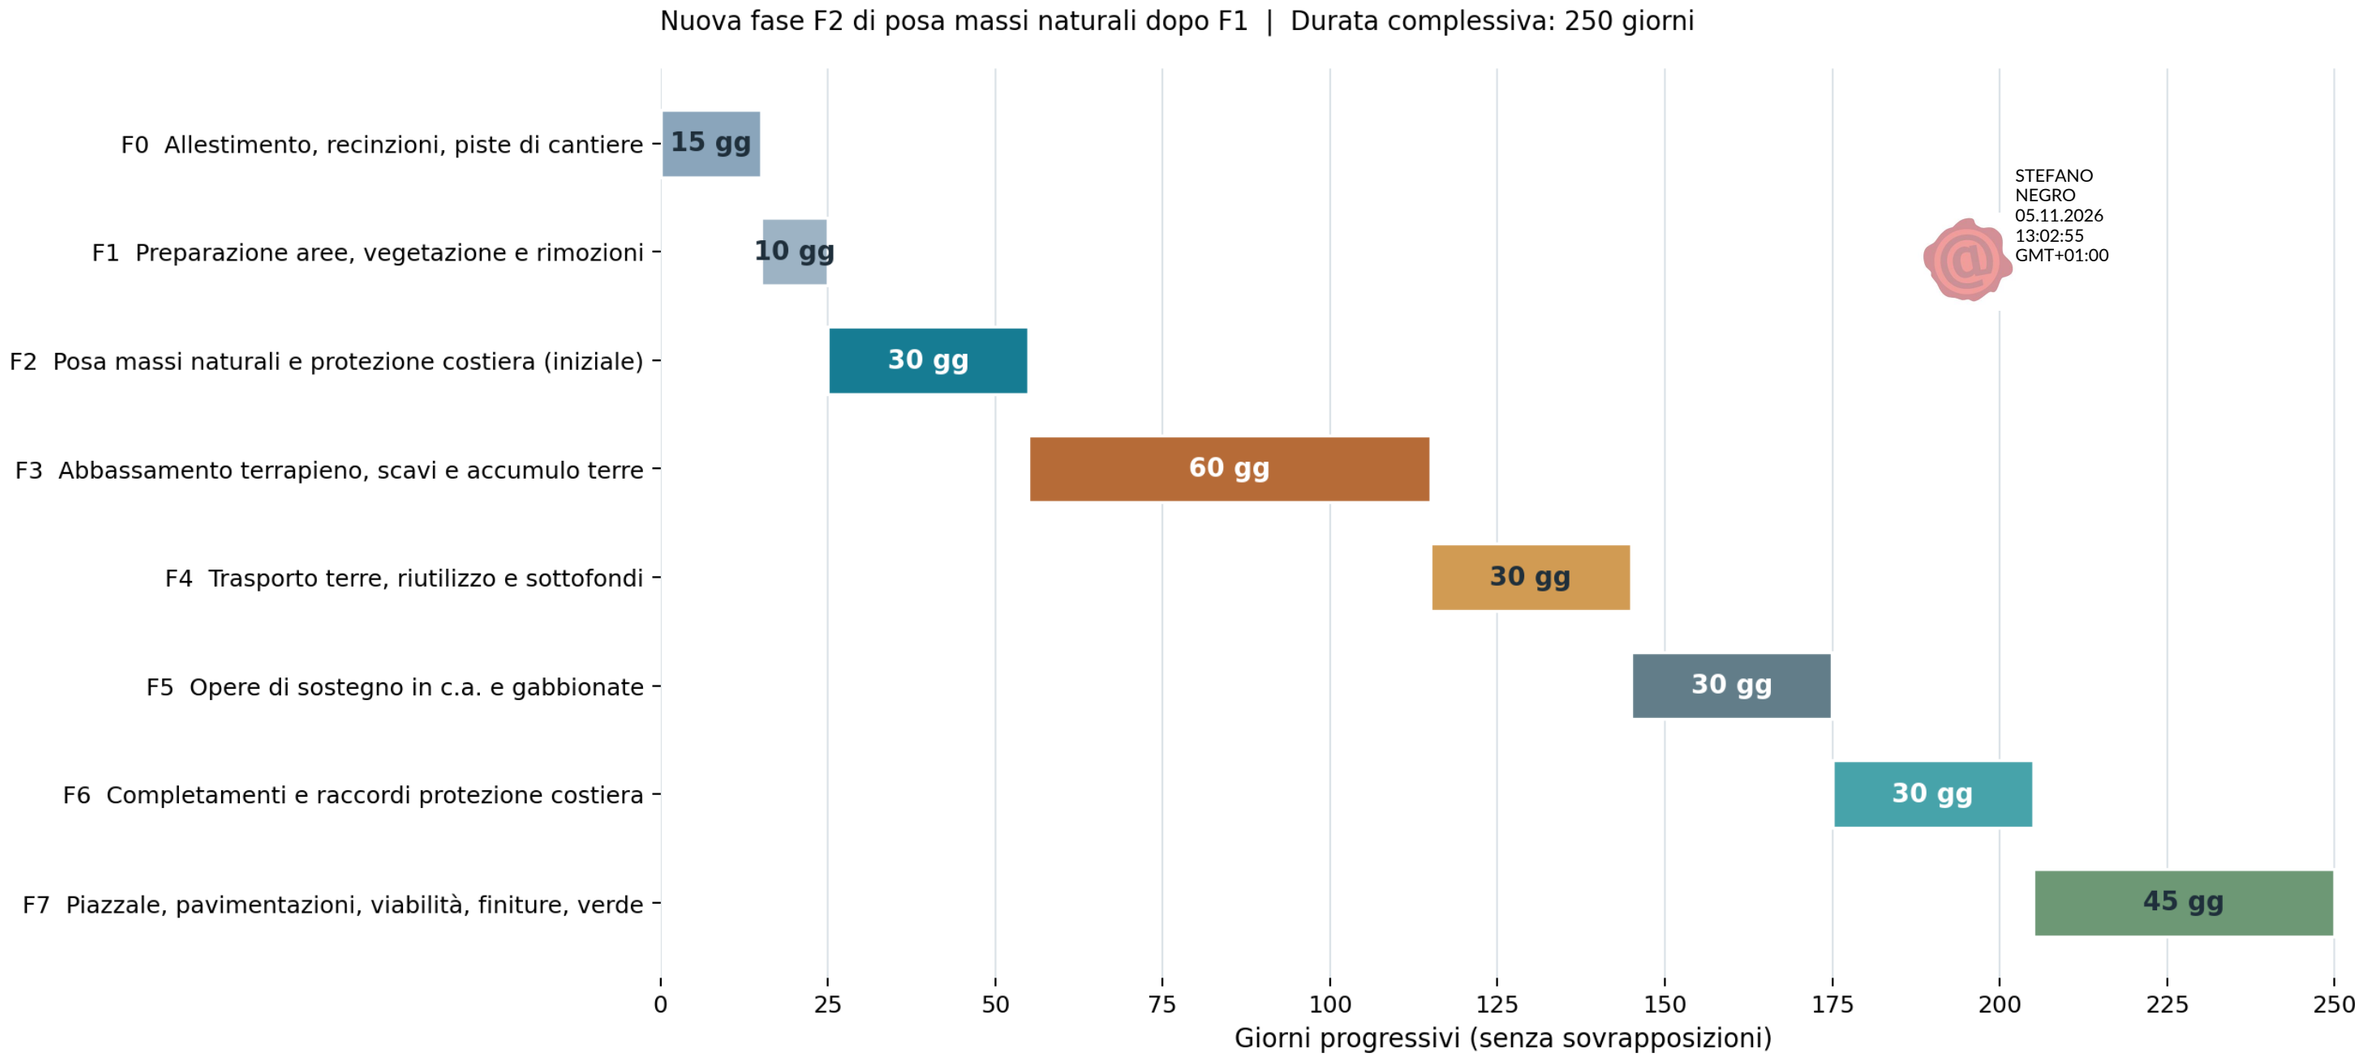

STEFANO
NEGRO
05.11.2026
13:02:55
GMT+01:00

F2 = posa iniziale; F6 = completamenti e raccordi costieri (distinzione organizzativa proposta).

Fase	Lavorazione	Durata	Periodo
F0	Allestimento, recinzioni, piste di cantiere	15 gg	1–15
F1	Preparazione aree, vegetazione e rimozioni	10 gg	16–25
F2	Posa massi naturali e protezione costiera (iniziale)	30 gg	26–55
F3	Abbassamento terrapieno, scavi e accumulo terre	60 gg	56–115
F4	Trasporto terre, riutilizzo e sottofondi	30 gg	116–145
F5	Opere di sostegno in c.a. e gabbionate	30 gg	146–175
F6	Completamenti e raccordi protezione costiera	30 gg	176–205
F7	Piazzale, pavimentazioni, viabilità, finiture, verde	45 gg	206–250
