Politecnica | Hopkins Architects | Dott F Gemmi

# Nuovo Ospedale Della Spezia
# Progetto Preliminare

## Cronoprogramma
## Doc. n: 01A\PRE\GNR\R013



15 Aprile 2011

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria
GRUPPO FILSE


Convenzione Attuativa Tra
Asl5 E Infrastrutture Liguria S.R.L.
Del 9 Settembre 2009

# NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA

# CRONOPROGRAMMA

| Rev | Data | Sez | Pag | Redatto | Controllato | Approvato | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 28/02/2011 | | 2 | POLI | MI | - | Per Commenti |
| 1 | 05/04/2011 | | 2 | POLI | MI | SB | Per Emissione |
| 2 | 15/04/2011 | | 3 | POLI | MI | SB | Revisione |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **OSPEDALE FELETTINO - LOTTI AB** | **1480 g** |
| 2 | **CONSEGNA LAVORI** | **1 g** |
| 3 | **DEMOLIZIONE OSPEDALE ESISTENTE** | **240 g** |
| 4 | Allestimento cantiere | 20 g |
| 5 | Dismissione e smontaggio impianti | 30 g |
| 6 | Demolizione edifici secondari | 20 g |
| 7 | Allestimento cantiere bonifica amianto e piano di smaltimento | 60 g |
| 8 | Montaggio gru e piani di carico | 7 g |
| 9 | Svuotamento edificio | 3 mes |
| 10 | Bonifiche | 4 mes |
| 11 | Caratterizzazione e smaltimento materiali a discarica | 60 g |
| 12 | demolizione edificio principale | 4 mes |
| 13 | **OSPEDALE** | **1240 g** |
| 14 | **ALLESTIMENTO CANTIERE** | **20 g** |
| 15 | Adeguamenti logistica di cantiere | 20 g |
| 16 | Modifiche ed integrazioni recinzioni di cantiere | 15 g |
| 17 | **OPERE EDILI** | **1100 g** |
| 18 | **FONDAZIONI SPECIALI** | **160 g** |
| 19 | Scavi preliminari e piste di cantiere | 45 g |
| 20 | Pali Diaframmi Tiranti | 160 g |
| 21 | **SCAVI** | **90 g** |
| 22 | Scavi e splateamenti | 90 g |
| 23 | **FONDAZIONI e CLS** | **440 g** |
| 24 | Gettata magrone | 30 g |
| 25 | Casserature e Strutture in Cemento Armato | 14 mes |
| 26 | Basamenti e massetti | 7 mes |
| 27 | **MURATURE** | **780 g** |
| 28 | Tramezzature in cartongesso | 270 g |
| 29 | Tramezzature in muratura, intonaci e finitura | 240 g |
| 30 | Assistenza muraria per imp. Elettrici e Meccanici | 600 g |

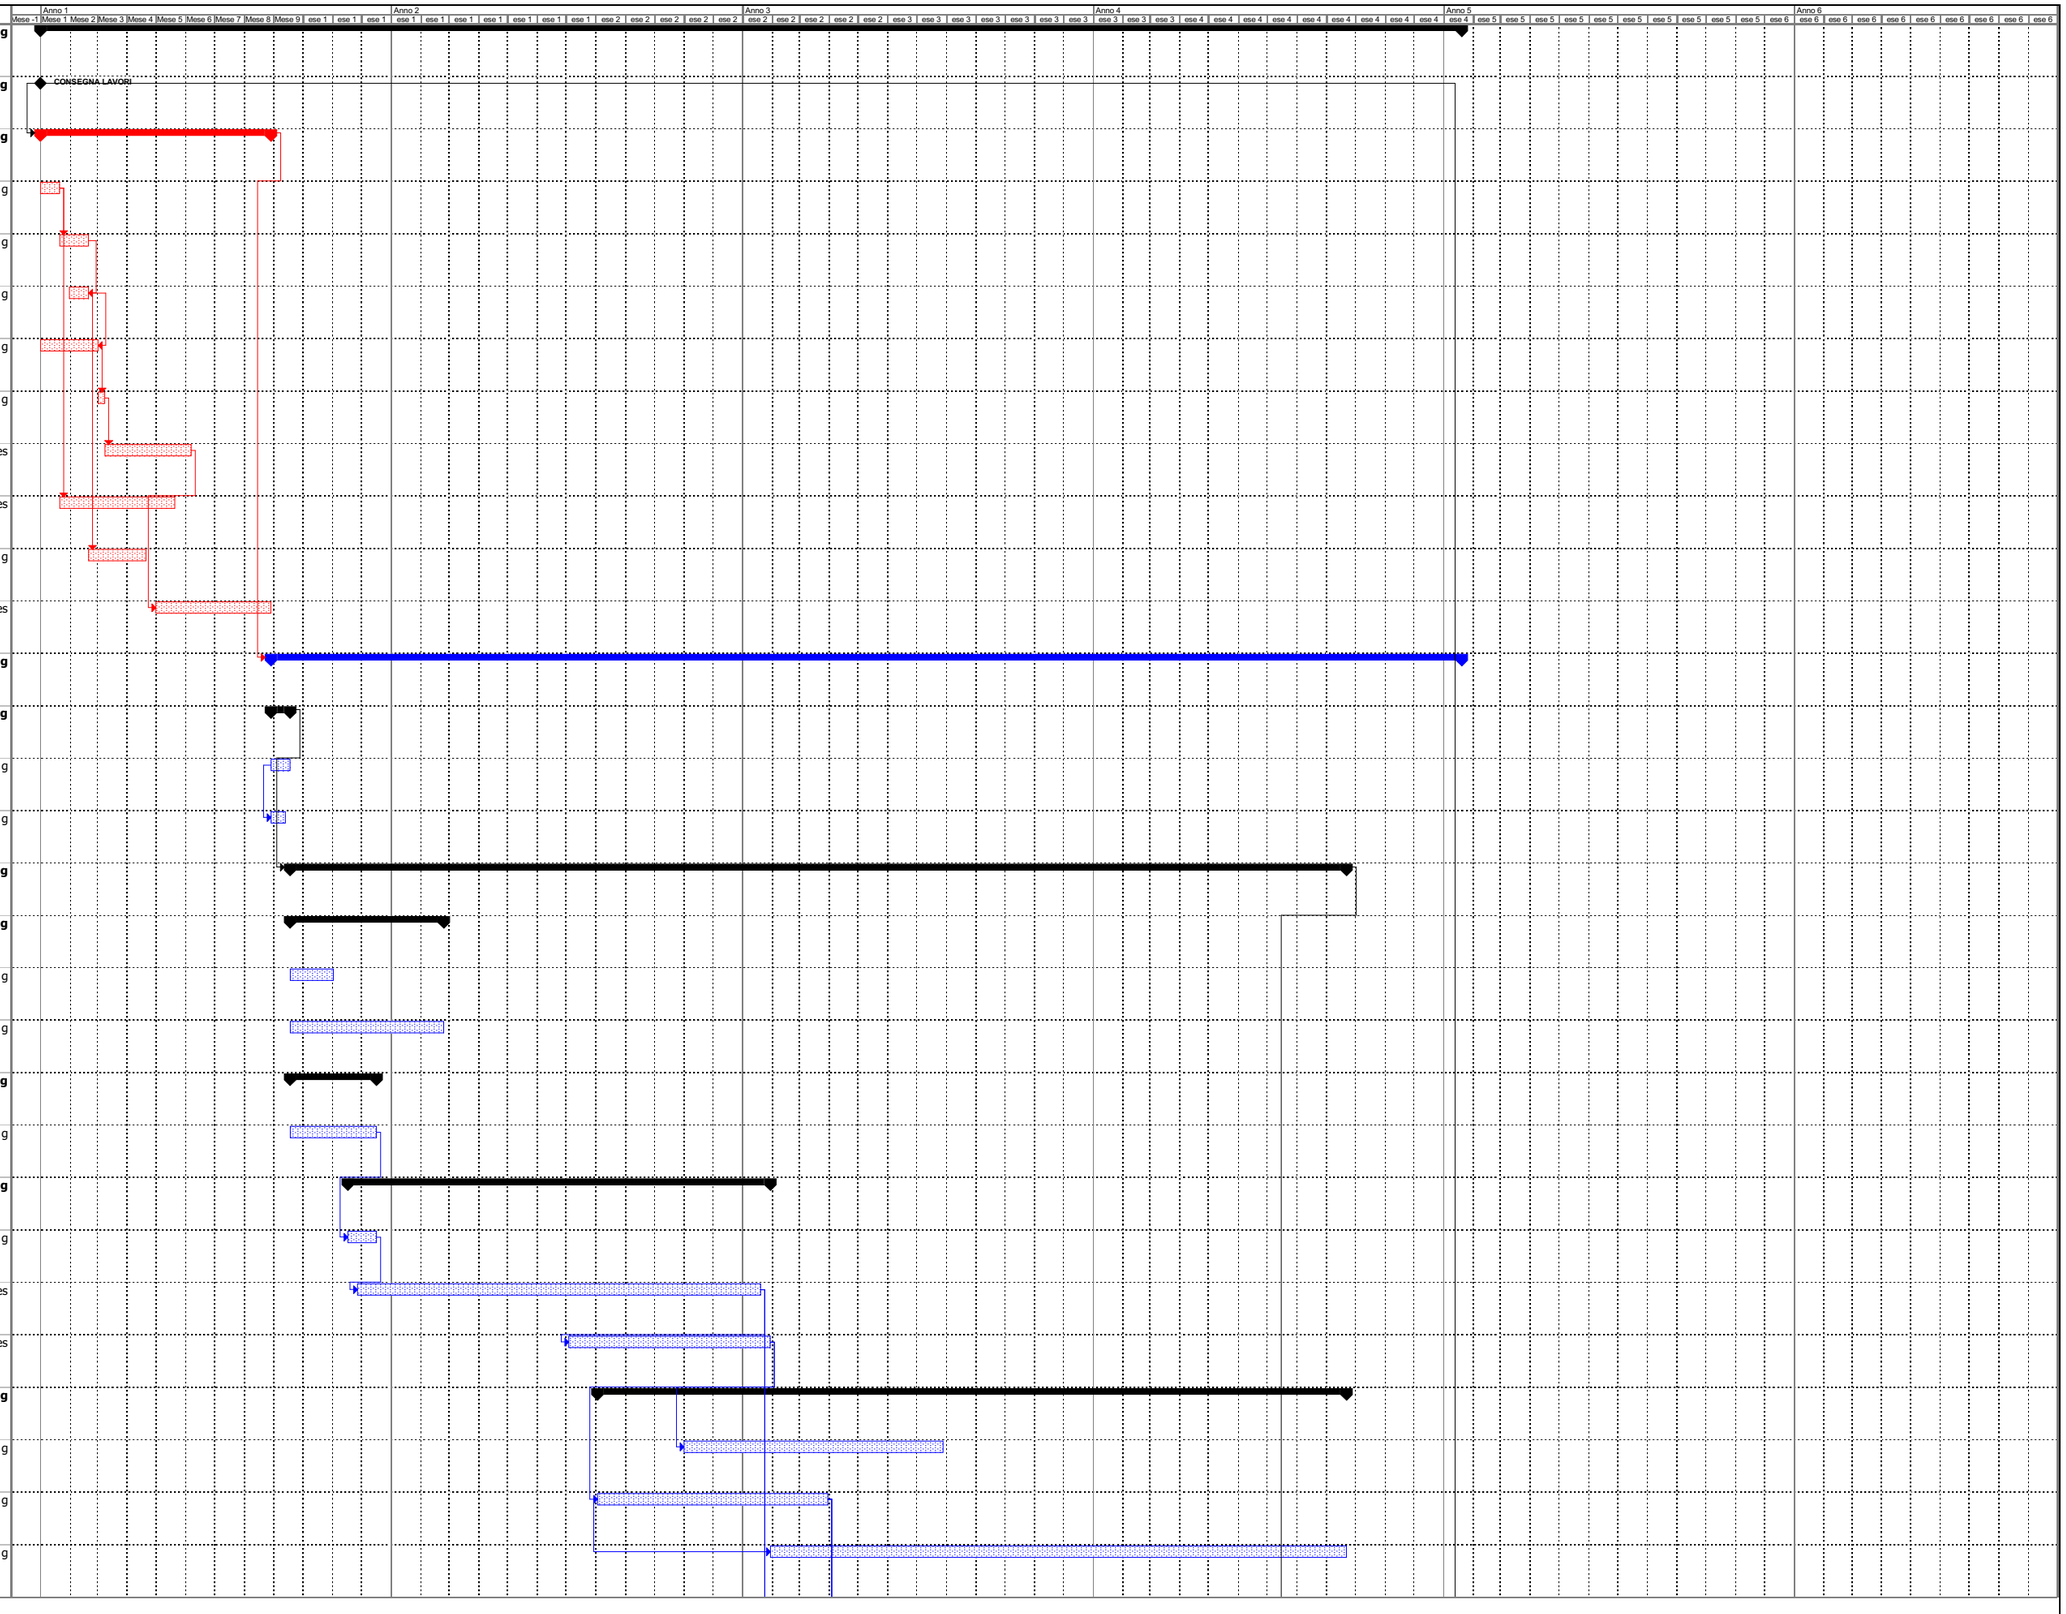


Progetto: crono felettino lotti AB r
Data: ven 15/04/11

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza


| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 31 | **FINITURE INTERNE** | **540 g** |
| 32 | Piastrellature e rivestimenti in pvc | 270 g |
| 33 | Pavimentazioni | 270 g |
| 34 | Fornitura e posa in opera infissi | 270 g |
| 35 | Controsoffitti | 270 g |
| 36 | Imbiancatura locali | 270 g |
| 37 | **IMPIANTI MECCANICI** | **640 g** |
| 38 | Adduzione da linee principali | 180 g |
| 39 | Canalizzazioni e Coibentazioni | 500 g |
| 40 | UTA | 600 g |
| 41 | Impianti idrico sanitari | 300 g |
| 42 | Apparecchiature Regolazione | 365 g |
| 43 | Centrali tecnologiche | 550 g |
| 44 | **IMPIANTI ELETTRICI** | **680 g** |
| 45 | Posa Cavi | 400 g |
| 46 | Apparecchiature | 480 g |
| 47 | Quadri e sottoquadri | 12 mes |
| 48 | Linee illuminazione interne e esterne | 680 g |
| 49 | **PARCHEGGI E VIABILITA' ESTERNA** | **180 g** |
| 50 | **SCAVI** | **30 g** |
| 51 | Demolizioni edifici | 15 g |
| 52 | Scavi e splateamenti | 30 g |
| 53 | **FONDAZIONI e CLS** | **120 g** |
| 54 | Gettata magrone | 30 g |
| 55 | Muri di sostegno e opere in c.a. | 120 g |
| 56 | **PAVIMENTAZIONI E FINITURE ESTERNE** | **100 g** |
| 57 | Pavimentazioni | 100 g |
| 58 | Reti Fongarie | 90 g |
| 59 | Opere a Verde | 60 g |
| 60 | **FINE LAVORI** | **1 g** |

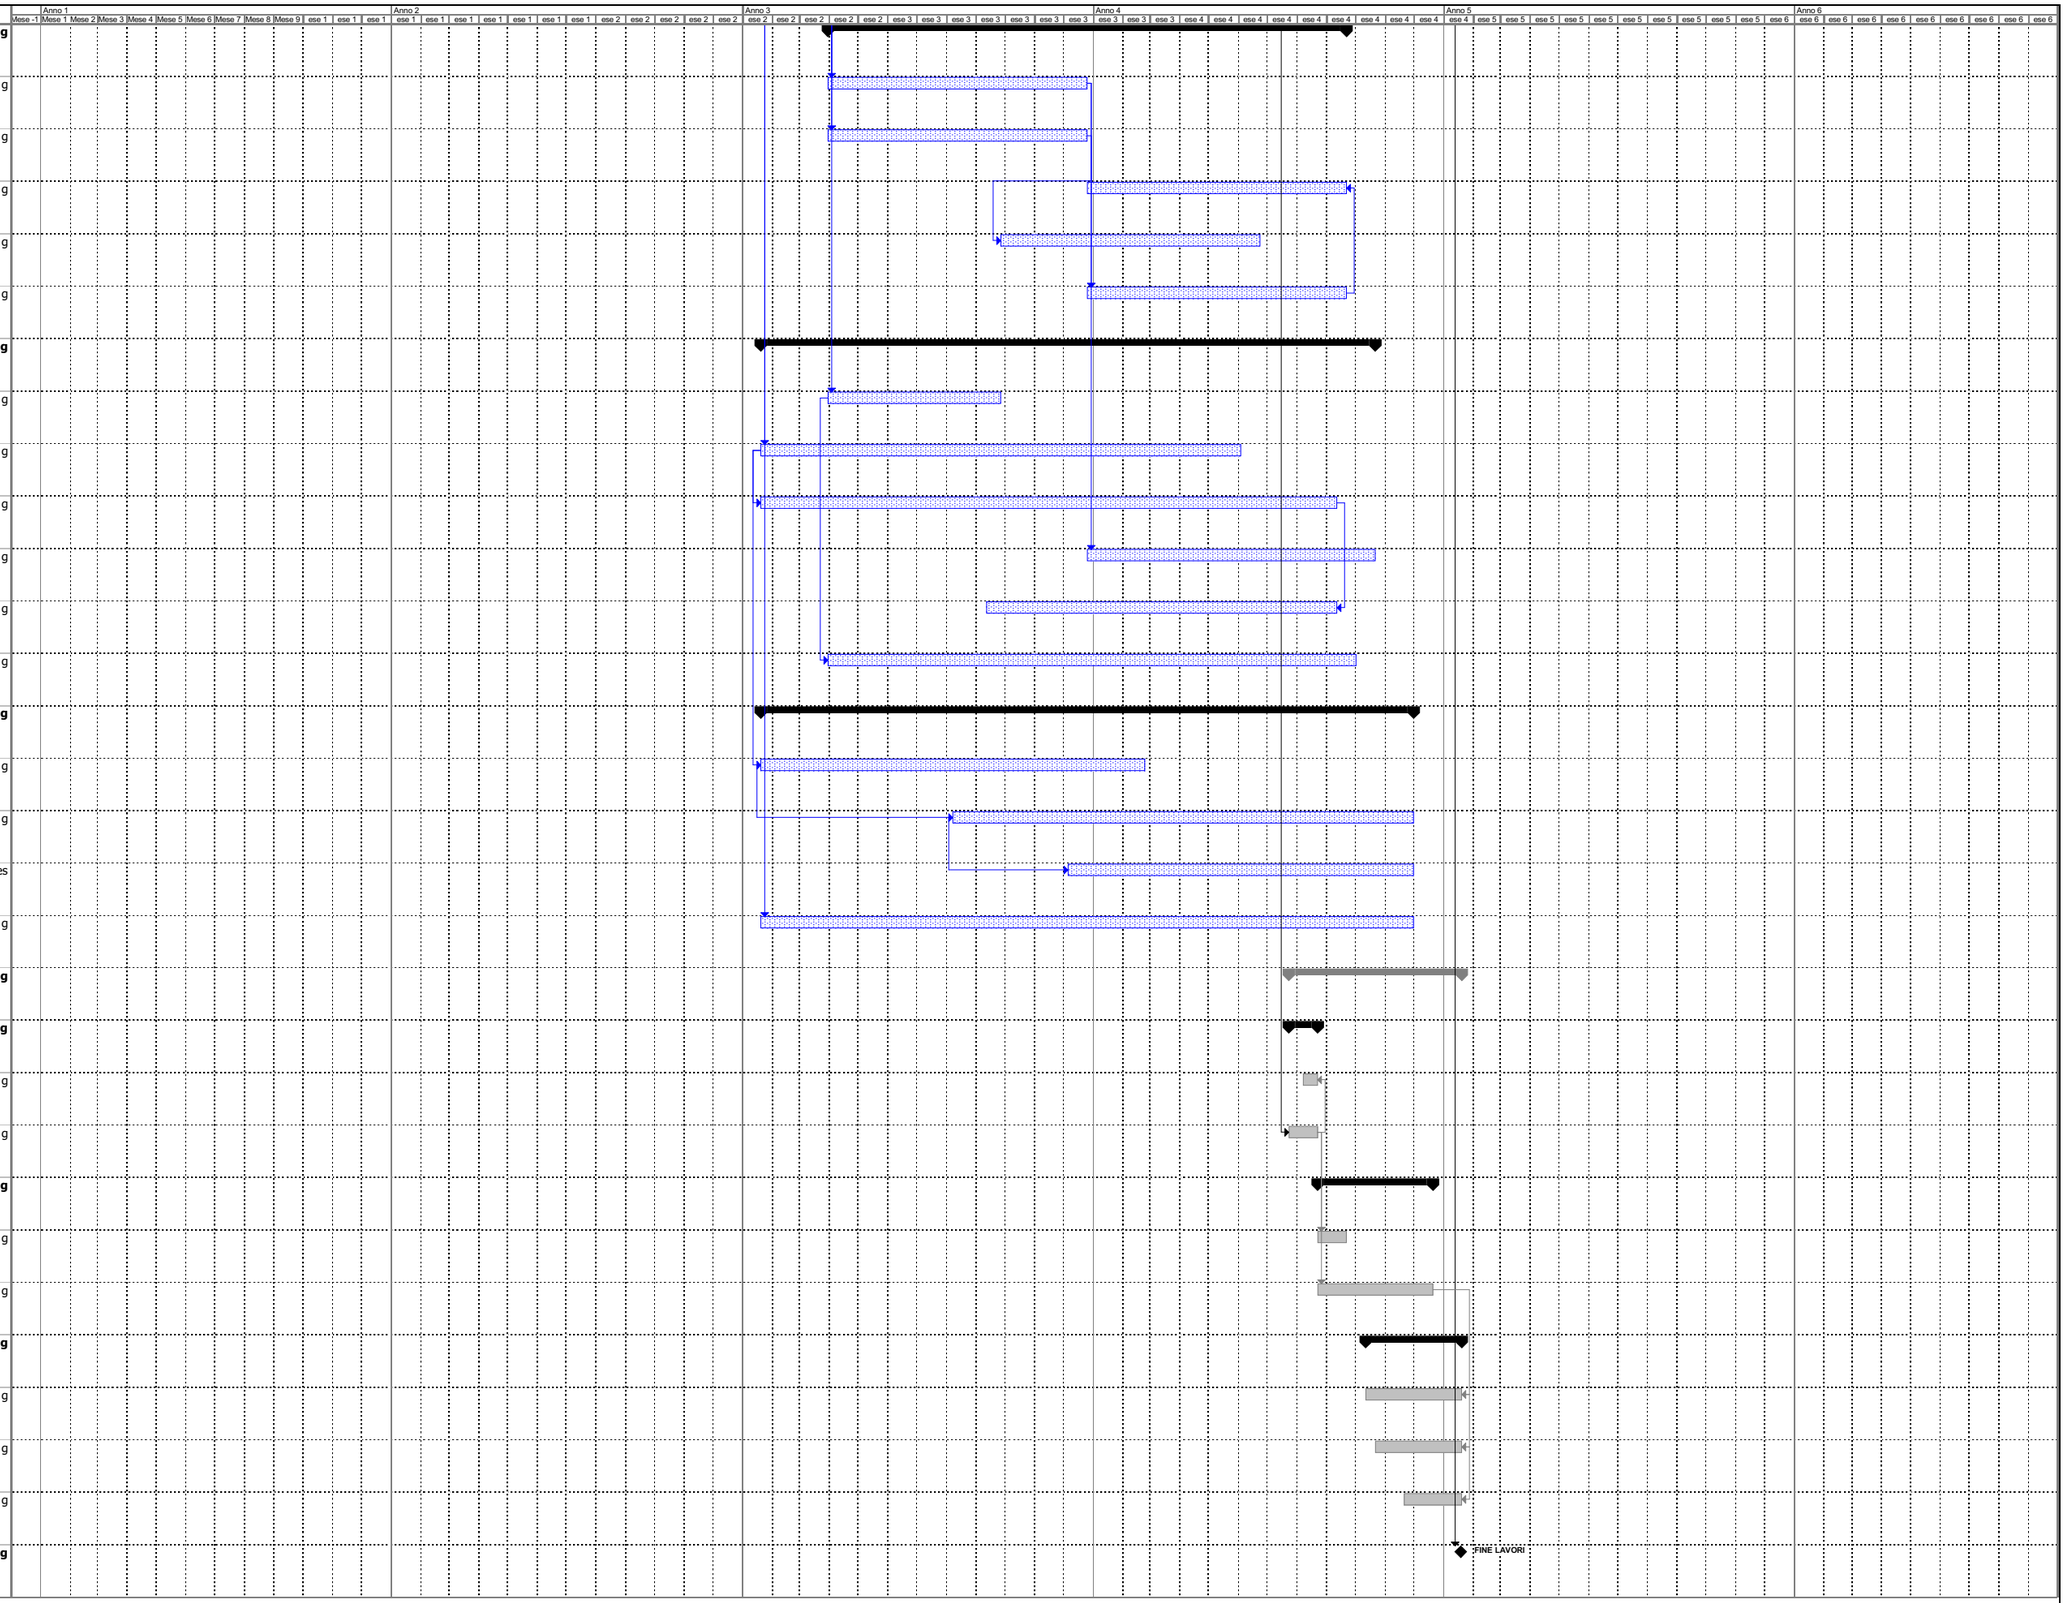


Progetto: crono felettino lotti AB r
Data: ven 15/04/11

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza

| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **OSPEDALE FELETTINO** | **285 g** |
| 2 | **RADIOTERAPIA - LOTTO C** | **285 g** |
| 3 | **CONSEGNA LAVORI** | **1 g** |
| 4 | **ALLESTIMENTO CANTIERE** | **20 g** |
| 5 | Transenne, recinzioni, servizi igienici, ponteggi. | 15 g |
| 6 | Barriere acustiche, barriere polveri. | 20 g |
| 7 | **OPERE EDILI** | **185 g** |
| 8 | **DEMOLIZIONI** | **30 g** |
| 9 | Scavi e splateamenti | 30 g |
| 10 | **FONDAZIONI e CLS** | **145 g** |
| 11 | Gettata magrone | 15 g |
| 12 | Casserature e Strutture in Cemento Armato | 130 g |
| 13 | Basamenti e massetti | 60 g |
| 14 | **MURATURE** | **50 g** |
| 15 | Tramezzature in cartongesso | 50 g |
| 16 | Tramezzature in muratura, intonaci e finitura | 30 g |
| 17 | Assistenza muraria per imp. Elettrici e Meccanici | 15 g |
| 18 | **Finiture interne** | **135 g** |
| 19 | Piastrellature e rivestimenti in pvc | 60 g |
| 20 | Pavimentazioni in pvc | 30 g |
| 21 | Fornitura e posa in opera infissi | 45 g |
| 22 | Imbiancatura locali | 30 g |
| 23 | **IMPIANTI MECCANICI** | **215 g** |
| 24 | Adduzione da linee principali | 60 g |
| 25 | Canalizzazioni e Coibentazioni | 90 g |
| 26 | Allacciamento UTA | 30 g |
| 27 | Allacciamento Gruppo Frigorifero e Acceleratore | 30 g |
| 28 | Apparecchiature Regolazione | 40 g |
| 29 | **IMPIANTI ELETTRICI** | **215 g** |
| 30 | Posa Cavi | 90 g |
| 31 | Apparecchiature | 60 g |
| 32 | Quadri e sottoquadri | 60 g |
| 33 | Linee illuminazione interne e esterne | 70 g |
| 34 | **FINE LAVORI** | **1 g** |

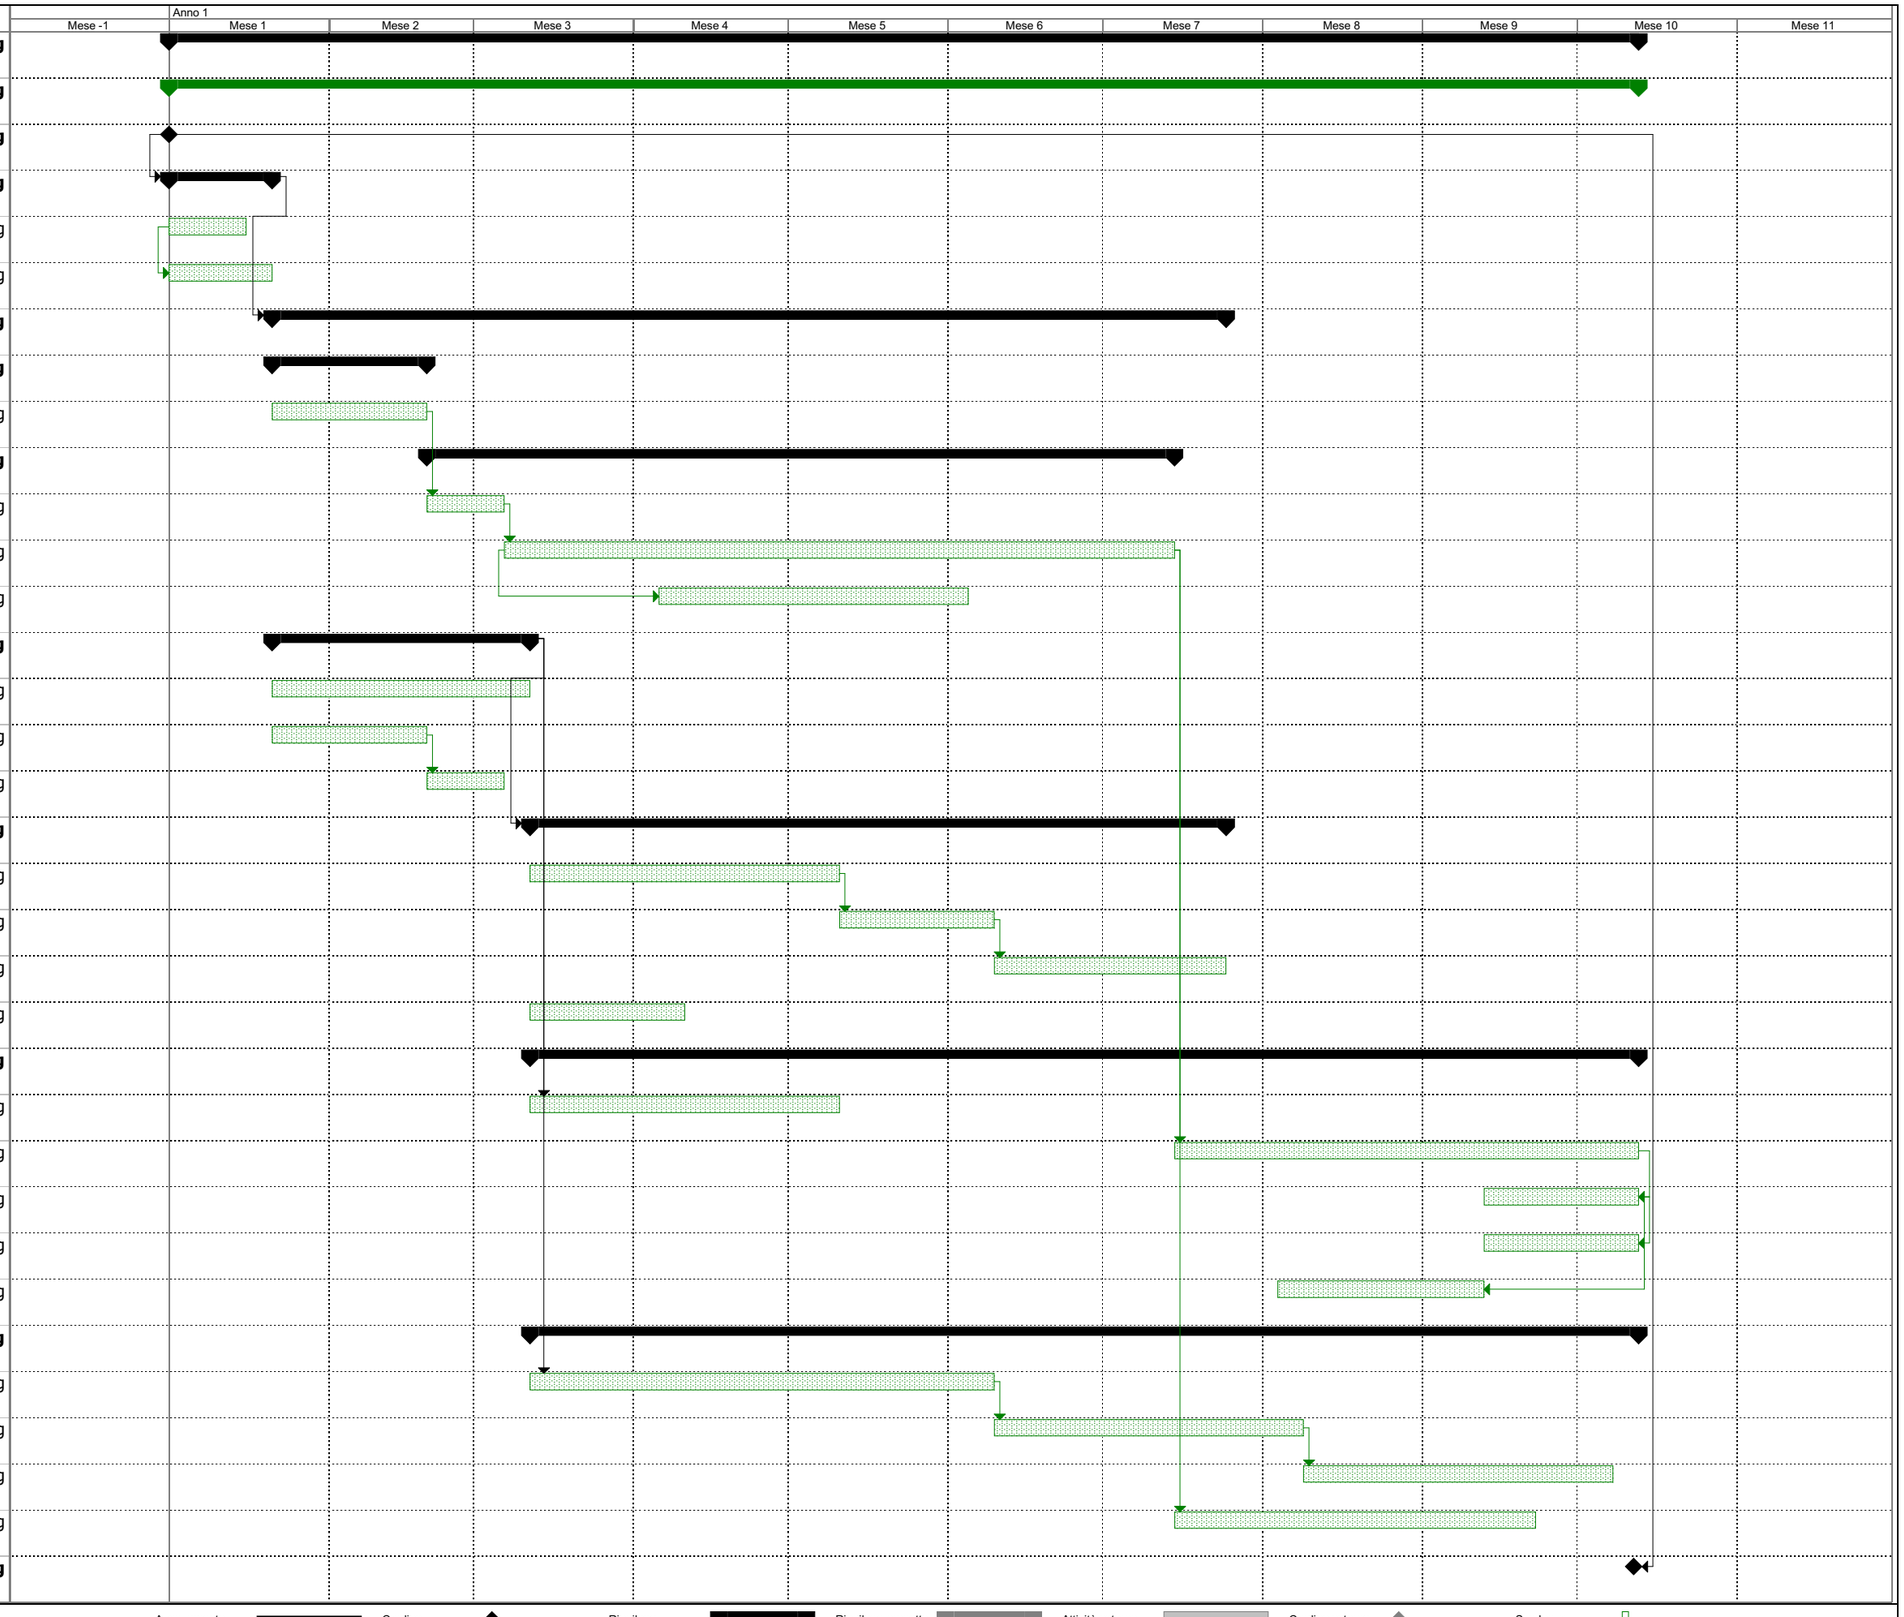


Progetto: crono felettino lotto C re
Data: ven 15/04/11

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza
