Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

RTP:

MANDATARIA

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE

MANDANTI

ENARCH S.r.l.
Dott. Ing. Paolo RUGGIERI
Dott. Arch. Grazia PRASSA

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Silvia MATARRESE

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE


EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato		Codice	Revisione	Data
31		19037-DE39-0_CRO	0	MAR.2020
Scala	-			

COMMITTENTE:	Comune di Genova
R.U.P.:	Dott. Ing. Stefano PINASCO
	Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI	SETTIMANE
Accantieramento	1
Gestione sottoservizi e fognatura nera via Vellino superiore	4
Gestione sottoservizi, fognatura nera e sifone presso sbocco Bisagno	4
TRATTO 10 - sbocco T. Bisagno	
Opere speciali	2
Travi cordolo	2
Demolizioni e scavi	1
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	2
Placcaggi muri laterali	2
TRATTO 9 - Da ponte arco via Piacenza a sbocco	
Opere speciali	2
Travi cordolo	2
Demolizioni e scavi	1
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	2
Placcaggi muri laterali	2
TRATTO 8 - Da sez. 60 a sez. 64	
Opere speciali	5
Travi cordolo	2
Demolizioni e scavi	2
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	3
Placcaggi muri laterali	3
TRATTO 7 - Ponte ad arco via Bobbio	
Opere speciali	2
Travi cordolo	2
Demolizioni e scavi	1
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	2
Placcaggi muri laterali	2
TRATTO 6 - Da valle sez. 51 a sezione circa 59	
Opere speciali	7
Travi cordolo	4
Demolizioni e scavi	4
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	5
Placcaggi muri laterali	4
TRATTO 5 - Sotto edificio a sbalzo	
Opere speciali	8
Travi cordolo	4
Demolizioni e scavi	4
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	5
Placcaggi muri laterali	4
TRATTO 4 - Da sez. 39 a edificio a sbalzo	
Opere speciali	8
Travi cordolo	4
Demolizioni e scavi	4
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	5
Placcaggi muri laterali	4
Demolizione e rifacimento soletta superiore	4
TRATTO 3 - Sotto galleria Montino	
Opere speciali	8
Travi cordolo	4
Demolizioni e scavi	4
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	5
Placcaggi muri laterali	4
TRATTO 2 - Da sez. 25 a Galleria Montino	
Opere speciali	16
Travi cordolo	8
Demolizioni e scavi	8
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	9
Placcaggi muri laterali	8
Demolizione e rifacimento soletta superiore	8
TRATTO 1 - Da sez. 13 (imbocco di monte) a sez. 25	
Opere speciali	16
Travi cordolo	8
Demolizioni e scavi	8
Opere in c.a. Platea e contromuri inferiori	9
Placcaggi muri laterali	8
Demolizione e rifacimento soletta superiore	8
TRATTO 13 - Sant'Antonino da sez. 72 a cponfluenza Vellino	
Opere speciali	16
Travi cordolo	6
Demolizioni e scavi	9
Opere in c.a. platea e muri	10
Demolizione e rifacimento soletta superiore	8
TRATTO 12 - Sotto Galleria Sant'Antonino	
Opere speciali	3
Scavi e demolizioni	4
Opere in c.a.	3
Opere di finitura soletta superiore	3
TRATTO 11 - Imbocco Sant'Antonino	
Opere speciali	2
Scavi e demolizioni	8
Opere in c.a.	8
OPERE DI FINITURA E SISTEMAZIONI FINALI	9

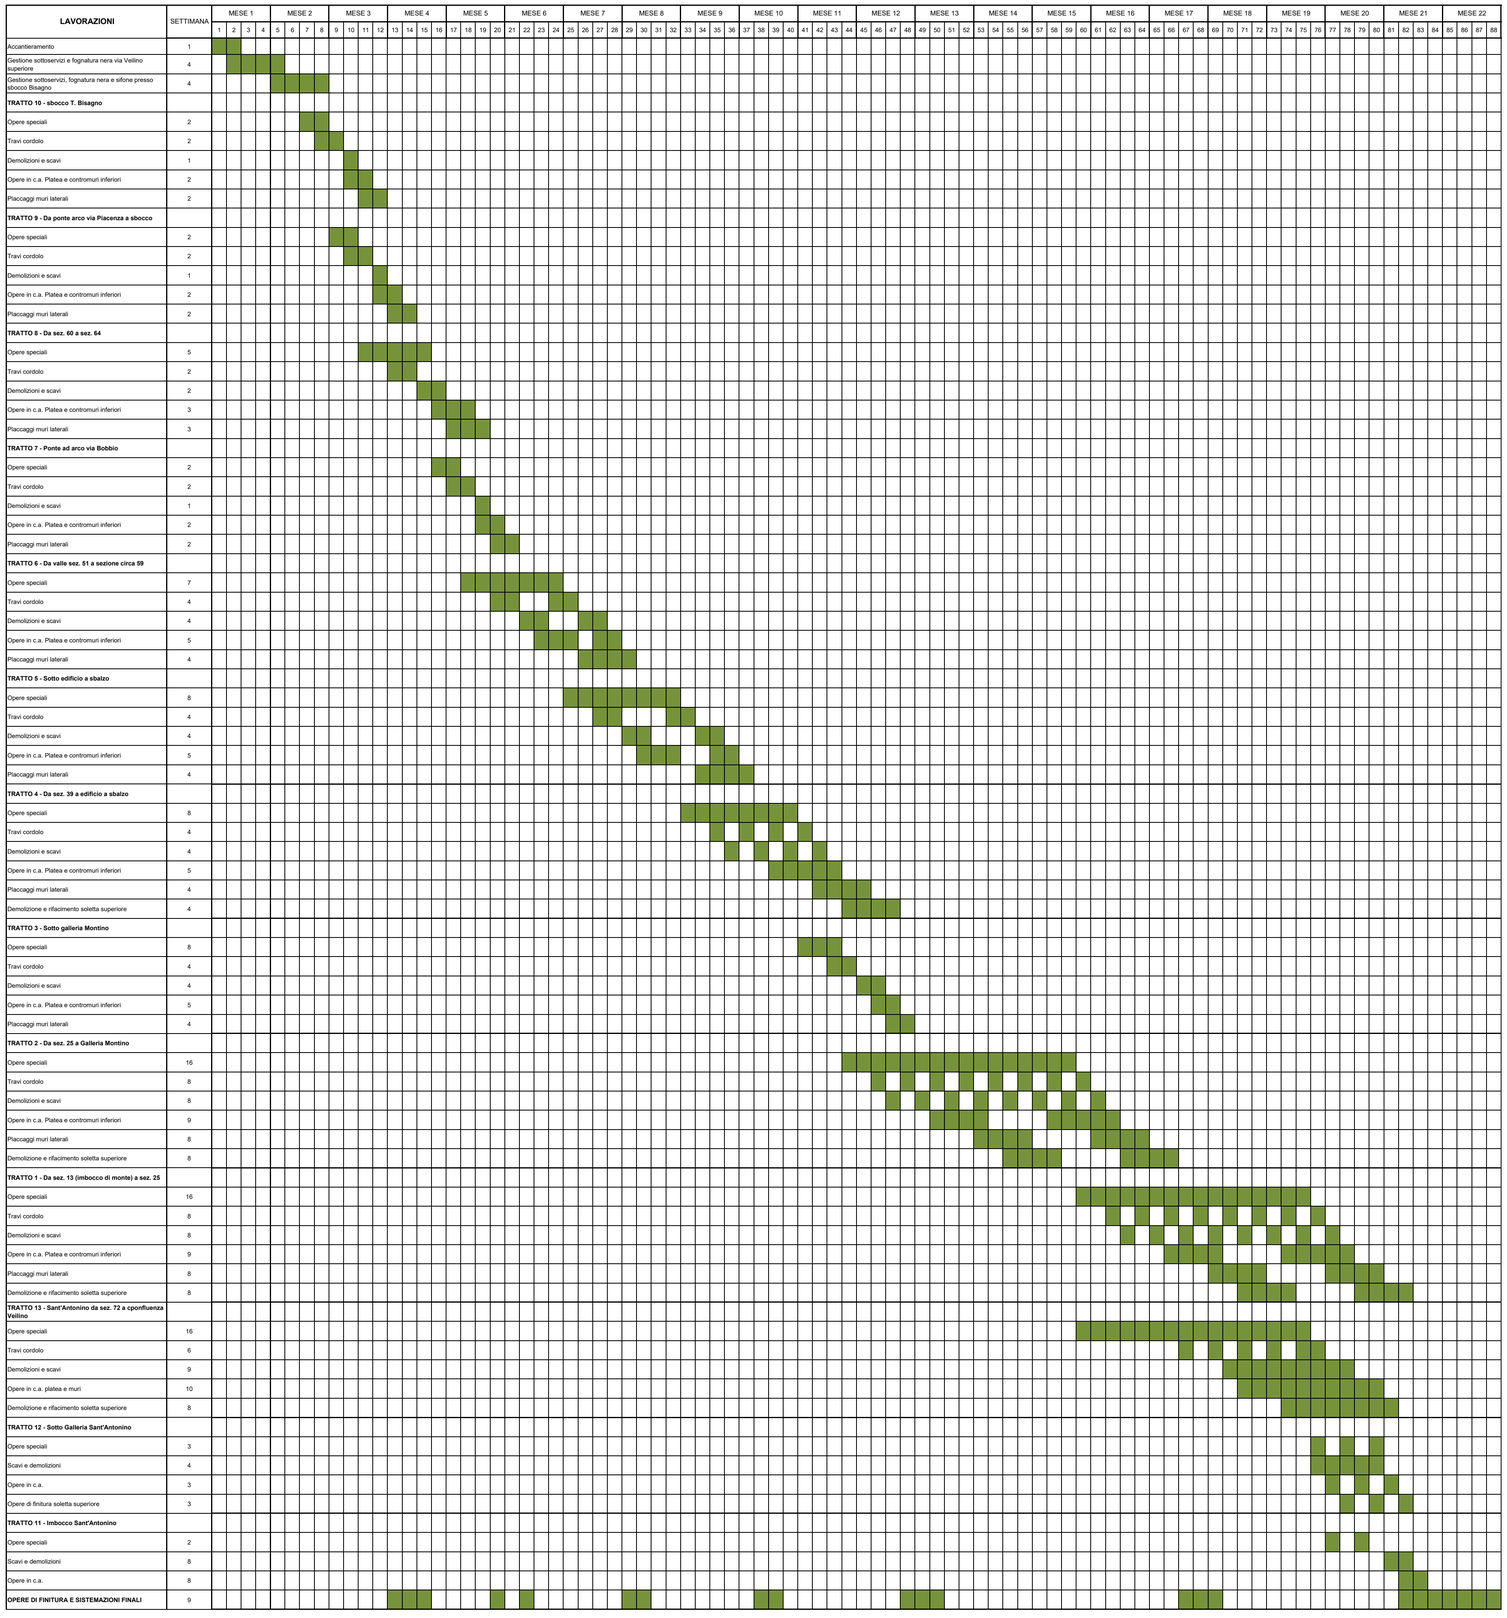

NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.
