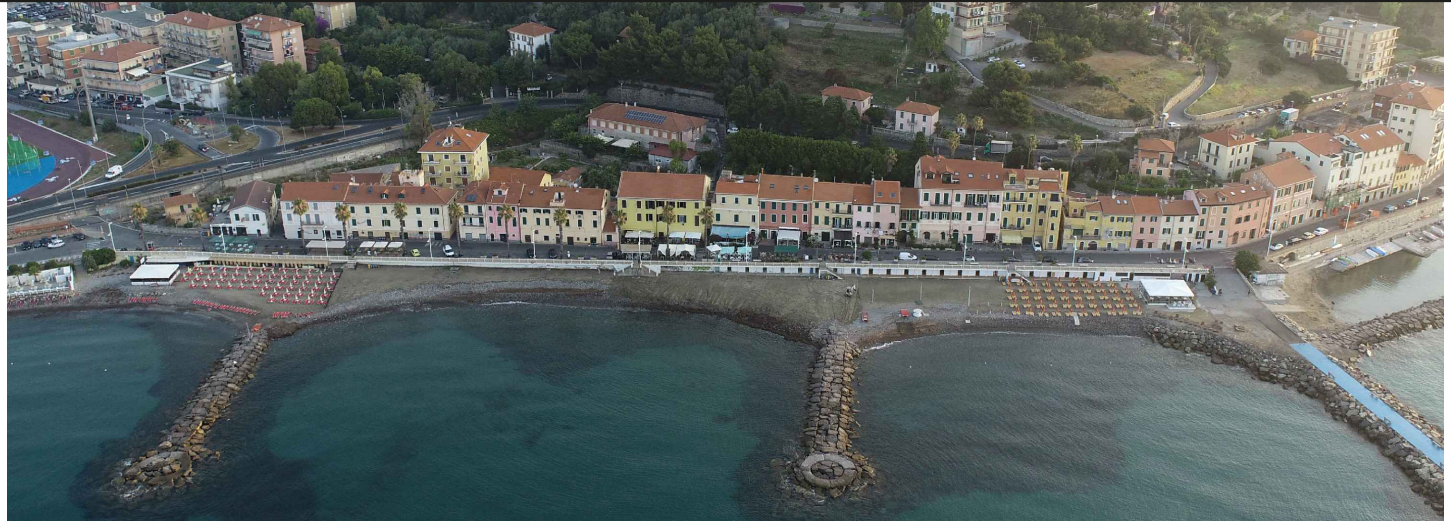


LOTTO A : ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI CUP D57H21001220001 - CIG 9015068D72

LOTTO B : RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE OGGETTO DI ALTRI FINANZIAMENTI

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L
Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	-	30/03/2022

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2					
1					
0	30/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	S.R.	S.R.	D.G.

TITOLO	TAV N°
CRONOPROGRAMMA	Elab 18

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	7 g
Preparazione delle aree di cantiere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g
Interventi di preparazione delle aree di cantiere	3 g
Apprestamenti del cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Impianti di servizio del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Ripascimento spiaggia	107 g
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri)	107 g
Salpamento (mezzi terrestri)	107 g
Ridifinizione pennelli, isole e scogliera	119 g
Realizzazione di pennello ed isole (mezzi terrestri)	88 g
Realizzazione di pennello ed isole (mezzi marittimi)	88 g
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)	31 g
Realizzazione di scogliera (mezzi marittimi)	31 g
Salpamento (mezzi marittimi)	31 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = APPRESTAMENTI	
Z2 = OPERE EDILI	
Z3 = OPERE A MARE	
Z4 = ORGANIZZAZIONE COVID	

