
FASE 3: TRATTO A CIELO APERTO DA SEZ. 0.8 A SEZ. 1.1


DURATA GIORNI LAVORATIVI 180

SEZIONE TIPO
FASE 3 - CANTIERIZZAZIONE - Scala 1:200

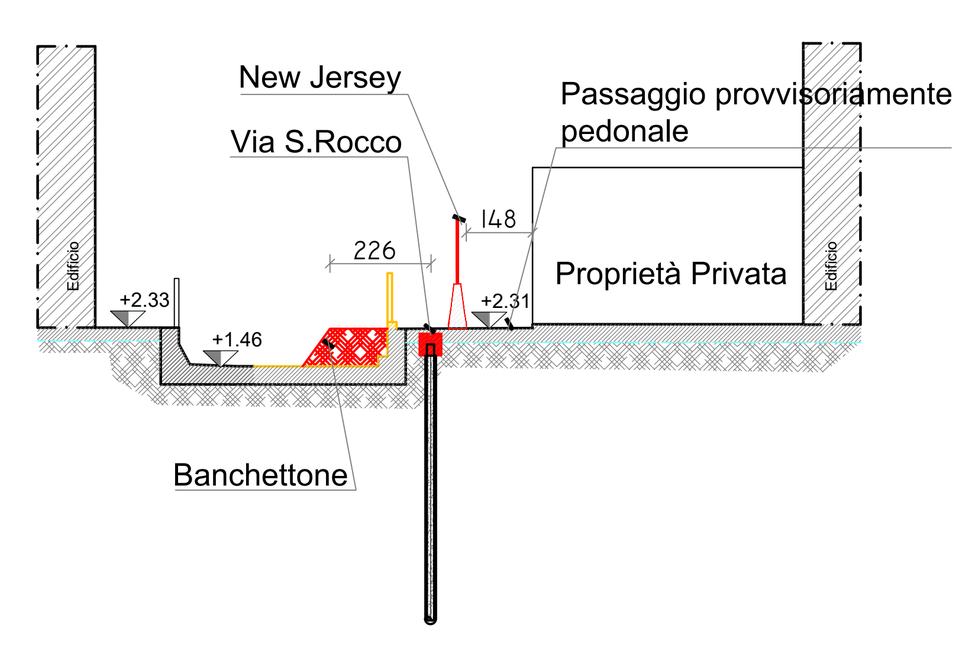


Sottofase A:

1. Mantenimento dell'area di cantiere sulla strada Via Lungomare Generale A.Diaz. Pertanto il traffico continuerà per tutta la durata delle lavorazioni necessarie ad essere convogliato sul marciapiede lungomare; mentre su Via S. Rocco permane sul tratto a monte dalla sez. 1.05 il doppio senso provvisorio, a valle invece sarà accessibile solo pedonalmente;
2. Realizzazione recinzione new jersey a protezione da polveri, schizzi e movimentazioni mezzi sulla sponda destra fino a sez. 1,.05;
3. Realizzazione banchettone con escavatore per permettere la realizzazione della paratia in sponda destra dall'interno dell'alveo; il banchettone ha anche la funzione di tura;
4. Realizzazione paratia sponda destra: utilizzo 2 macchine testa testa;

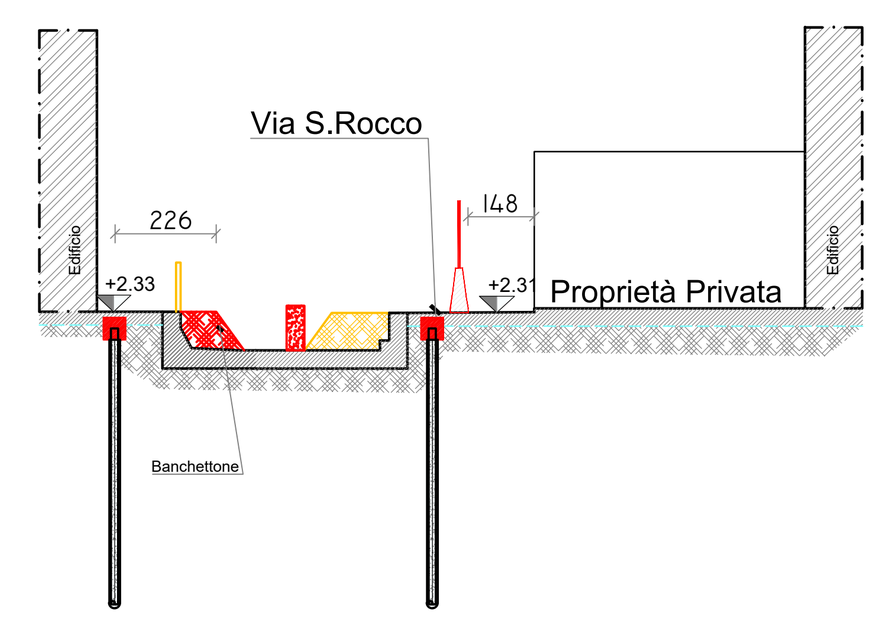


5. Delimitazione dell'area di lavoro in sponda sinistra fino a circa alla sez. 1.05;
6. Spostamento del banchettone in sponda sinistra per realizzazione della paratia sulla sponda stessa; contemporaneamente realizzazione tura in modo da convogliare l'acqua a centro alveo; a banchettone terminato in sponda sinistra spostamento deflusso acqua in sponda destra;
7. Realizzazione paratia sponda sinistra:utilizzo 2 macchine testa testa;

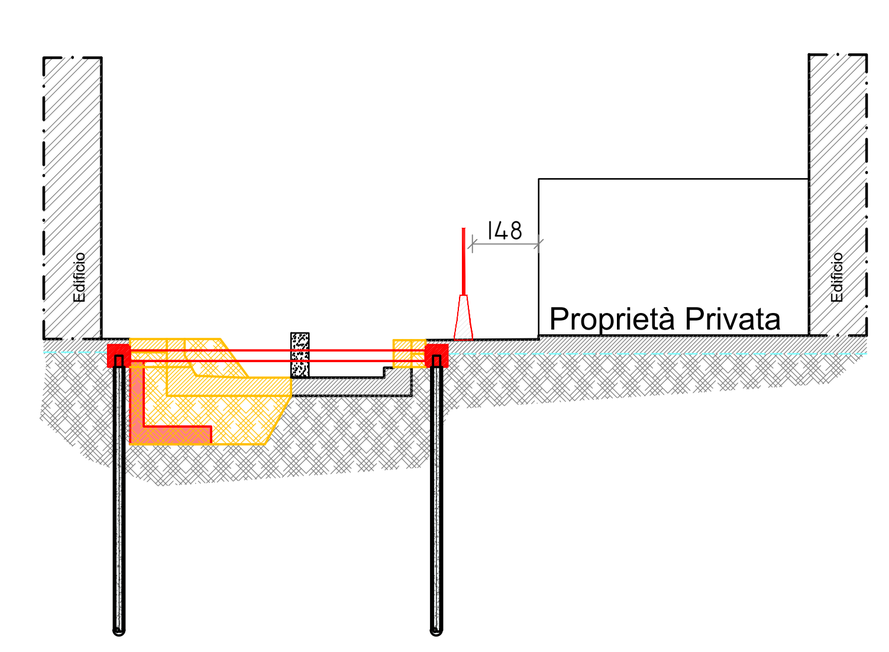


8. Rimozione banchettone;
9. Realizzazione puntoni di contrasto tra le 2 paratie;
10. Demolizione struttura alveo sinistro;
11. Scavo a cielo aperto fino al raggiungimento della quota fondo alveo richiesta da progetto;
12. Realizzazione soletta inferiore e parete sponda sinistra;


SOTTOFASE A

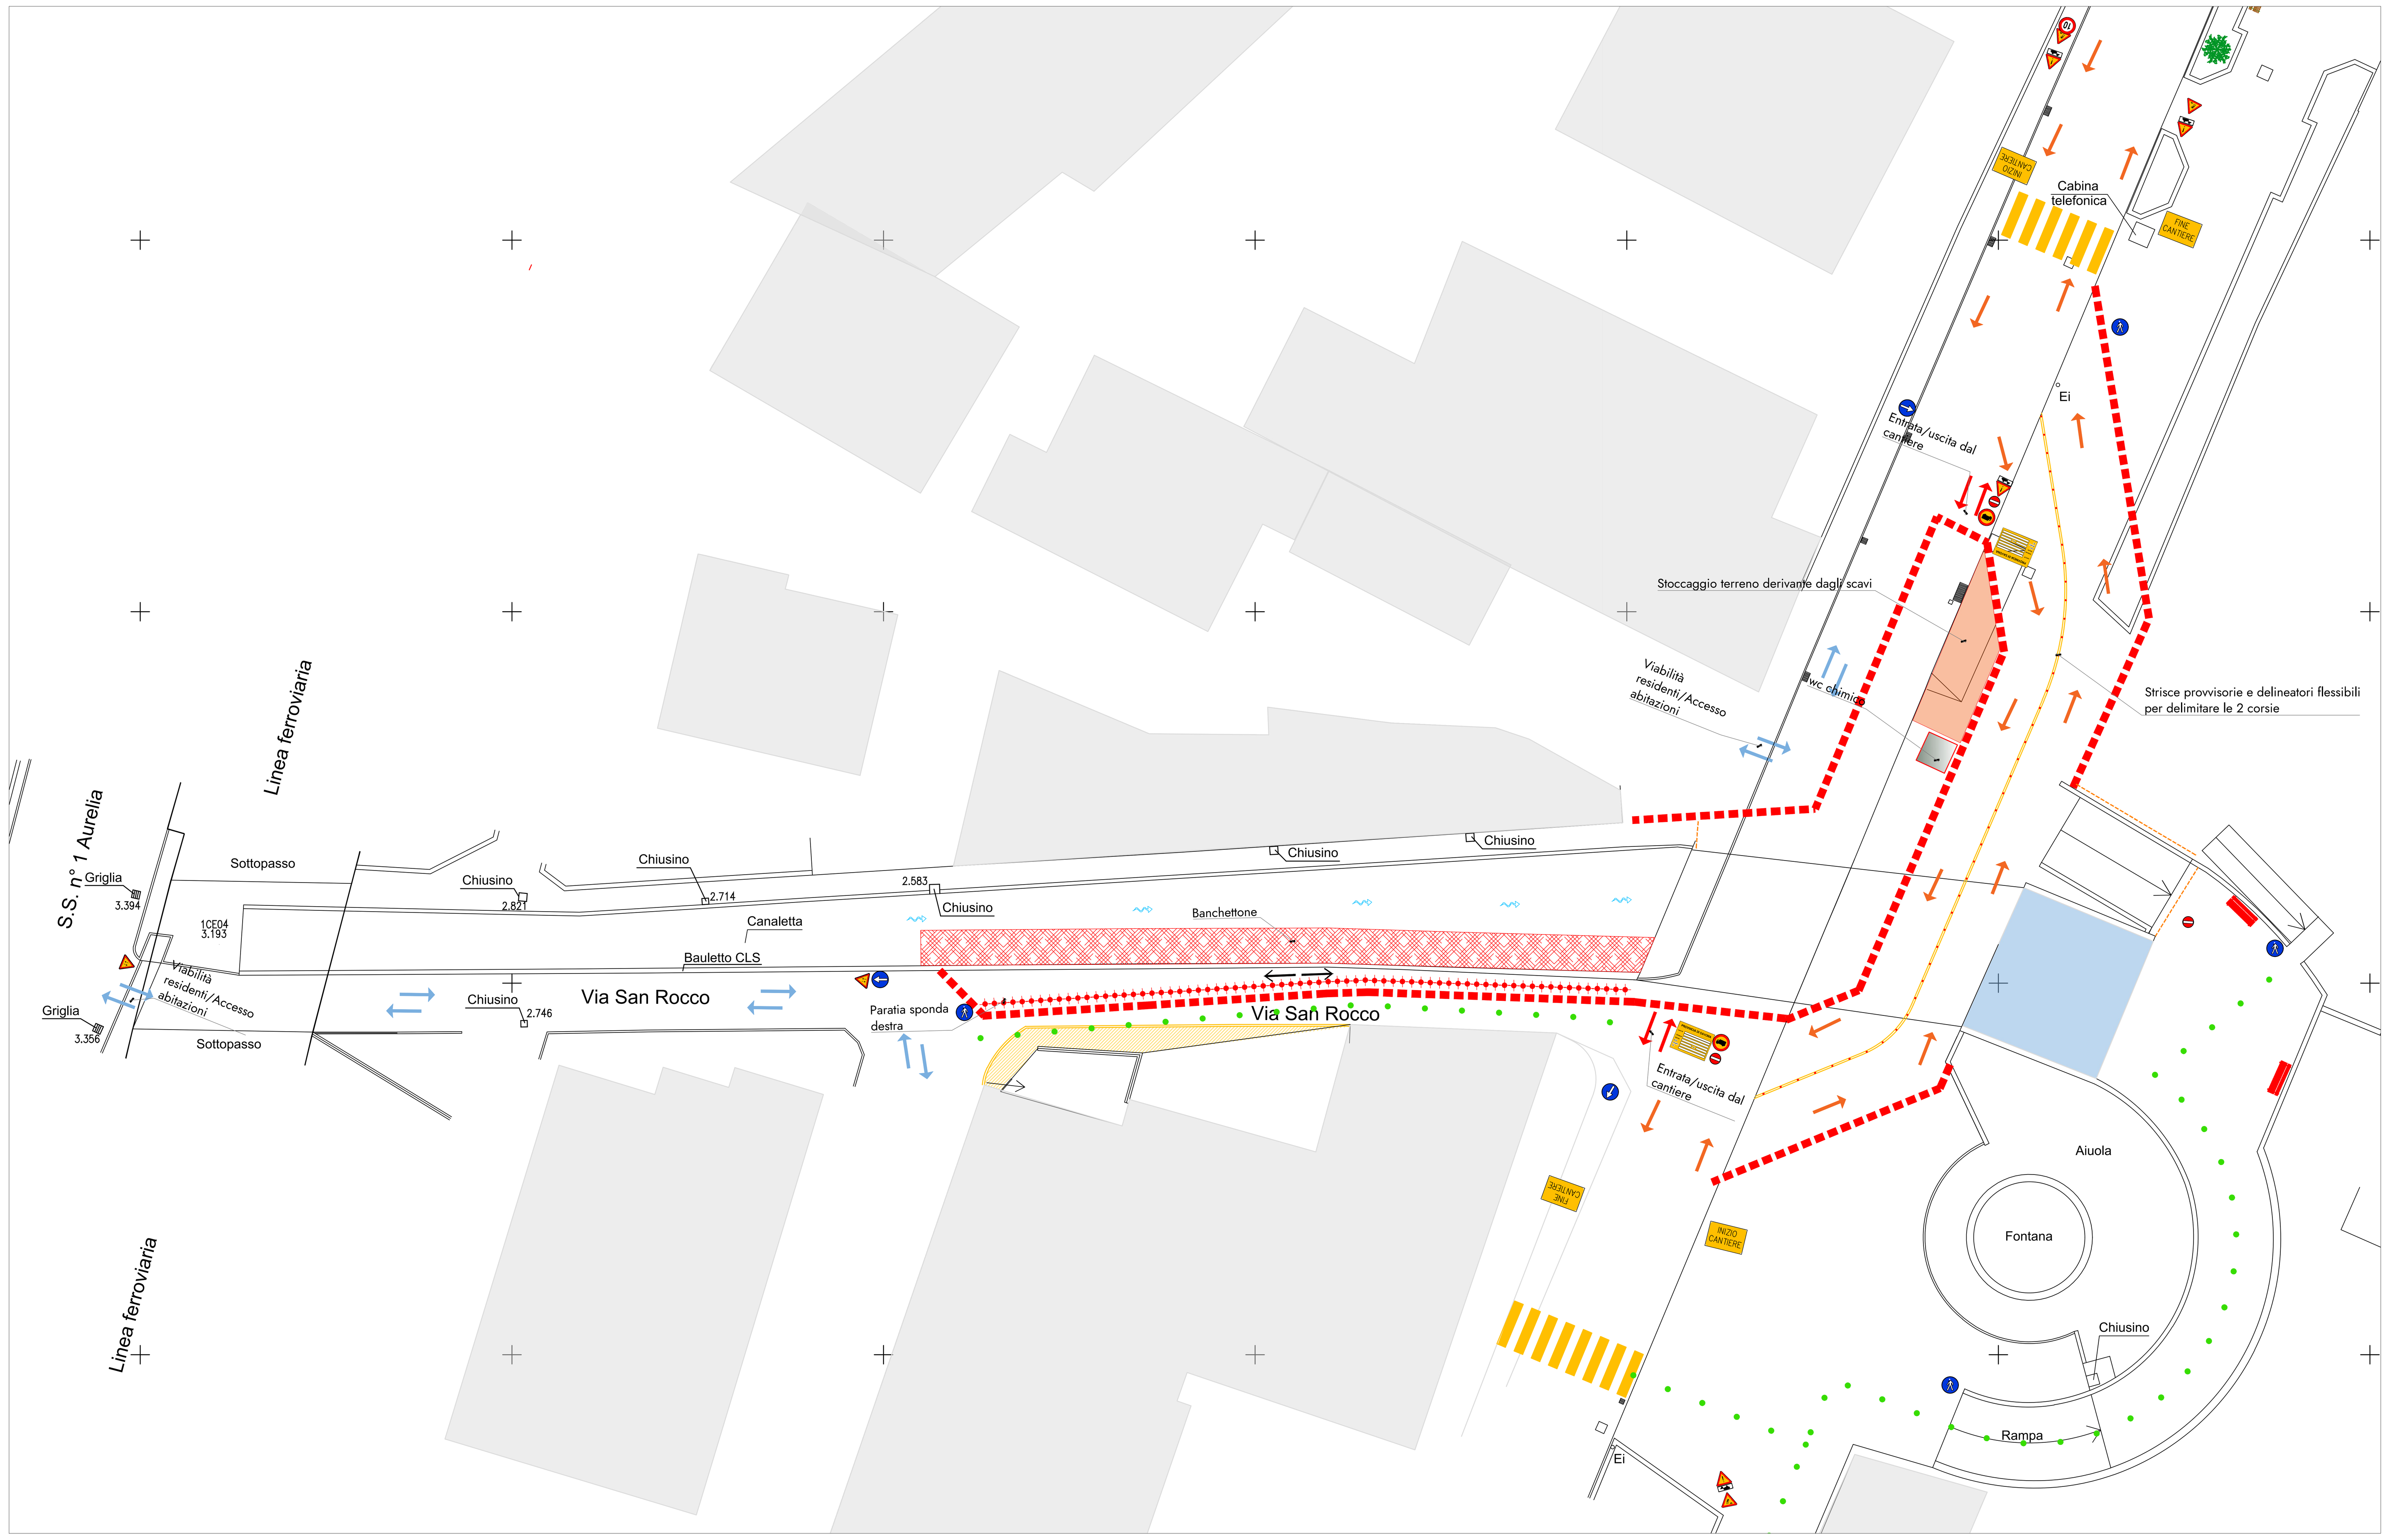


SOTTOFASE A

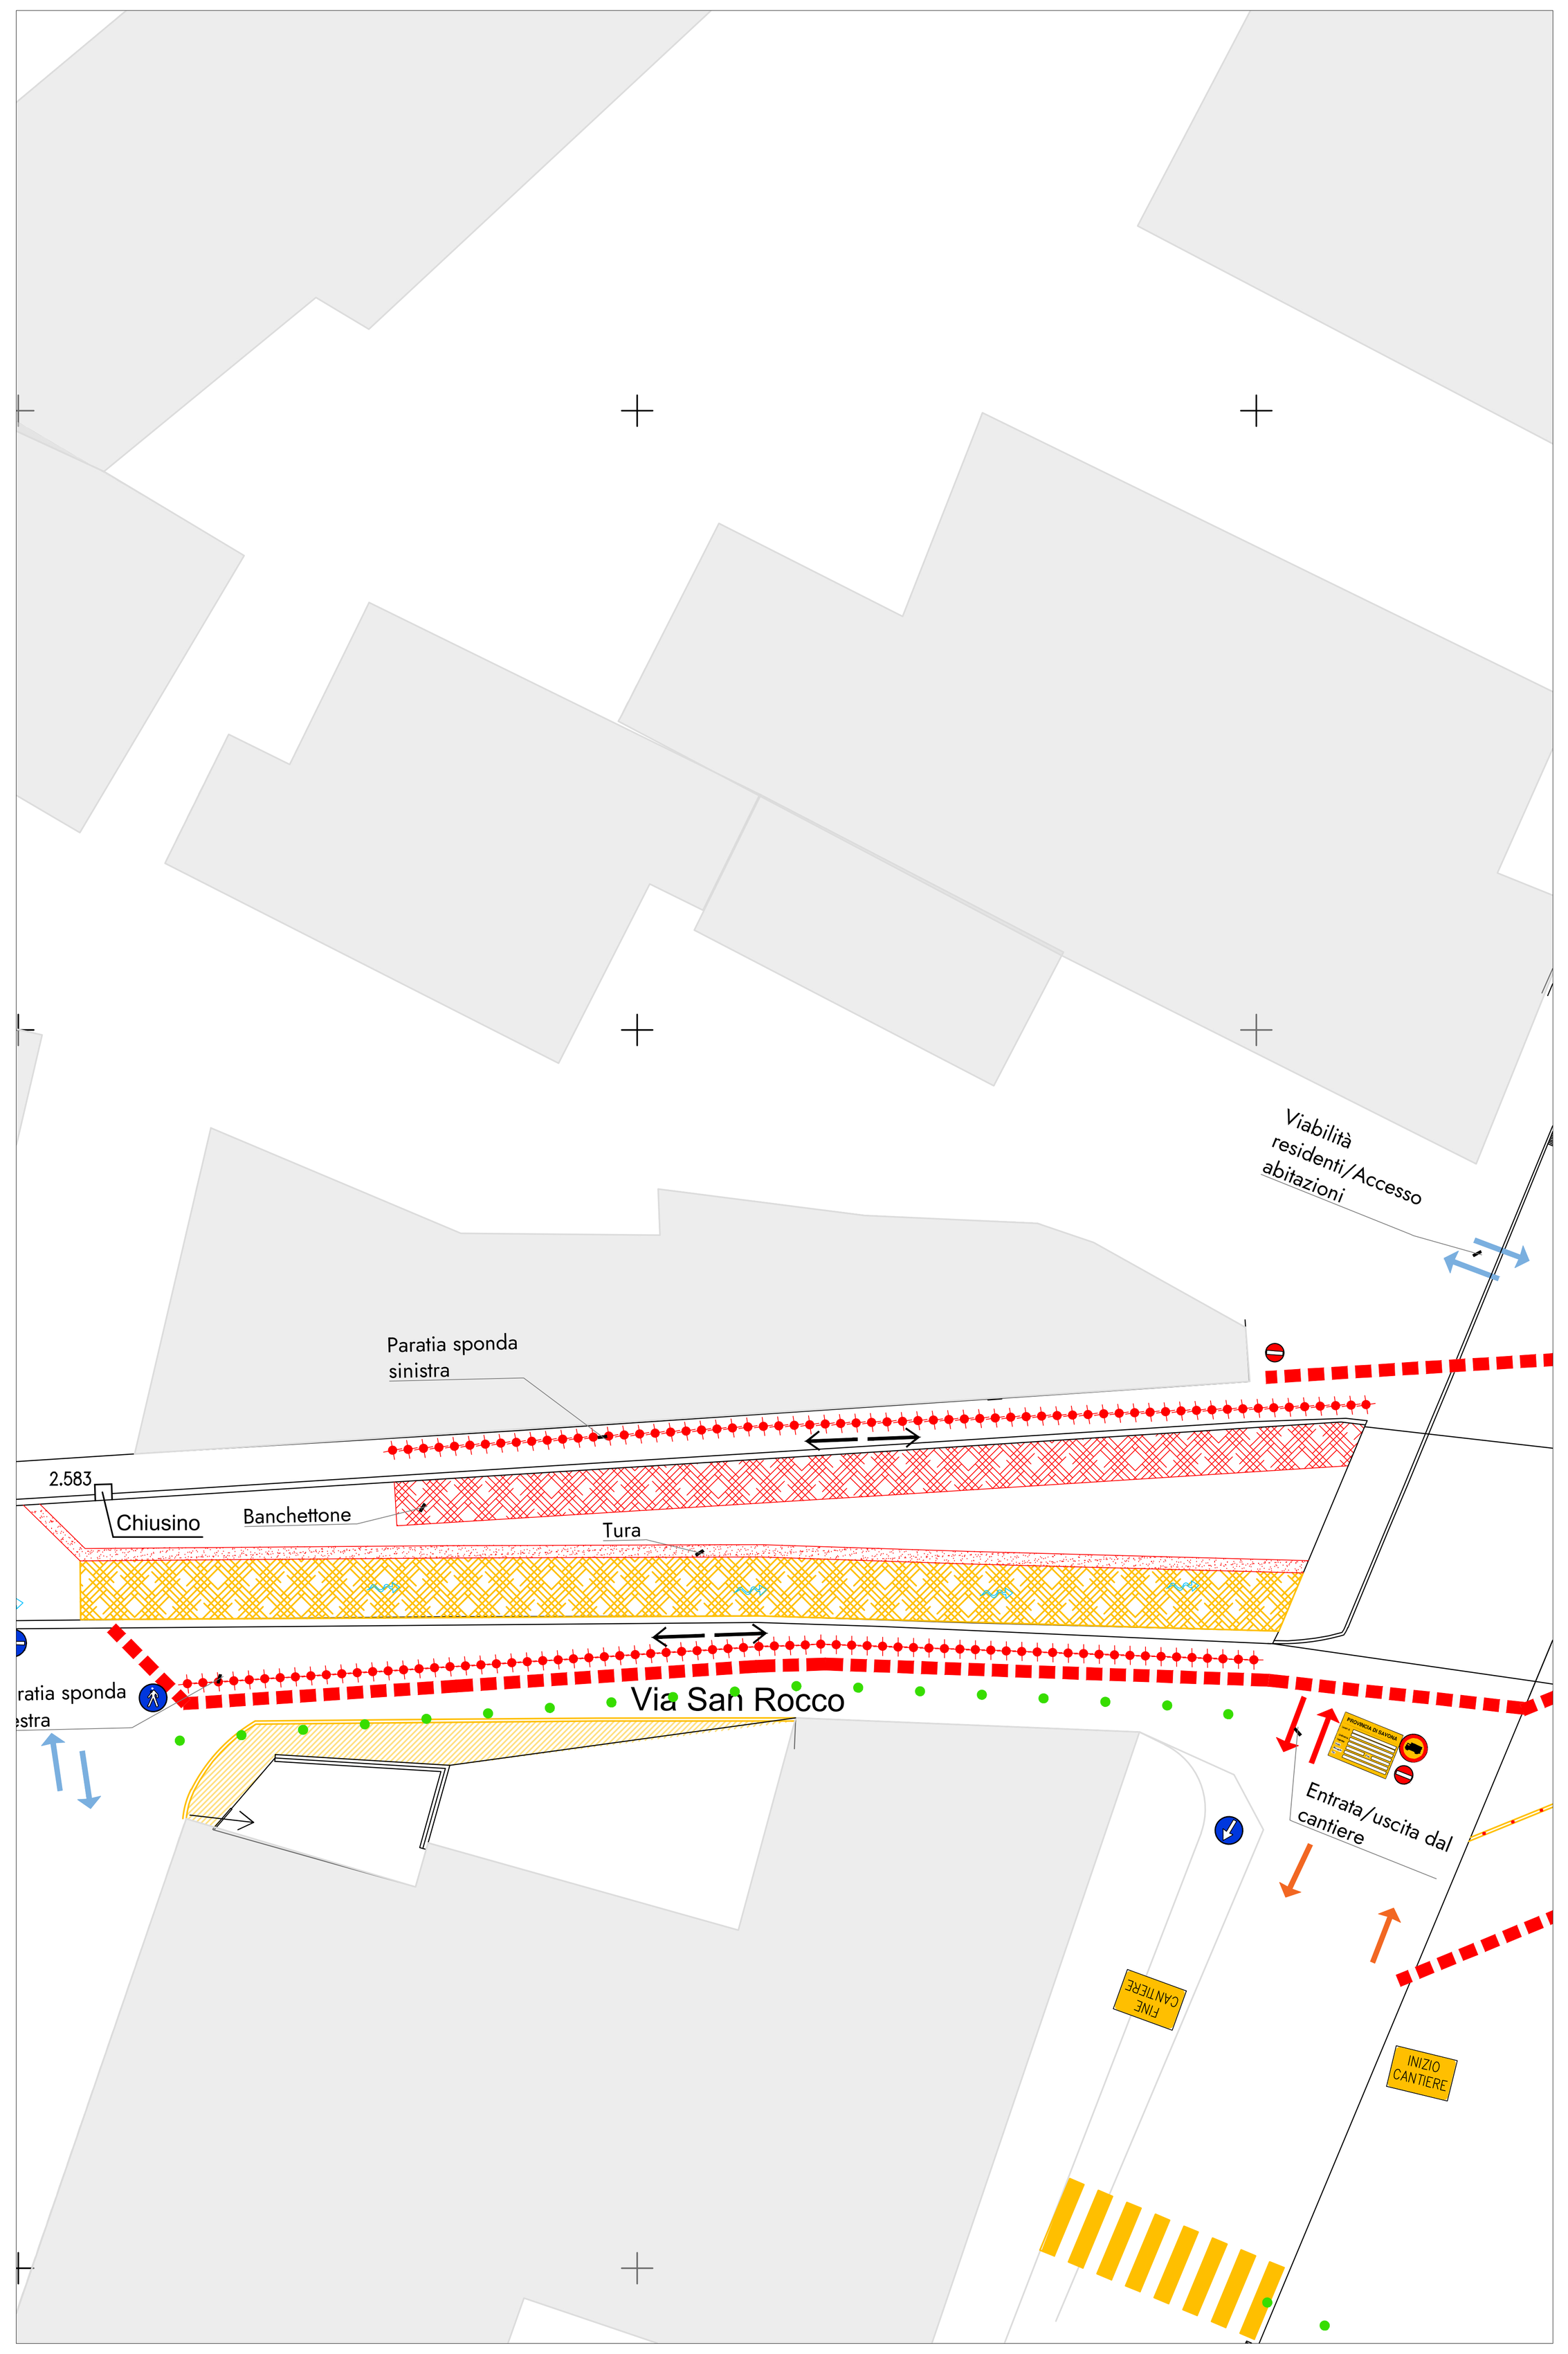

SOTTOFASE A

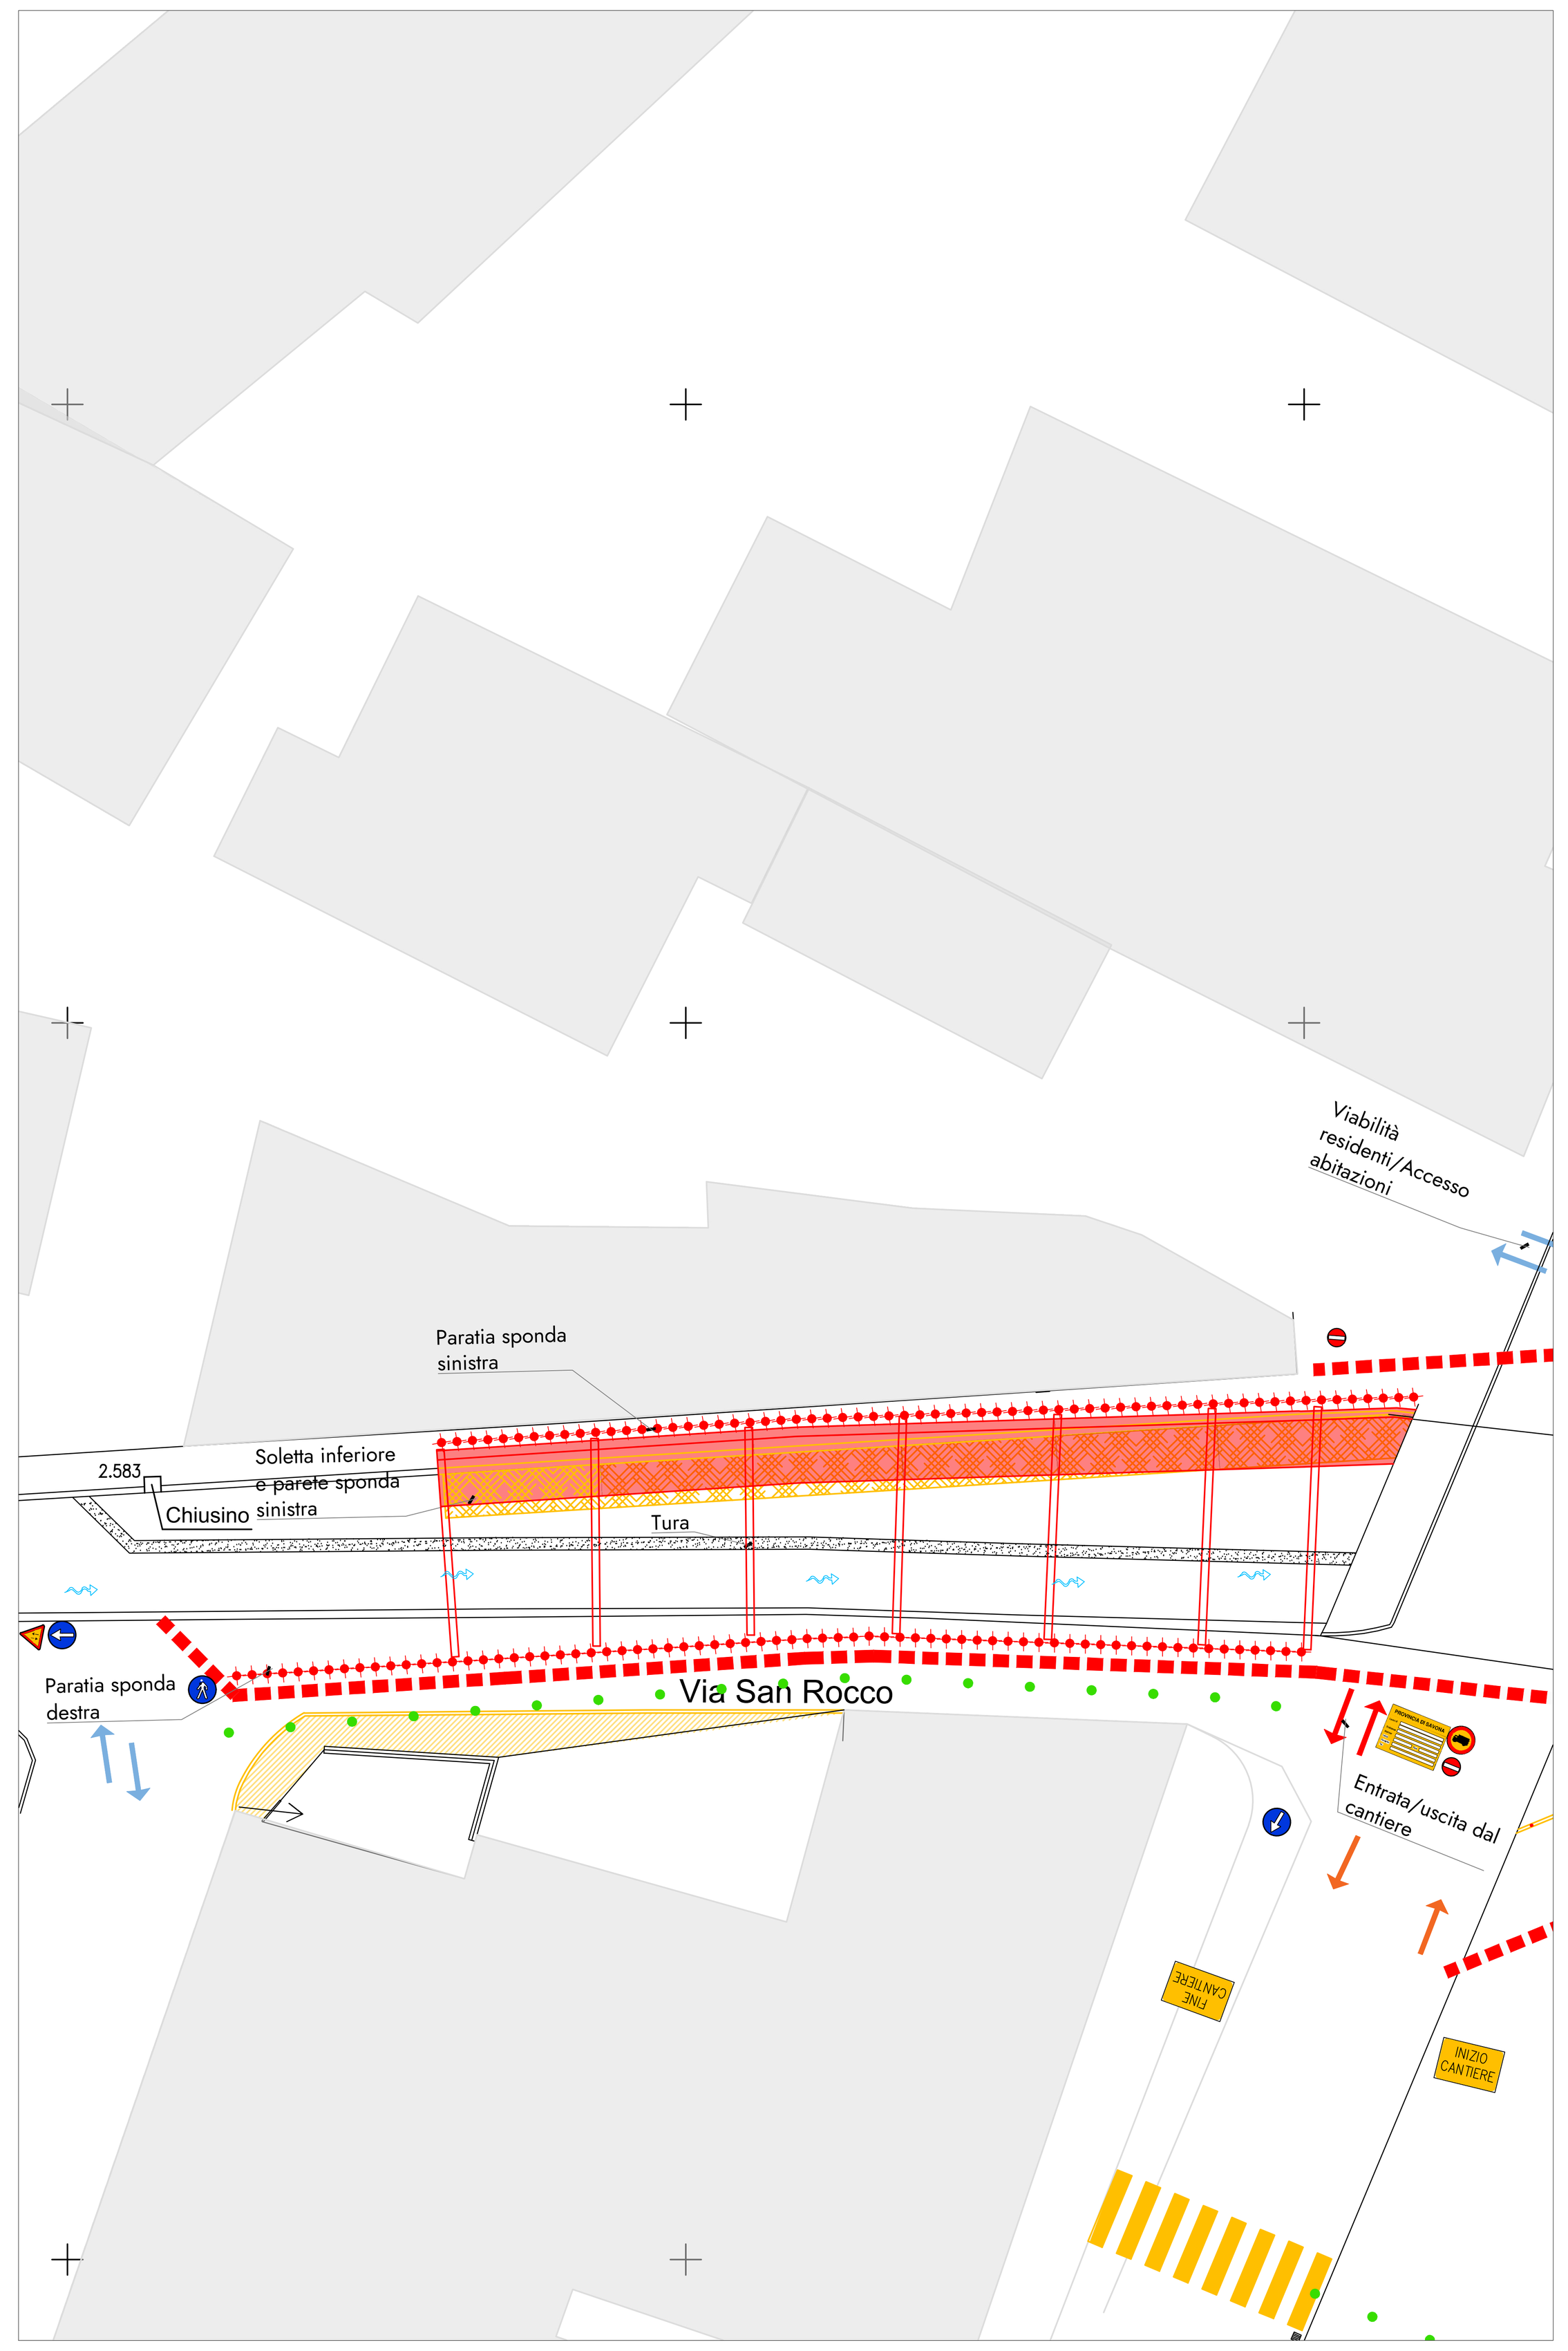

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
Scala 1:500

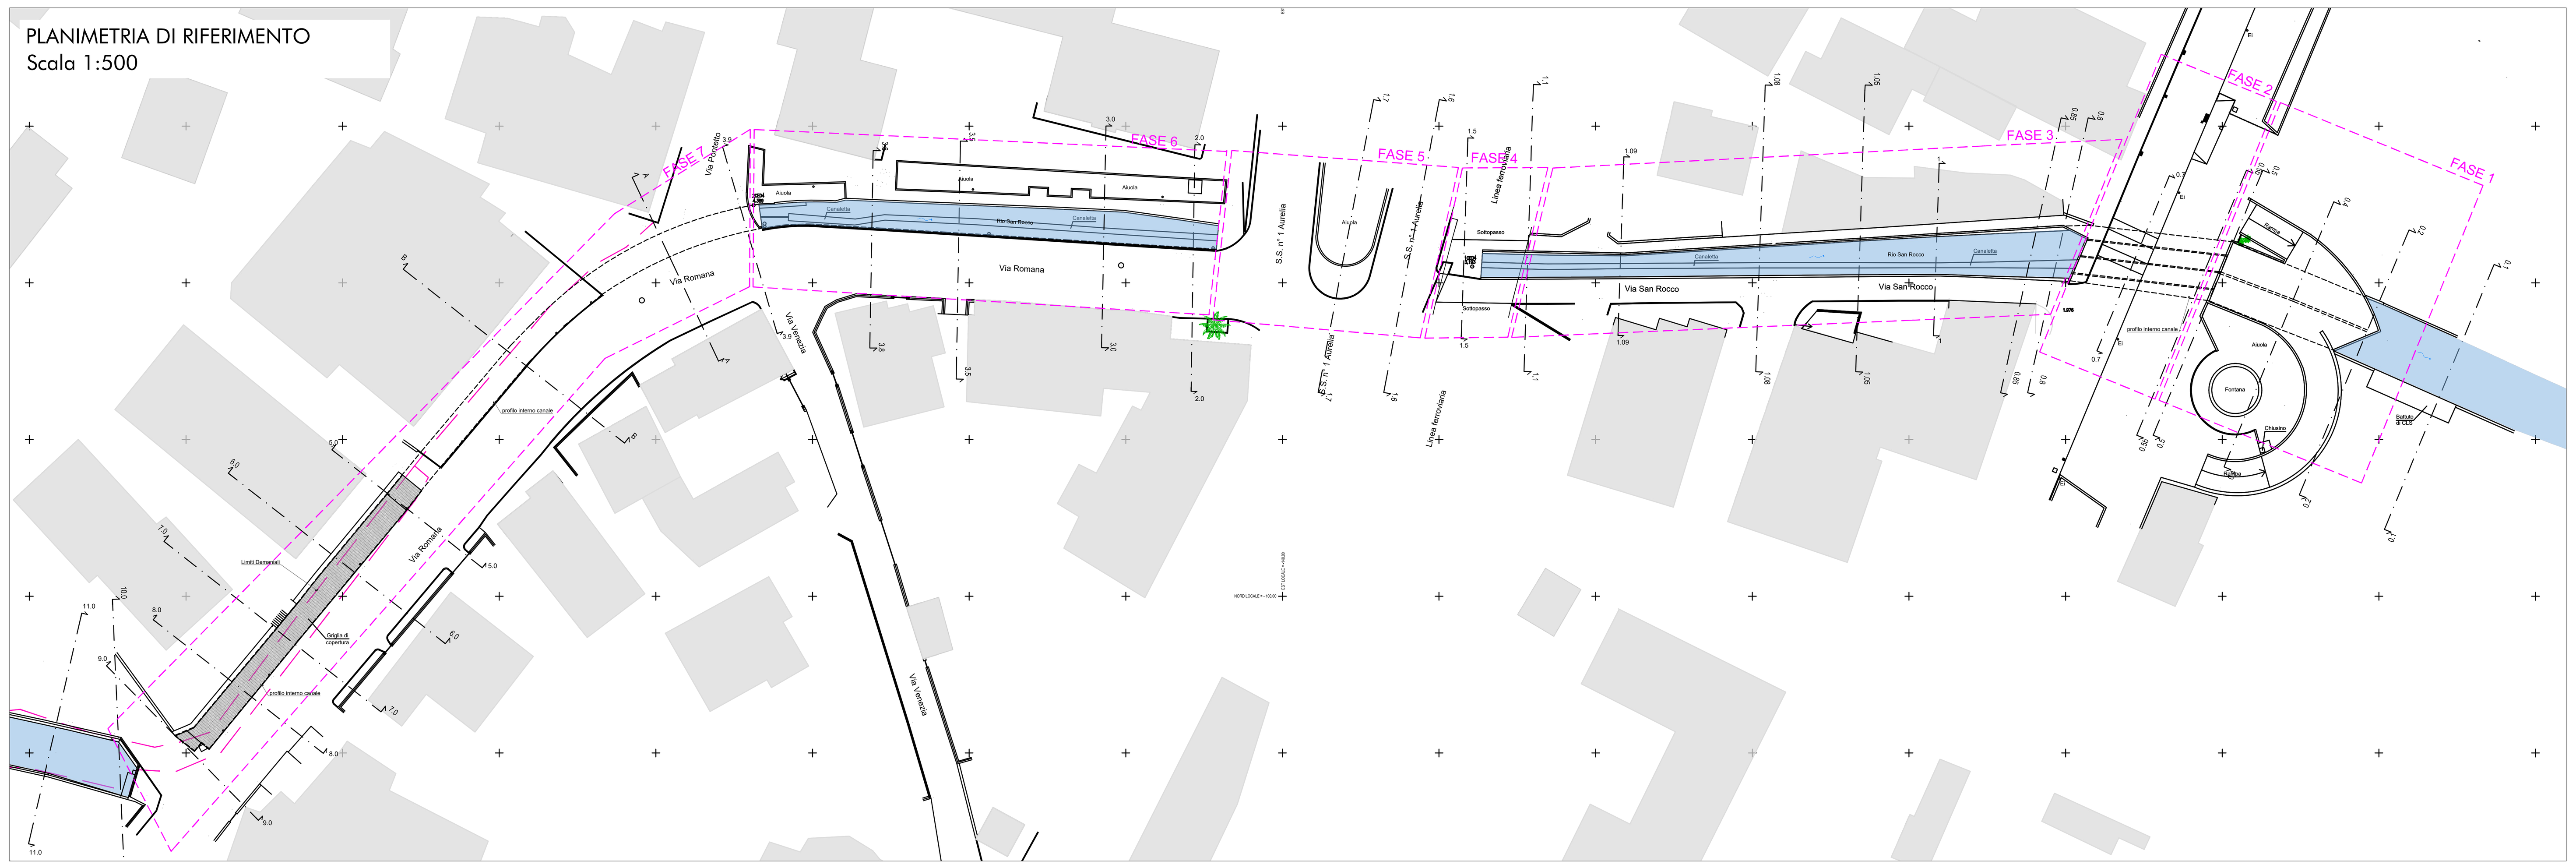

LEGENDA

(linea tratteggiata arancione)	RECINZIONE METALLICA
(linea tratteggiata rossa)	RECINZIONE NEW JERSEY
(punti verdi)	PASSAGGIO PEDONALE

itec ENGINEERING

COMUNE DI CERIALE
PROVINCIA DI SAVONA

Committente: COMUNE DI CERIALE

Livello di progetto: DEFINITIVO

Titolo:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO SAN ROCCO

Tavola n°: LYT-004

Scala: 1:200 - 1:500

Oggetto:
CANTIERIZZAZIONE:
Fase 3

Codice Progetto: P107-21

Nome File: P107-21-D-DI-LYT-004-B

Firme:

DANIELE GUERRIERI INGEGNERE Civile ed Ambientale Industriale dell'Informazione A 958 — ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DELLA SPEZIA

Firmato digitalmente da
daniele guerrieri
CN = guerrieri daniele
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia
C = IT

Rev.	Modifiche / Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	SC / -	21/04/2022	DG	21/04/2022
B	SECONDA EMISSIONE	SC / -	18/05/2022	DG	18/05/2022
-	-	- / -	-	-	-
-	-	- / -	-	-	-

itec ENGINEERING
info@itec-engineering.it
www.itec-engineering.it
19038 SARZANA (SP) Via B. P. U. Muccini, 54 A TEL. +39 0187 610532
16129 GENOVA Via Antonio Cecchi, 7/9-10 TEL. +39 010 5959690

ASSOCIATO oice
apave Certification
ISO 9001 - N° SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001 - N° SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento.
