

FASE 6: TRATTO A CIELO APERTO DA SEZ. 2.0 A SEZ. 3.9

DURATA GIORNI LAVORATIVI 60


SEZIONE TIPO
FASE 6 - CANTIERIZZAZIONE - Scala 1:200

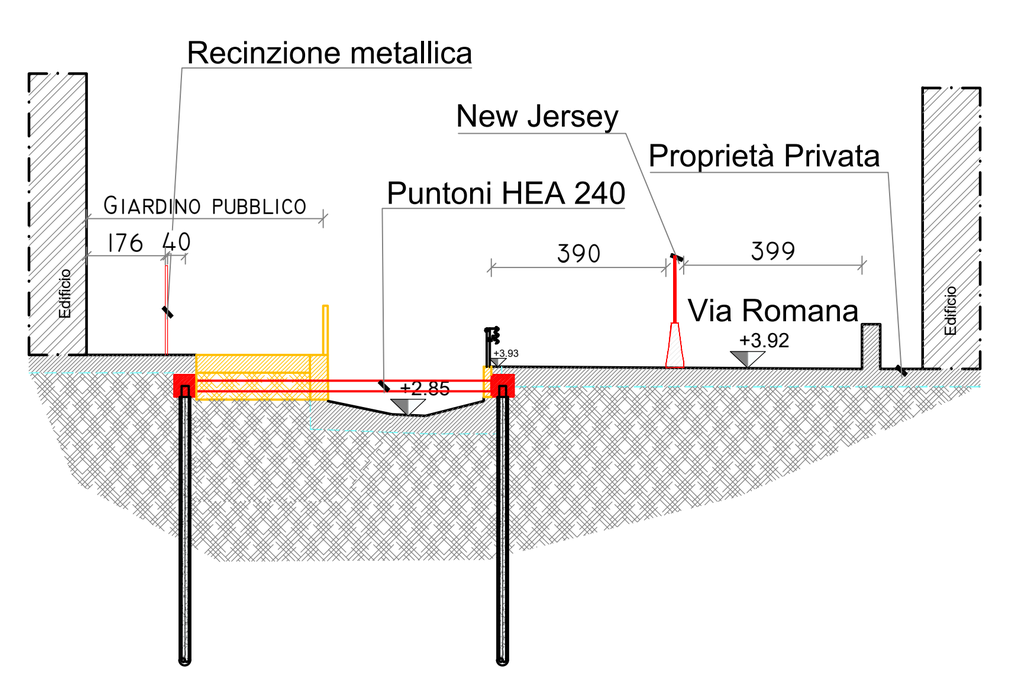


1. Realizzazione recinzione new jersey a protezione da polveri, schizzi e movimentazioni mezzi in sponda sinistra e sponda destra;
2. Chiusura corsia direzione Ventimiglia per cui strada a senso unico;
3. Demolizione aiuola e realizzazione della paratia sponda sinistra e sponda destra: utilizzo 2 macchine testa testa;
4. Scavo in sponda sinistra di circa 1 m e demolizione di parte della parete destra e sinistra per posizionamento di puntoni di contrasto tra le 2 paratie;

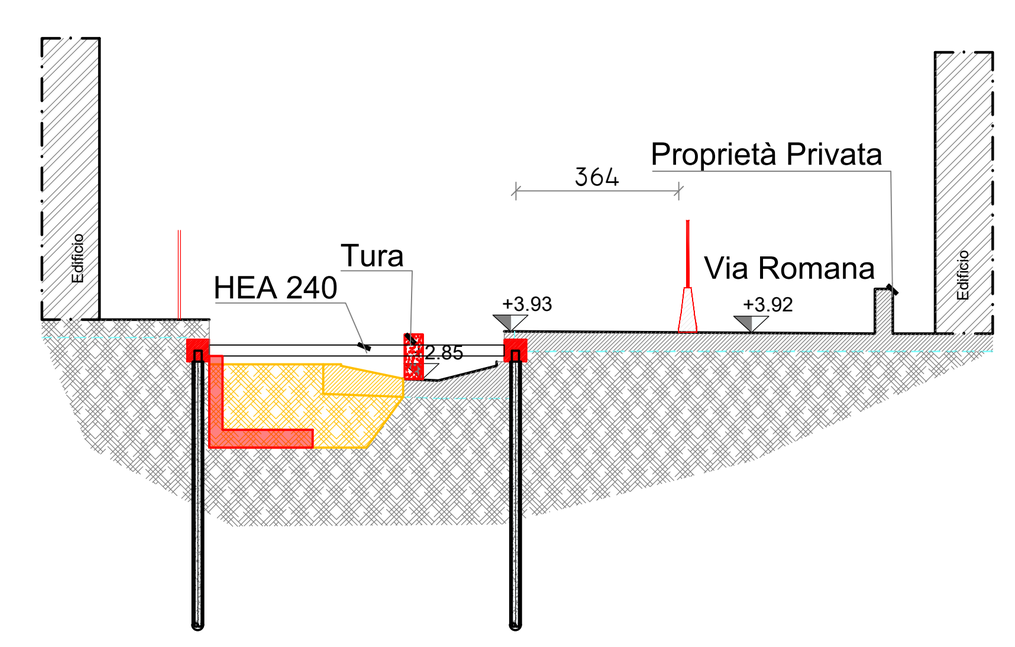



5. Realizzazione tura interna alla struttura esistente in modo da convogliare l'acqua in sponda destra;
6. Demolizione di parte della struttura restante in sponda sinistra;
7. Scavo a cielo aperto in sponda sinistra fino al raggiungimento della quota del fondo alveo richiesta da progetto;
8. Realizzazione soletta inferiore e parete sponda sinistra;

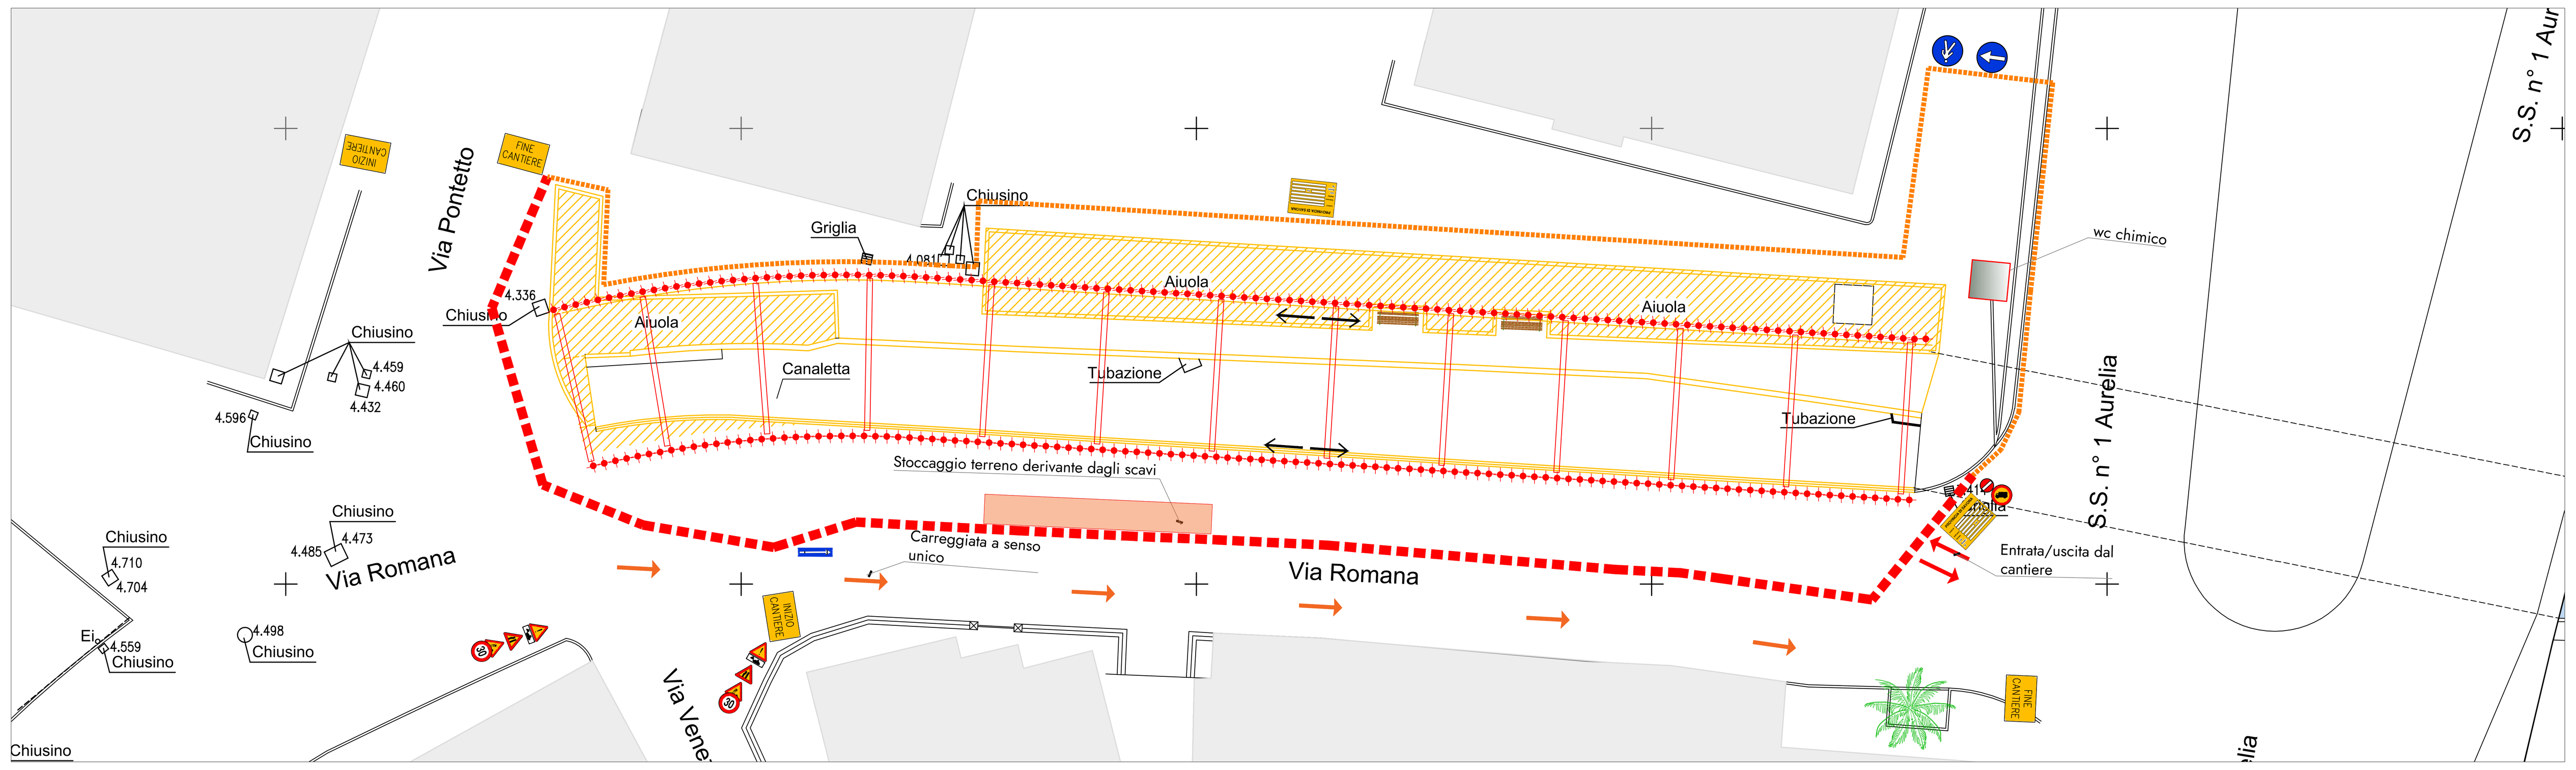




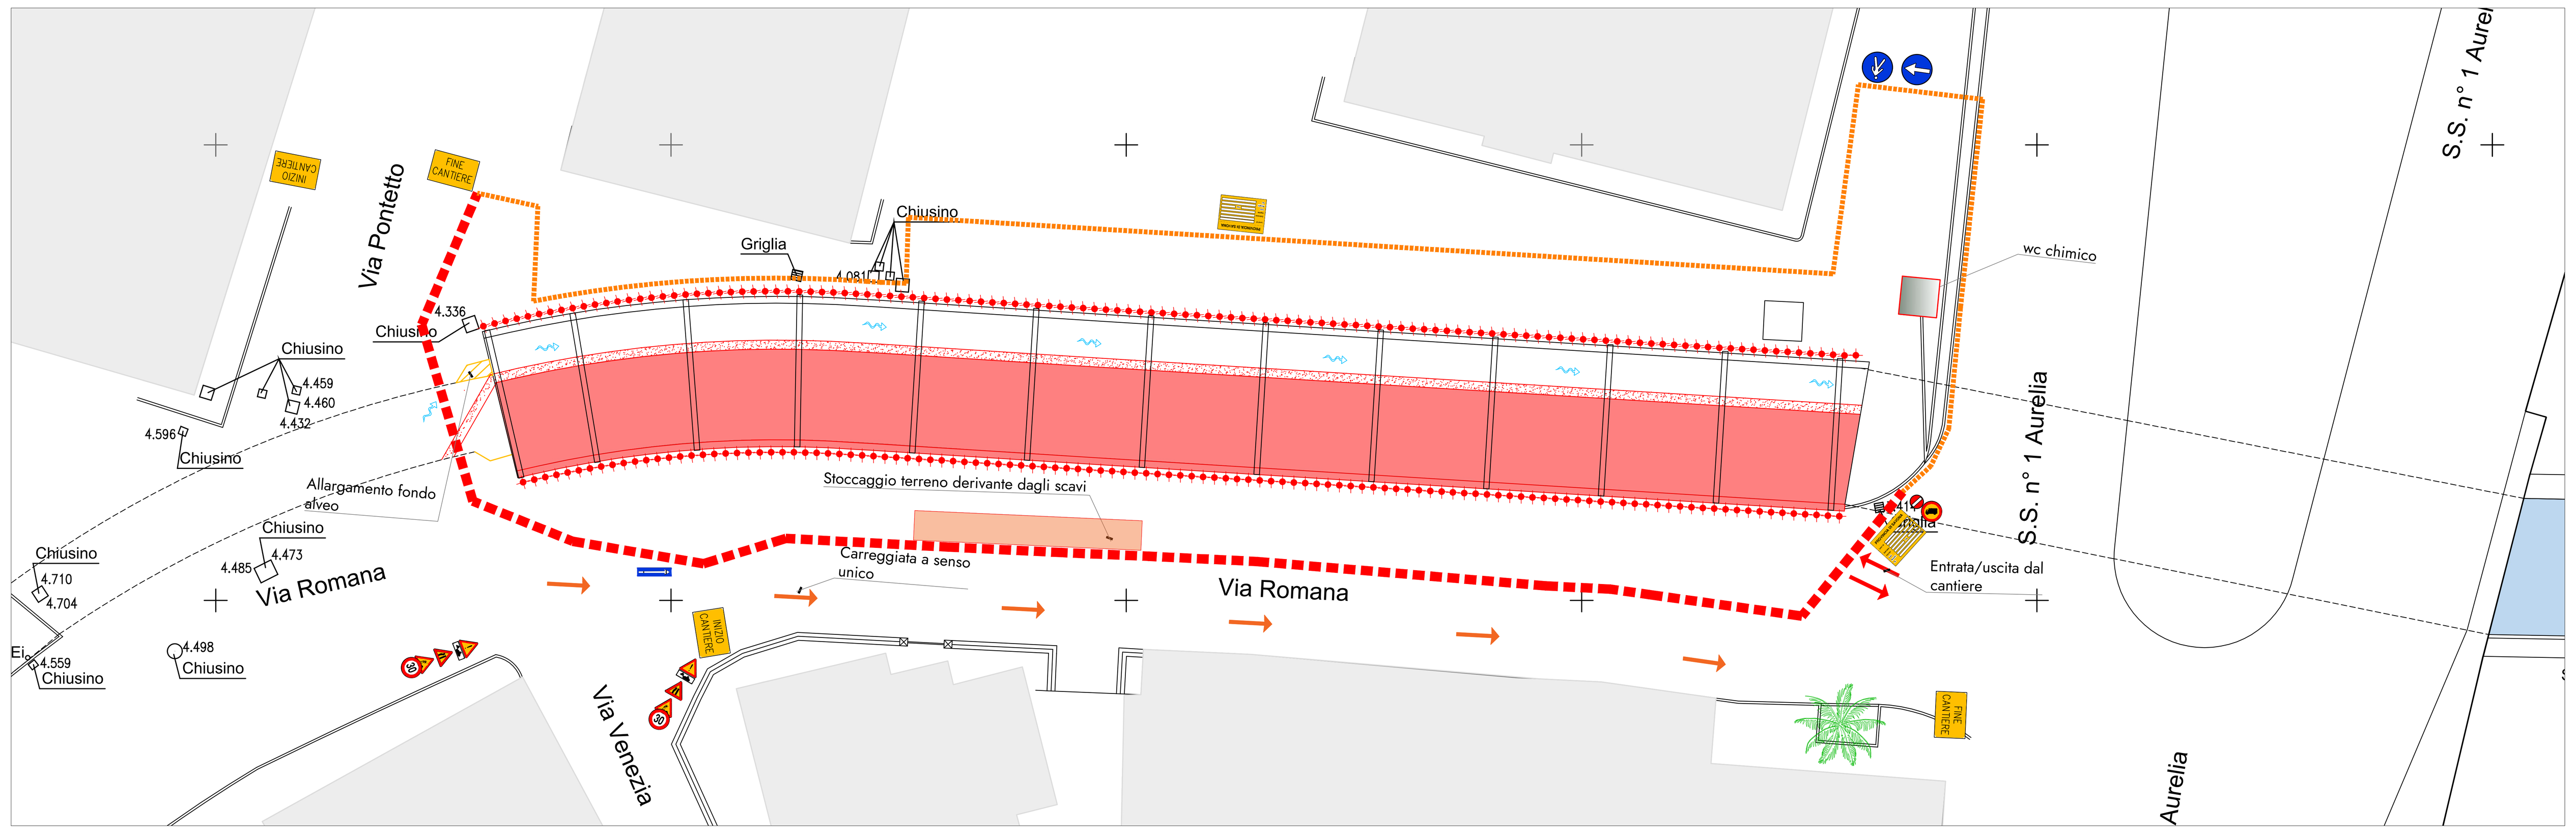

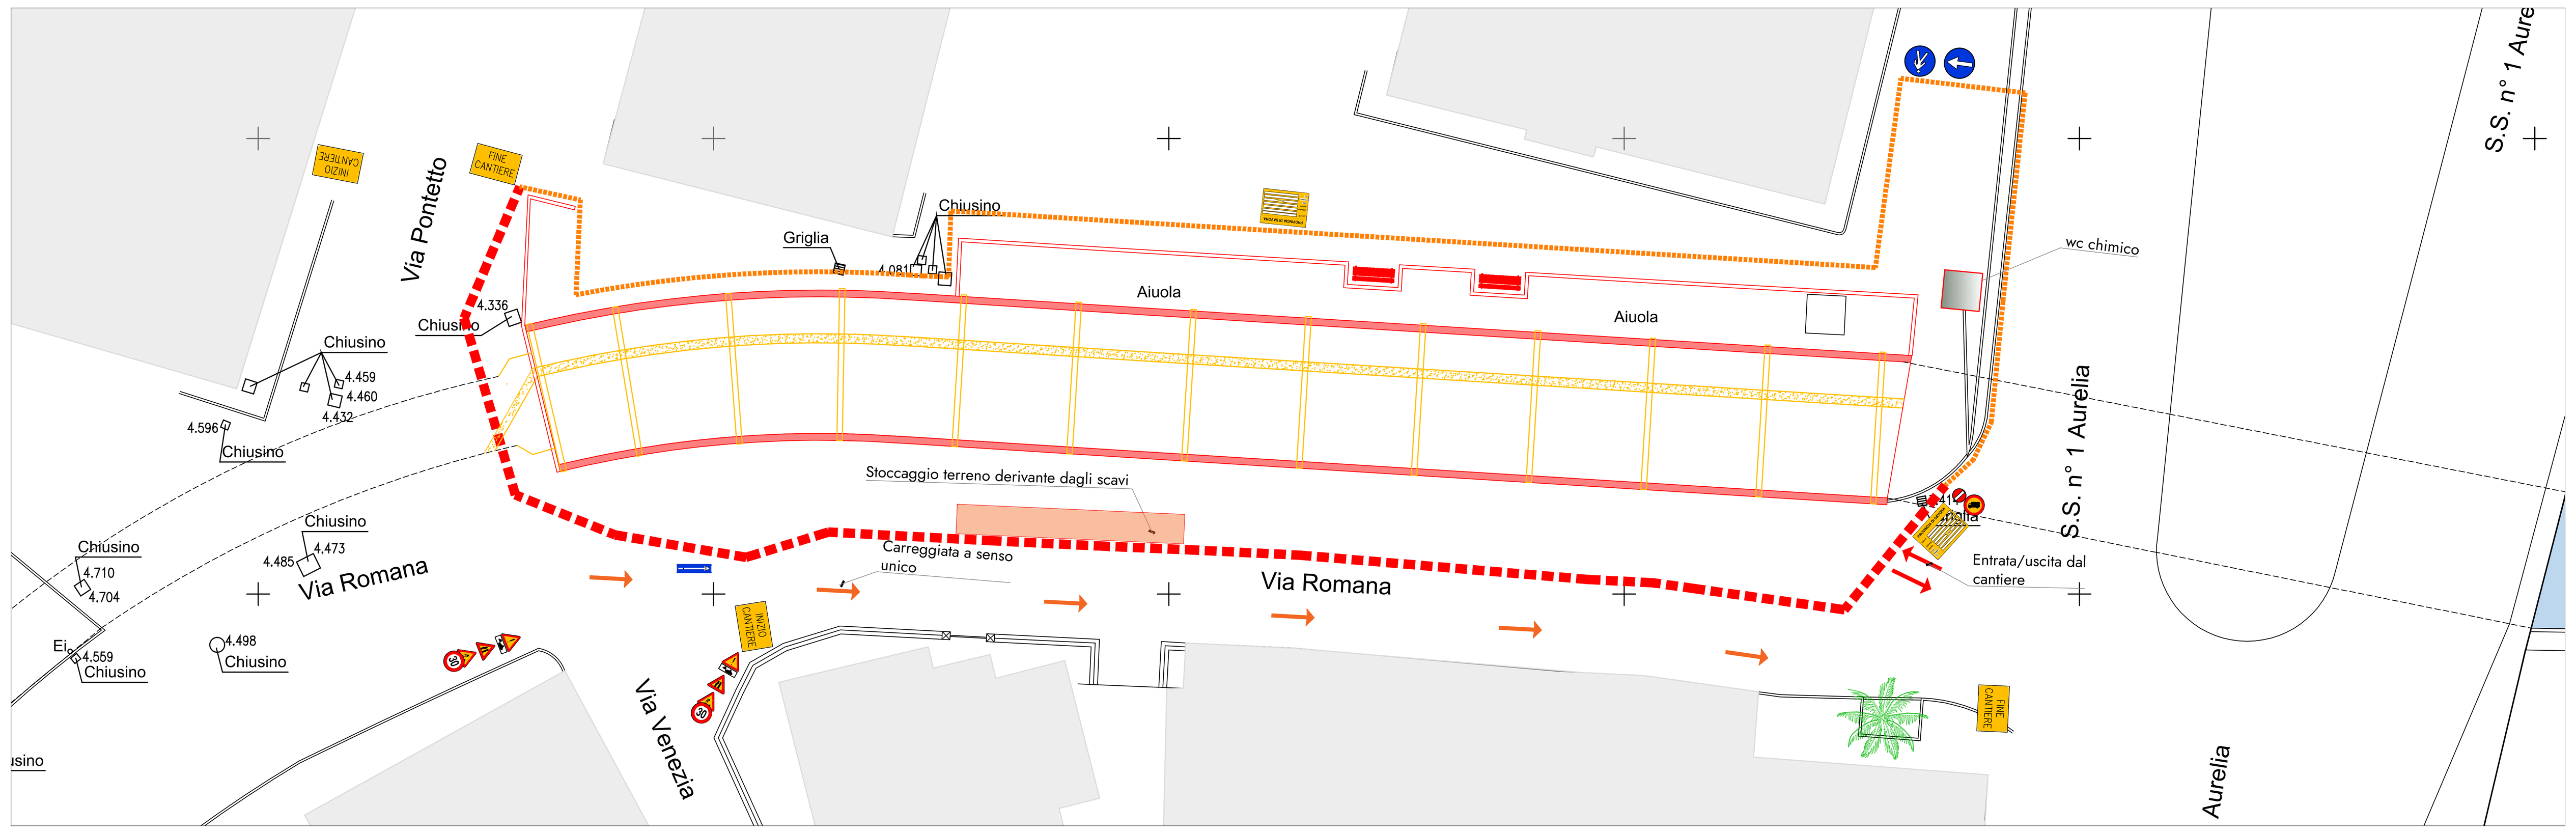

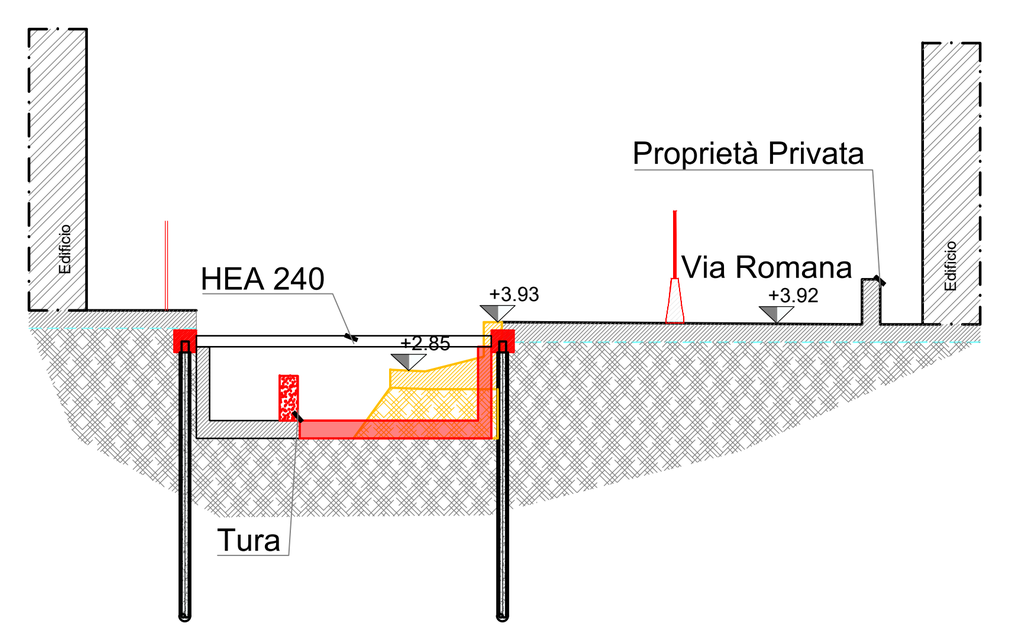


9. Realizzazione tura in modo da convogliare l'acqua in sponda sinistra;
10. Demolizione completa della struttura dell'alveo in sponda destra;
11. Scavo a cielo aperto fino al raggiungimento della quota fondo alveo richiesta da progetto;
12. Realizzazione soletta inferiore e parete sponda destra

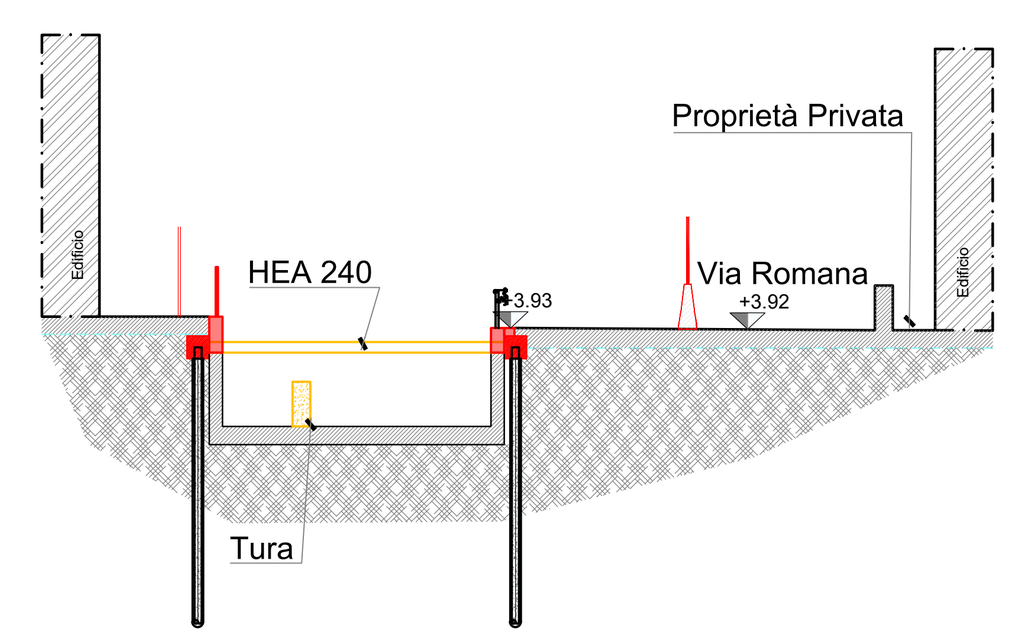

13. Rimozione puntoni di contrasto e tura;
14. Ultimazione pareti alveo e ripristino arredo urbano;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
Scala 1:500

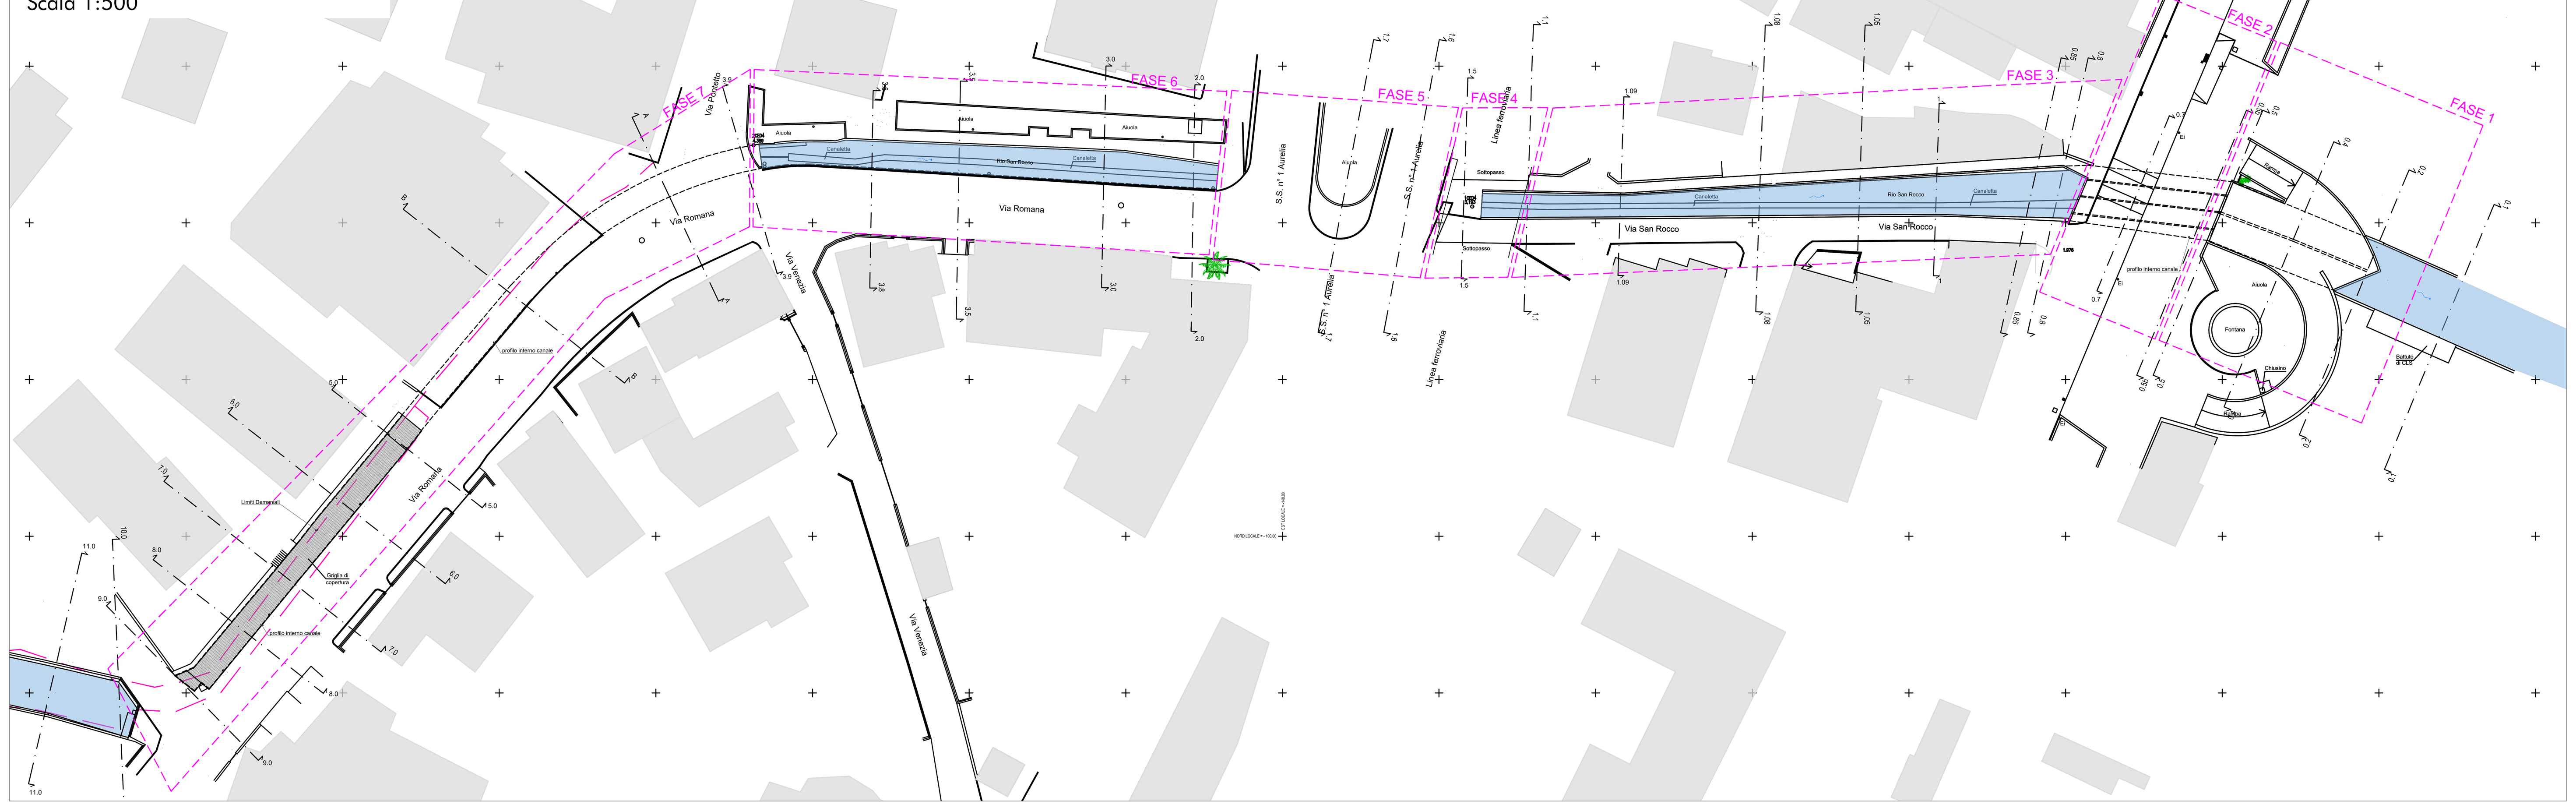

LEGENDA

- RECINZIONE METALLICA
- RECINZIONE NEW JERSEY
- PASSAGGIO PEDONALE

COMUNE DI CERIALE
PROVINCIA DI SAVONA

Committente: COMUNE DI CERIALE

Livello di progetto: DEFINITIVO

Titolo:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO SAN ROCCO

Tavola n°: LYT-011

Scala: 1:200 - 1:500

Oggetto:
CANTIERIZZAZIONE:
Fase 6

Codice Progetto: P107-21

Nome File: P107-21-D-DI-LYT-011-B

Firme:

Firmato digitalmente da
daniele guerrieri
CN = guerrieri daniele
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia
C = IT

Rev.	Modifiche / Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	SC -	21/04/2022	DG	21/04/2022
B	SECONDA EMISSIONE	SC -	18/05/2022	DG	18/05/2022
-	-	- -	-	-	-
-	-	- -	-	-	-

itec engineering
info@itec-engineering.it
www.itec-engineering.it
19038 SARZANA (SP) Via B. P. U. Muccini, 54 A TEL. +39 0187 610532
16129 GENOVA Via Antonio Cecchi, 7/9-10 TEL. +39 010 5959690

ASSOCIATO oice
apave Certification ISO 9001 - N° SC 10-2588/IAF 34 ISO 14001 - N° SCA 19-3491/IAF 34 ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento.
