ALLEGATO "A"

Comune di La Spezia
Provincia di La Spezia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Mitigazione rischio idraulico fosso Tombone in via delle Pianazze nel comune di La Spezia
COMMITTENTE: Comune della Spezia.

CANTIERE: via delle Pianazze , La Spezia (La Spezia)

La Spezia, 18/07/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(dott. Dal Degan Papik)

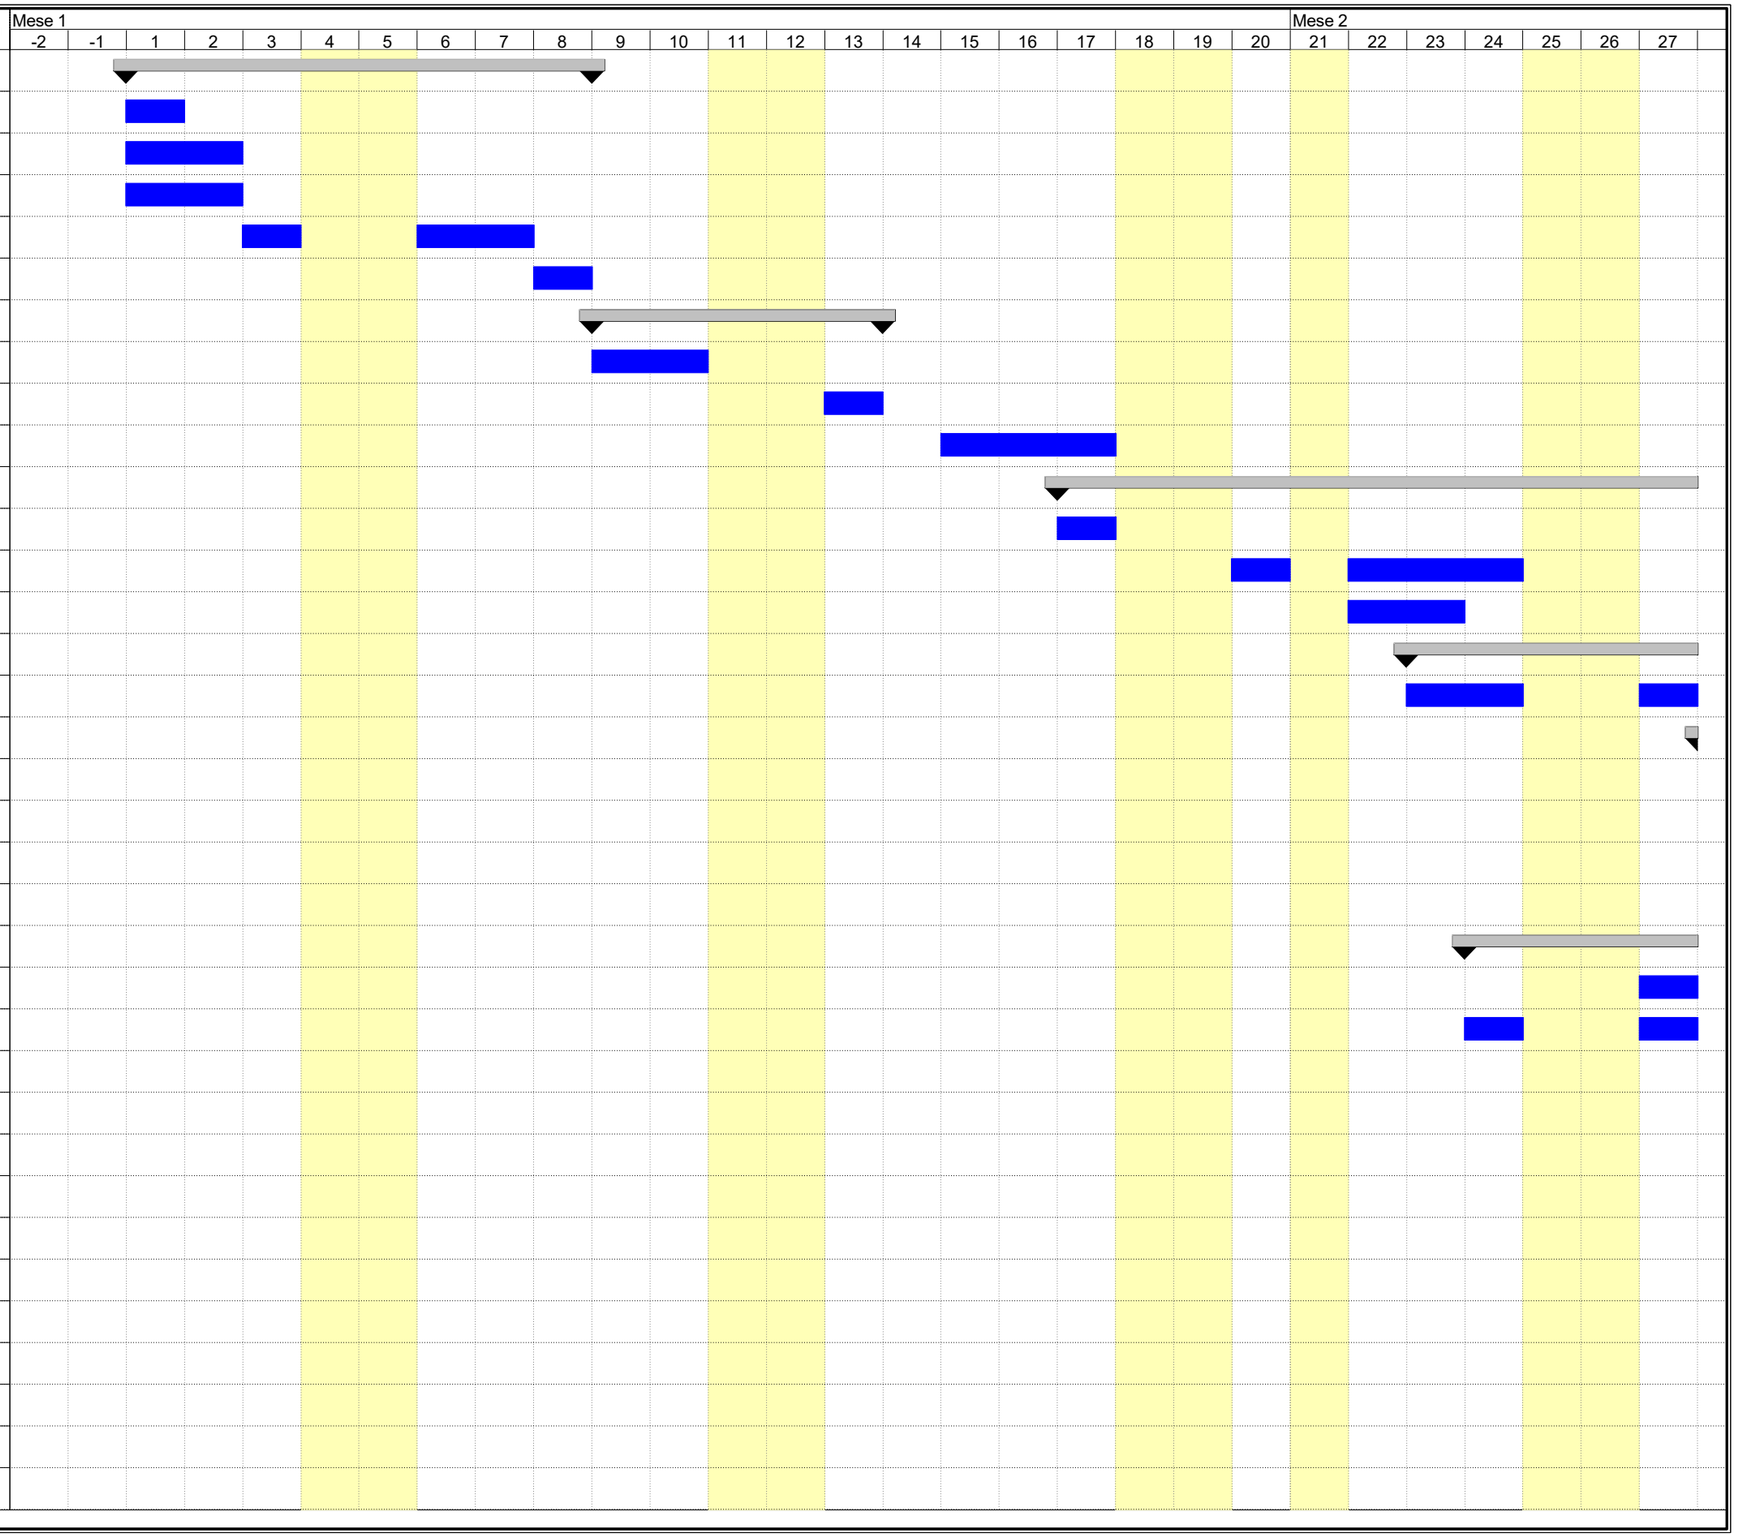
per presa visione

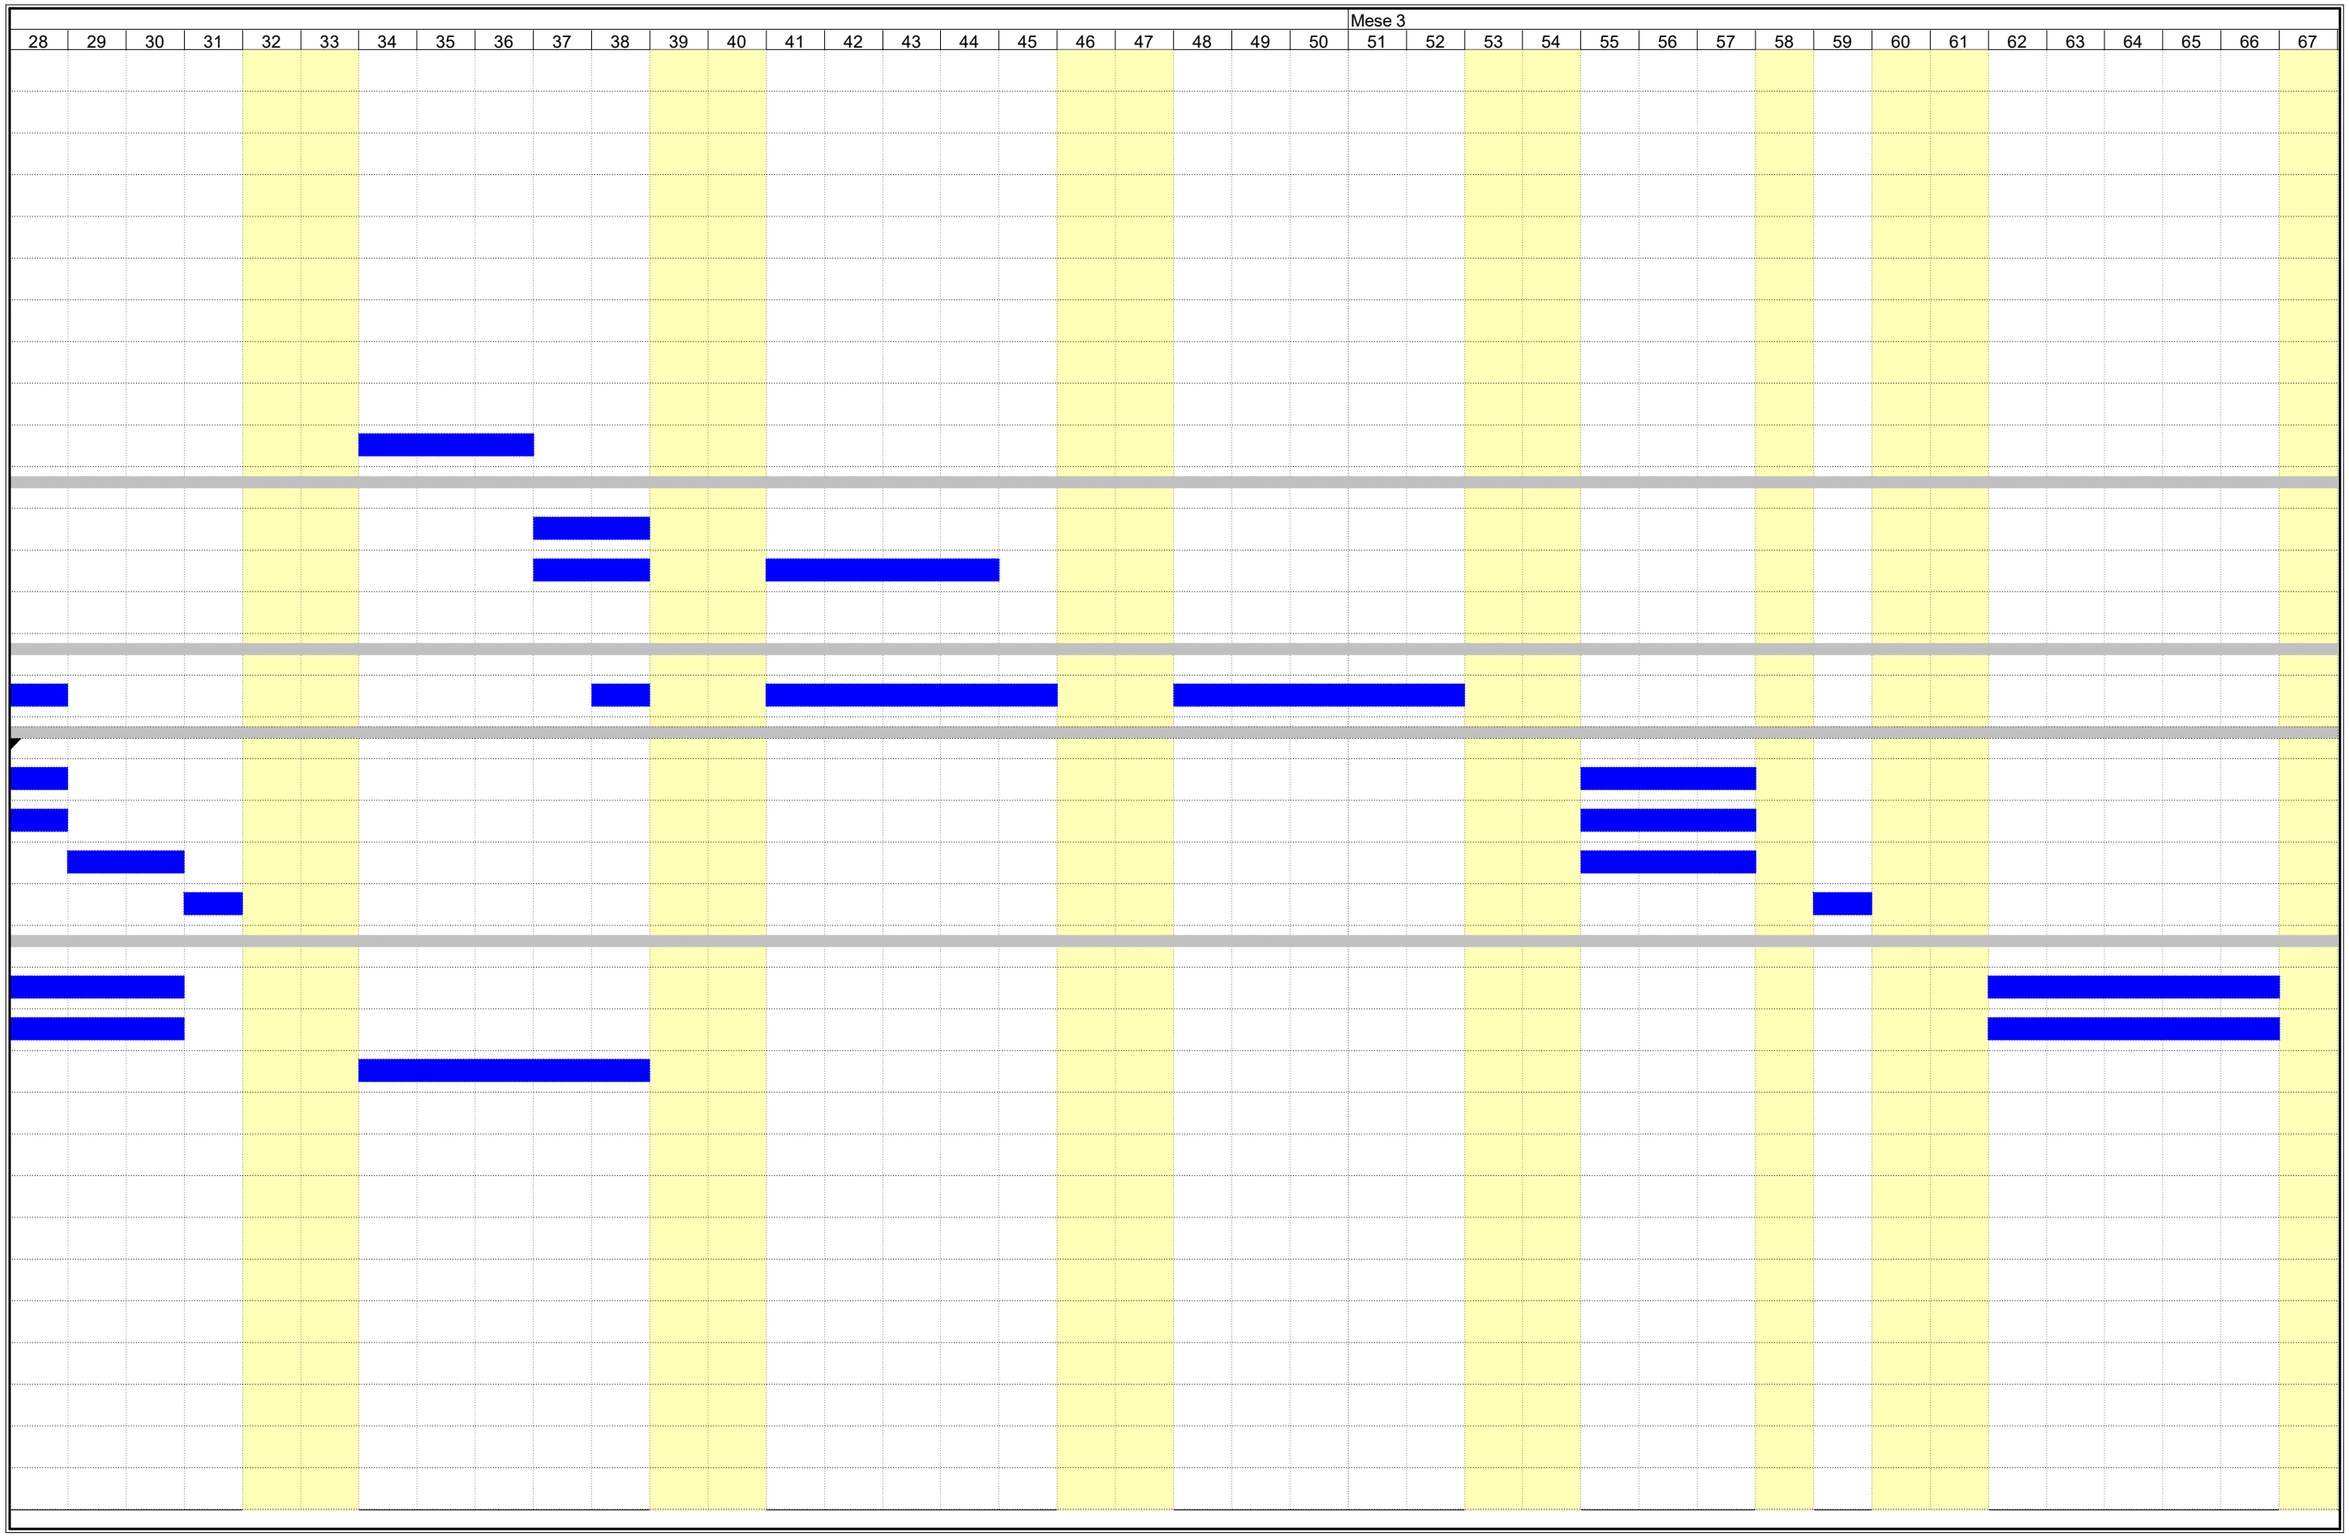
IL COMMITTENTE

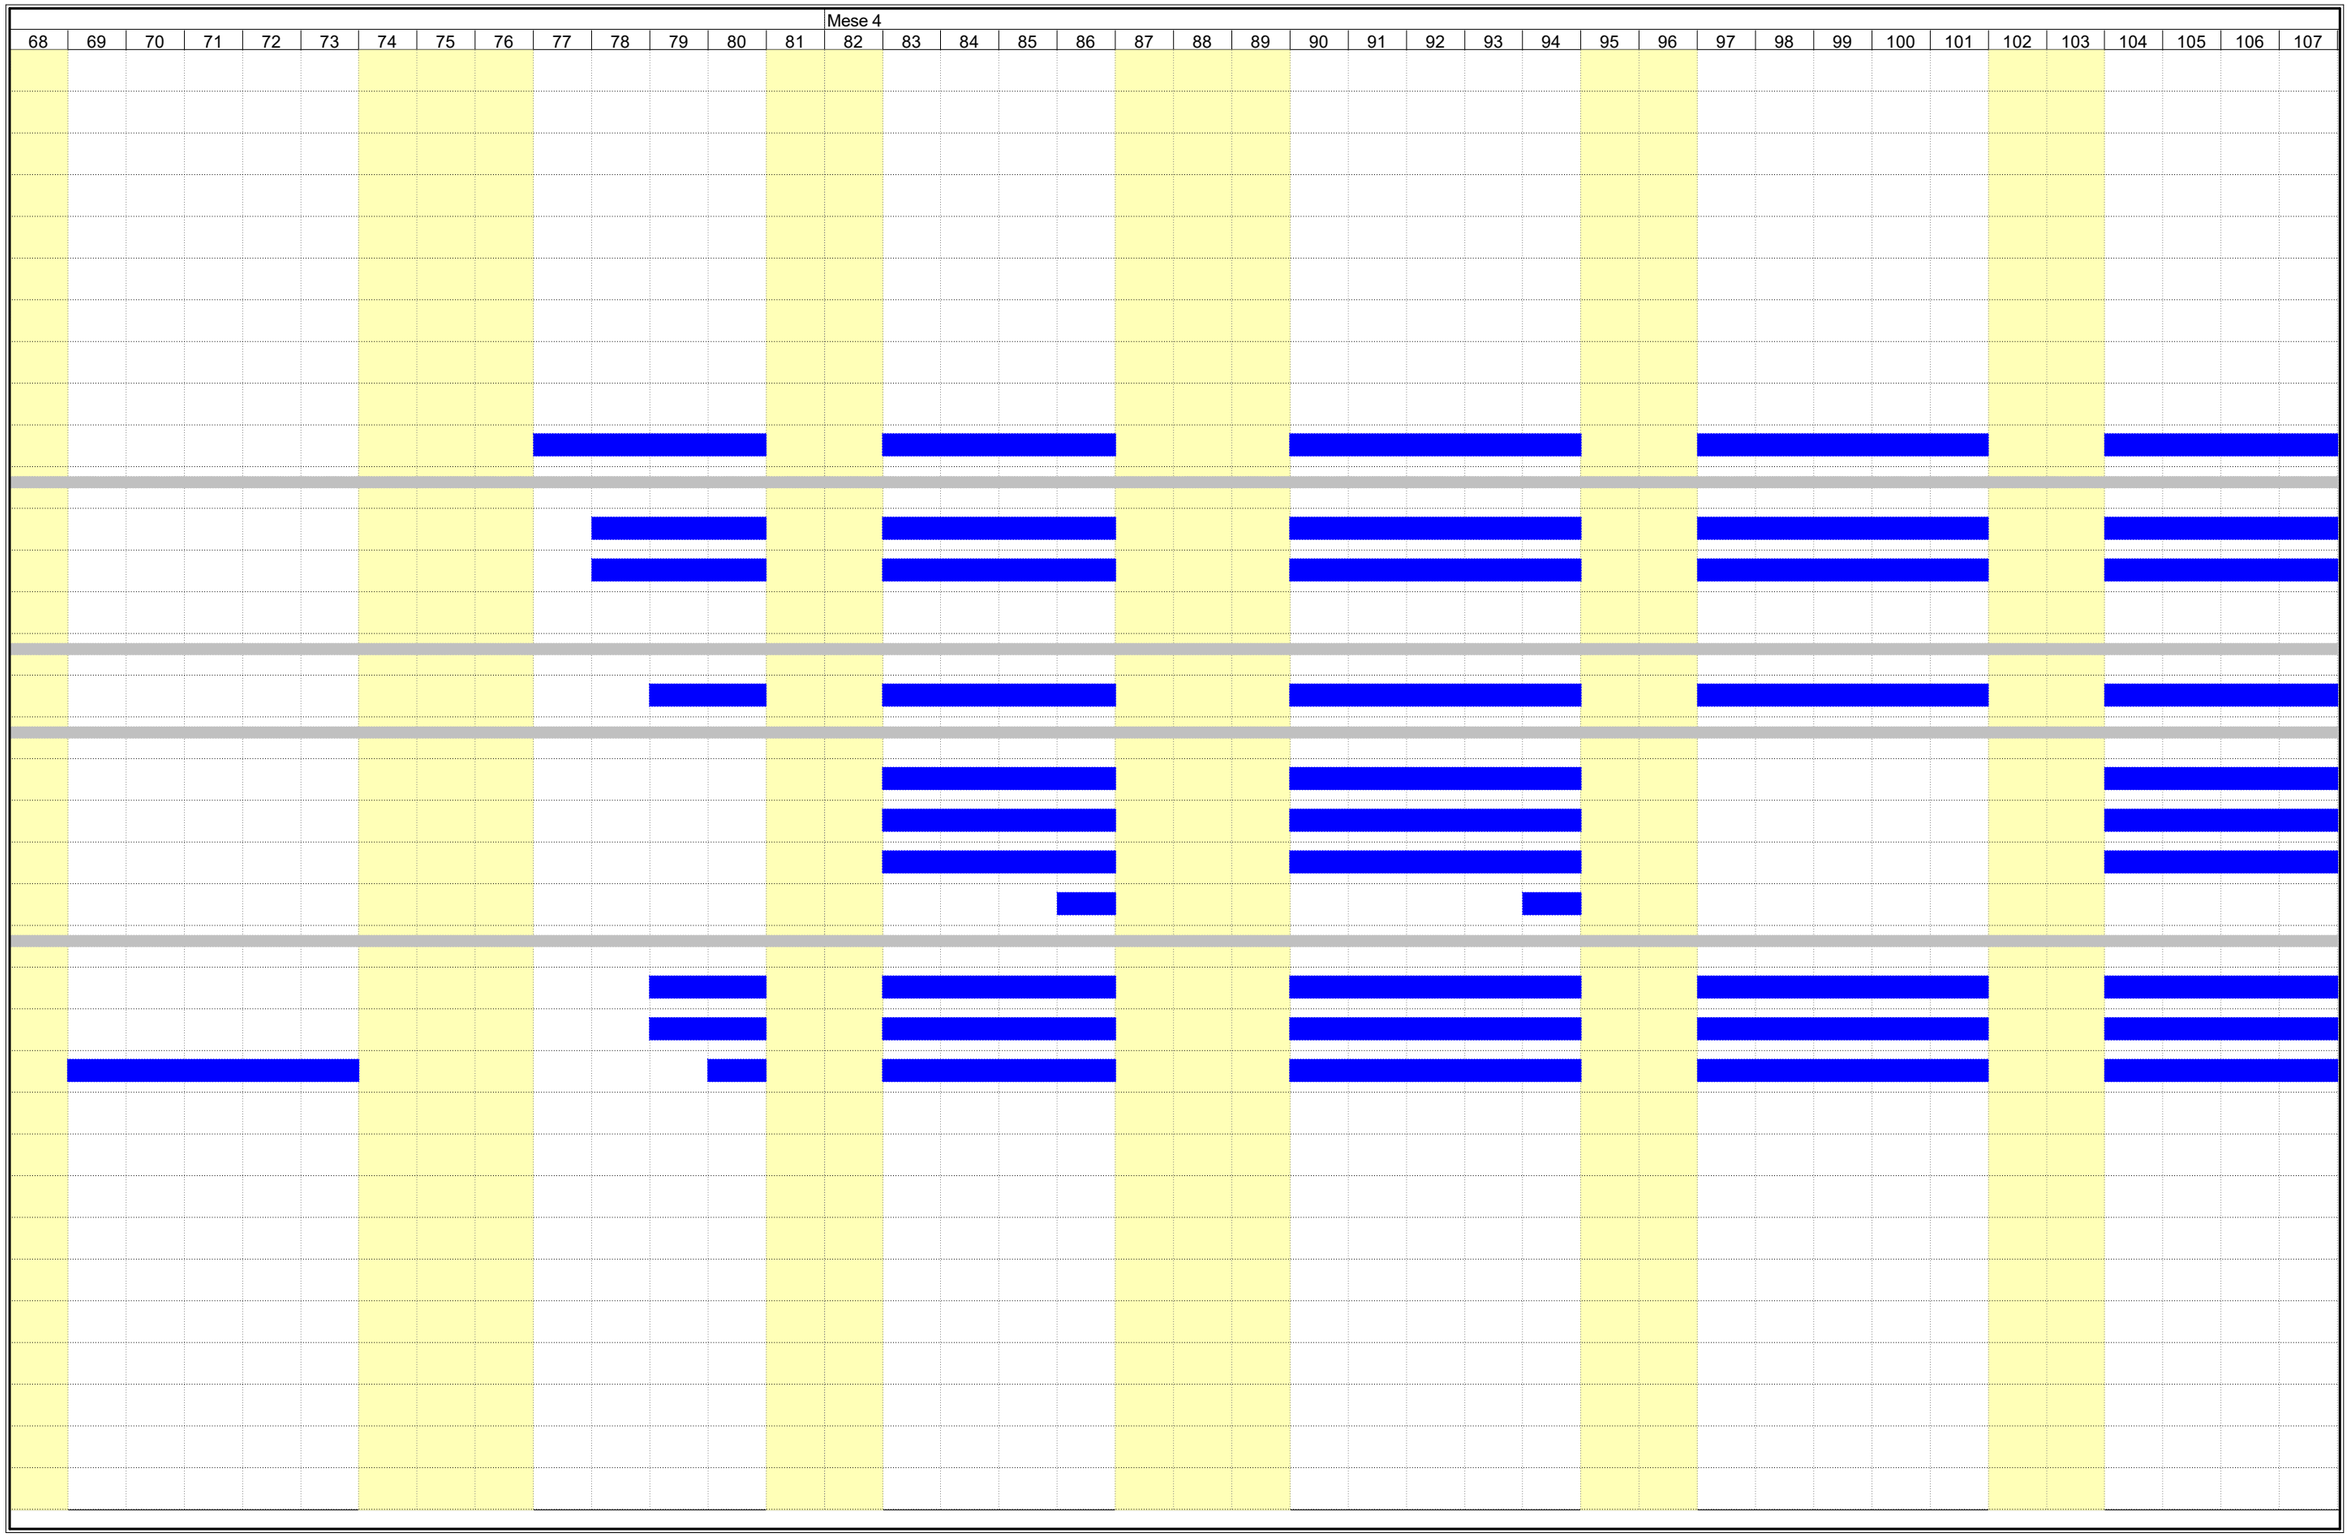
(Responsabile Unico del Procedimento Vujica dott. Ivan)

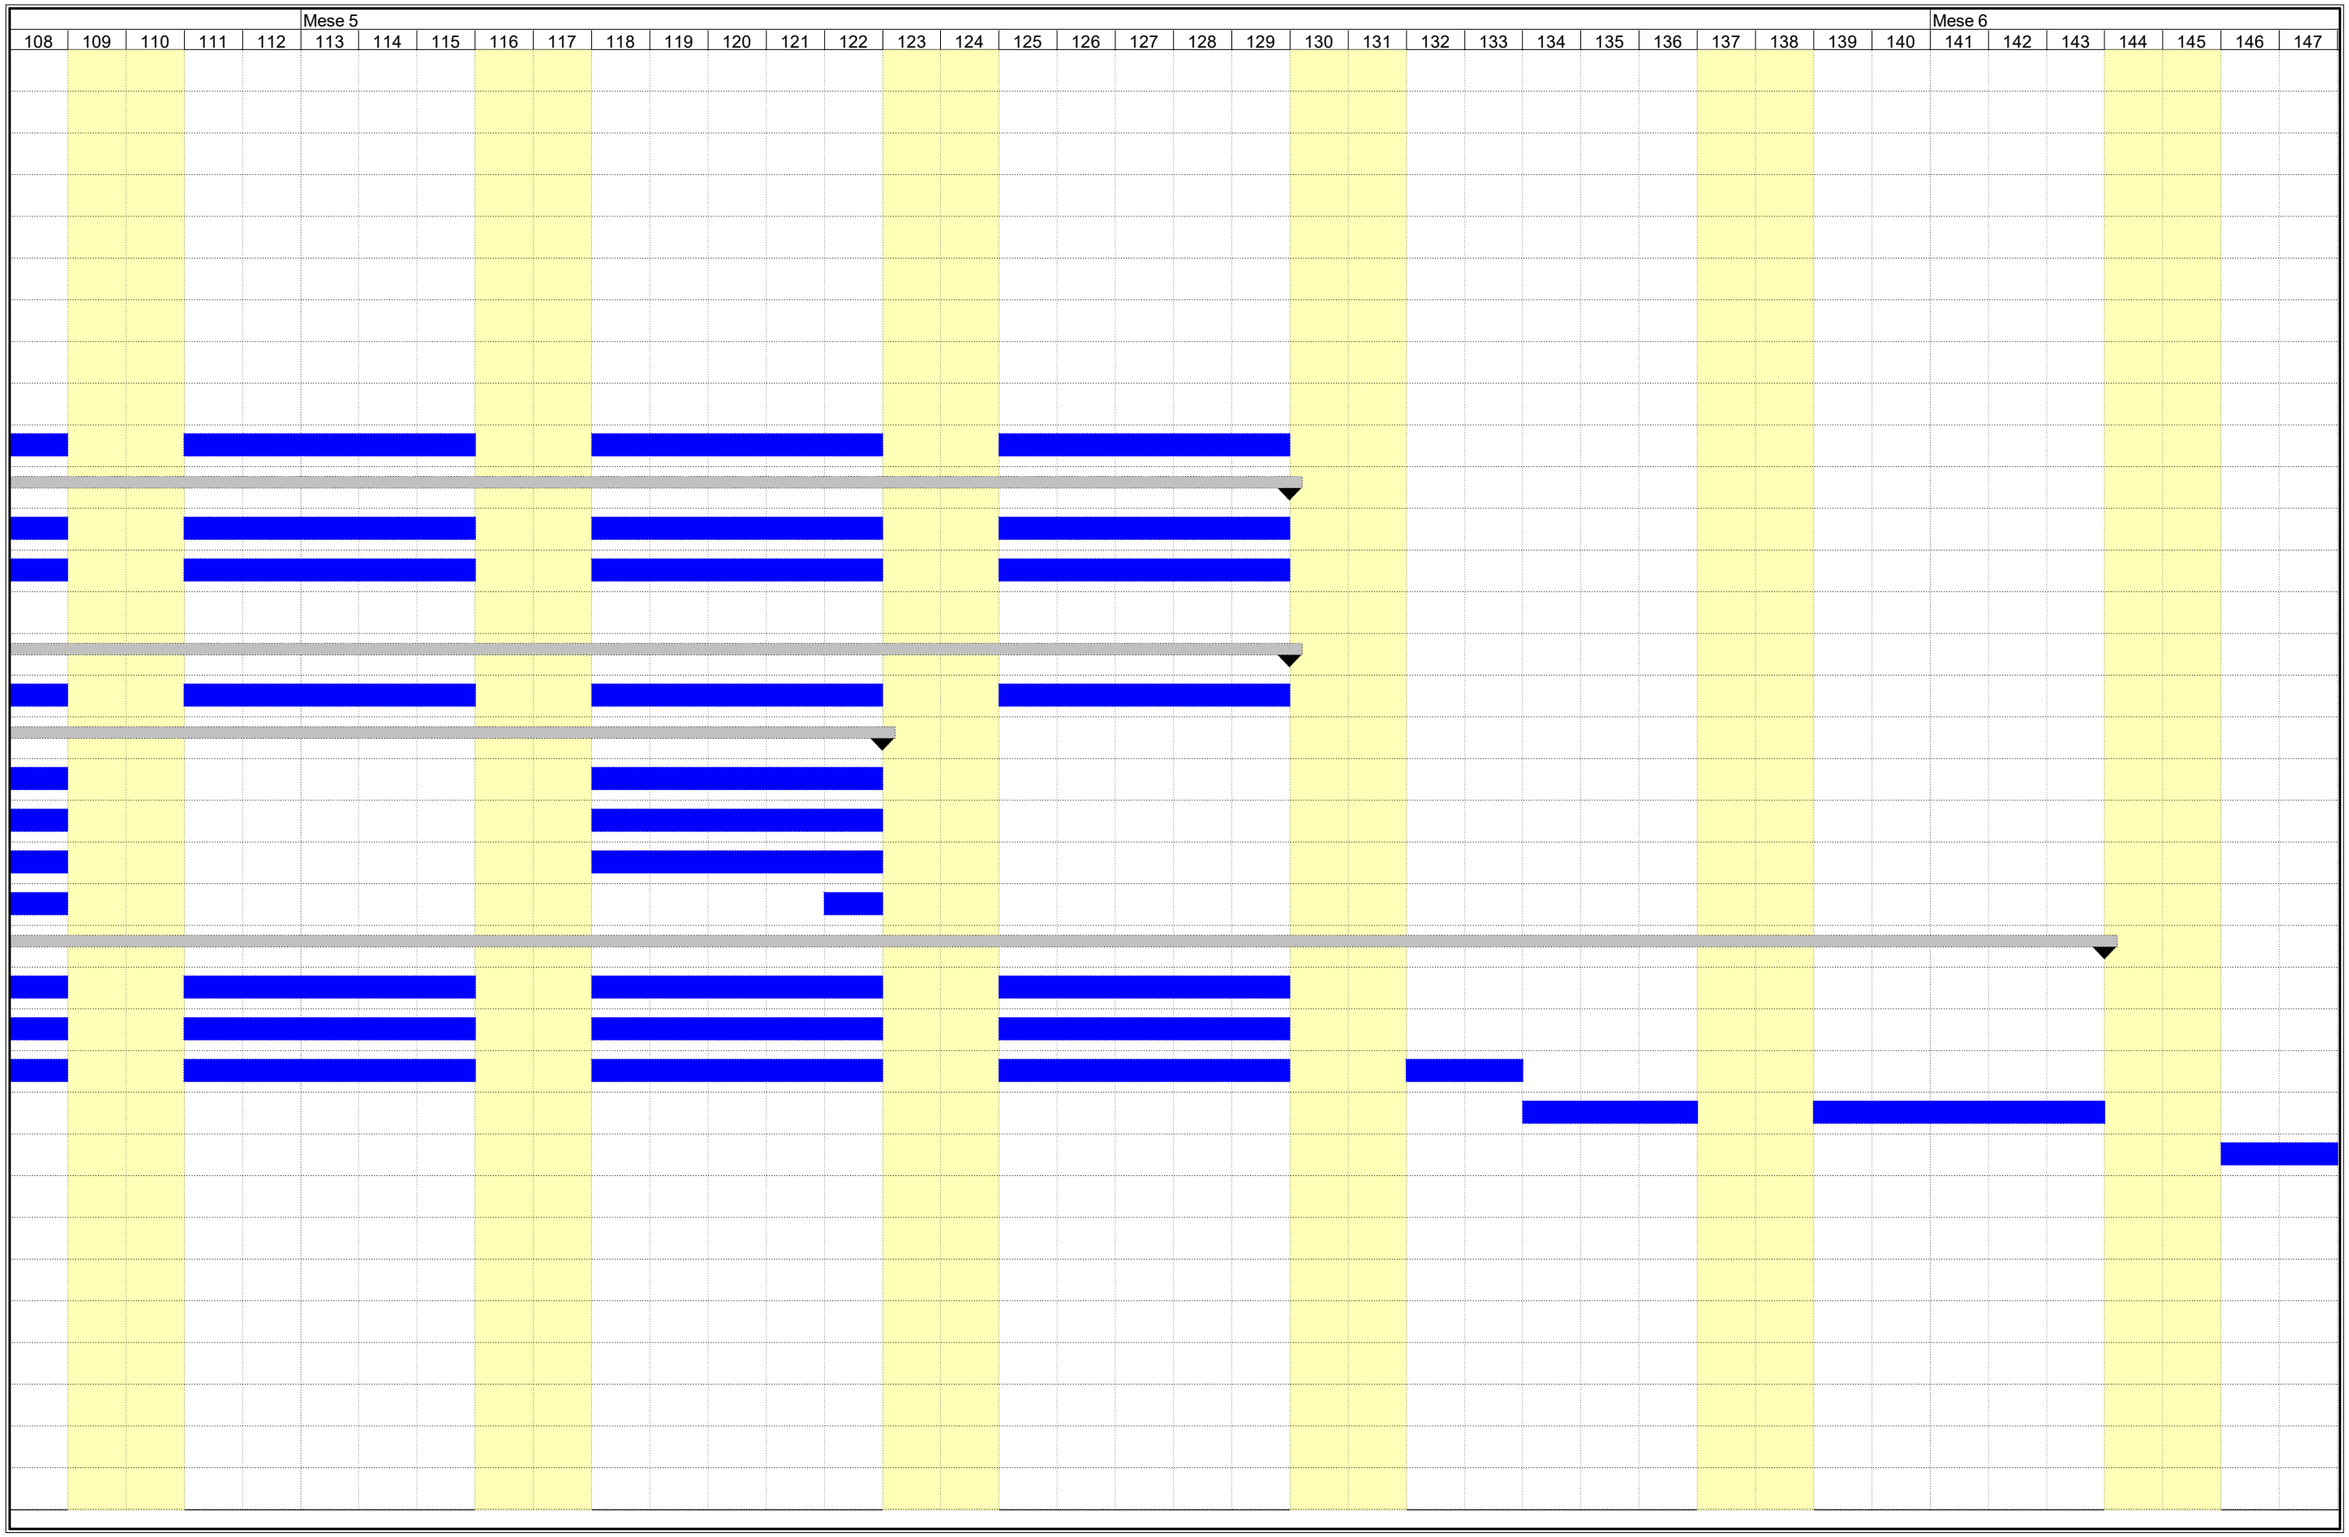
dott. Dal Degan Papik
via S. Ravecca 23
19123 La Spezia (La Spezia)
Tel.: 3441365716 - Fax: ------
E-Mail: papik@daldegan.me

Nome attività	Durata
Preparazione delle aree di cantiere	6 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g
Apprestamenti del cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	44 g
Rimozione asfalto e scavo	77 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	40 g
Scavo a sezione ristretta	47 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g
Posa condutture	74 g
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giun	51 g
Opere d'arte	66 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	23 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	23 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	24 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g
Ripristino sede stradale	83 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	45 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	46 g
Formazione di fondazione stradale	47 g
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g
Smobilizzo del cantiere	3 g




Mese 3
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Mese 4
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107


Mese 5
Mese 6
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

																								Mese 7																	
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
