AREA VOLTRI

CRONOPROGRAMMA CANTIERE ZONA VOLTRI

FASE	LAVORAZIONE	DURATA
0	**Cantierizzazione Voltri**	5 gg
1	**Preparazione aree operative**	240 gg
	ORMEGGIO	
	CARICO E SCARICO PERSONALE, MEZZI E MATERIALI	
	DISORMEGGIO	
2	**Realizzazione del sperone di fondazione (WTG 17-20)**	60 gg
	REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DELLO SPERONE	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
3	**Realizzazione del collegamento Aereogeneratore-diga (WTG 1-16)**	65 gg
	ESECUZIONE DEI FORI	
	REALIZZAZIONE DELL'INGHISAGGIO	
	REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI BASE	
	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
4	**Assemblaggi propedeutici (WTG 1-20)**	60 gg
	SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALE	
	ASSEMBLAGGIO TORRE	
	ASSEMBLAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
5	**Realizzazione Cabina di trasformazione (WTG 1-16+1)**	51 gg
	STRUTTURE VERTICALI	
	COPERTURA	
	IMPERMEABILIZZAZIONE	
6	**Realizzazione Cavidotto su diga (WTG 1-20)**	65 gg
	REALIZZAZIONE DEL MURETTO LATERALE	
	POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI POZZETTI	
	PASSAGGIO CAVI	
	GETTO DI CHIUSURA	
7	**Montaggio torre su diga (WTG 1-20)**	30 gg
	MONTAGGIO ELEMENTO BASE TORRE	
	MONTAGGIO 2° ELEMENTO TORRE	
8	**Montaggio aereogenarori su diga (WTG 1-20)**	40 gg
	ORMEGGIO	
	MONTAGGIO 3° ELEMENTO TORRE	
	MONTAGGIO NAVICELLA-ROTORE	
	DISORMEGGIO	
9	**Realizzazione Cabina di attraversamento (I2-I3)**	8 gg
	CAVIDOTTO DI ATTRAVERSAMENTO	
	PASSAGGIO CAVI E CHIUSURA CAVIDOTTO	
	STRUTTURE DI FONDAZIONE	
	SETTO DI PROTEZIONE IN CA	
	REALIZZAZIONE DEL "CAVIDOTTO" DI DISCESA	
	POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
10	**Realizzazione del cavidotto Sub-portuale I2-I3**	42 gg
	SCAVO DELLA TRINCEA	
	PASSAGGIO CAVI	
	REINTERRO E CHIUSURA DELLO SCAVO	
11	**Realizzazione del cavidotto di allacciamento**	91 gg
	SCAVO DELLA TRINCEA	
	REALIZZAZIONE DEL CASSONETTO IN CLS	
	POSA E FISSAGGIO DEI POZZETTI	
	PASSAGGIO CAVI	
	REINTERRO E CHIUSURA DELLO SCAVO	
12	**Realizzazione della cabina di consegna**	10 gg
	OPERE CIVILI	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
	OPERE IMPIANTISTICHE	
	FINITURE	
13	**Elettrificazione**	60 gg
14	**Commissioning**	60 gg

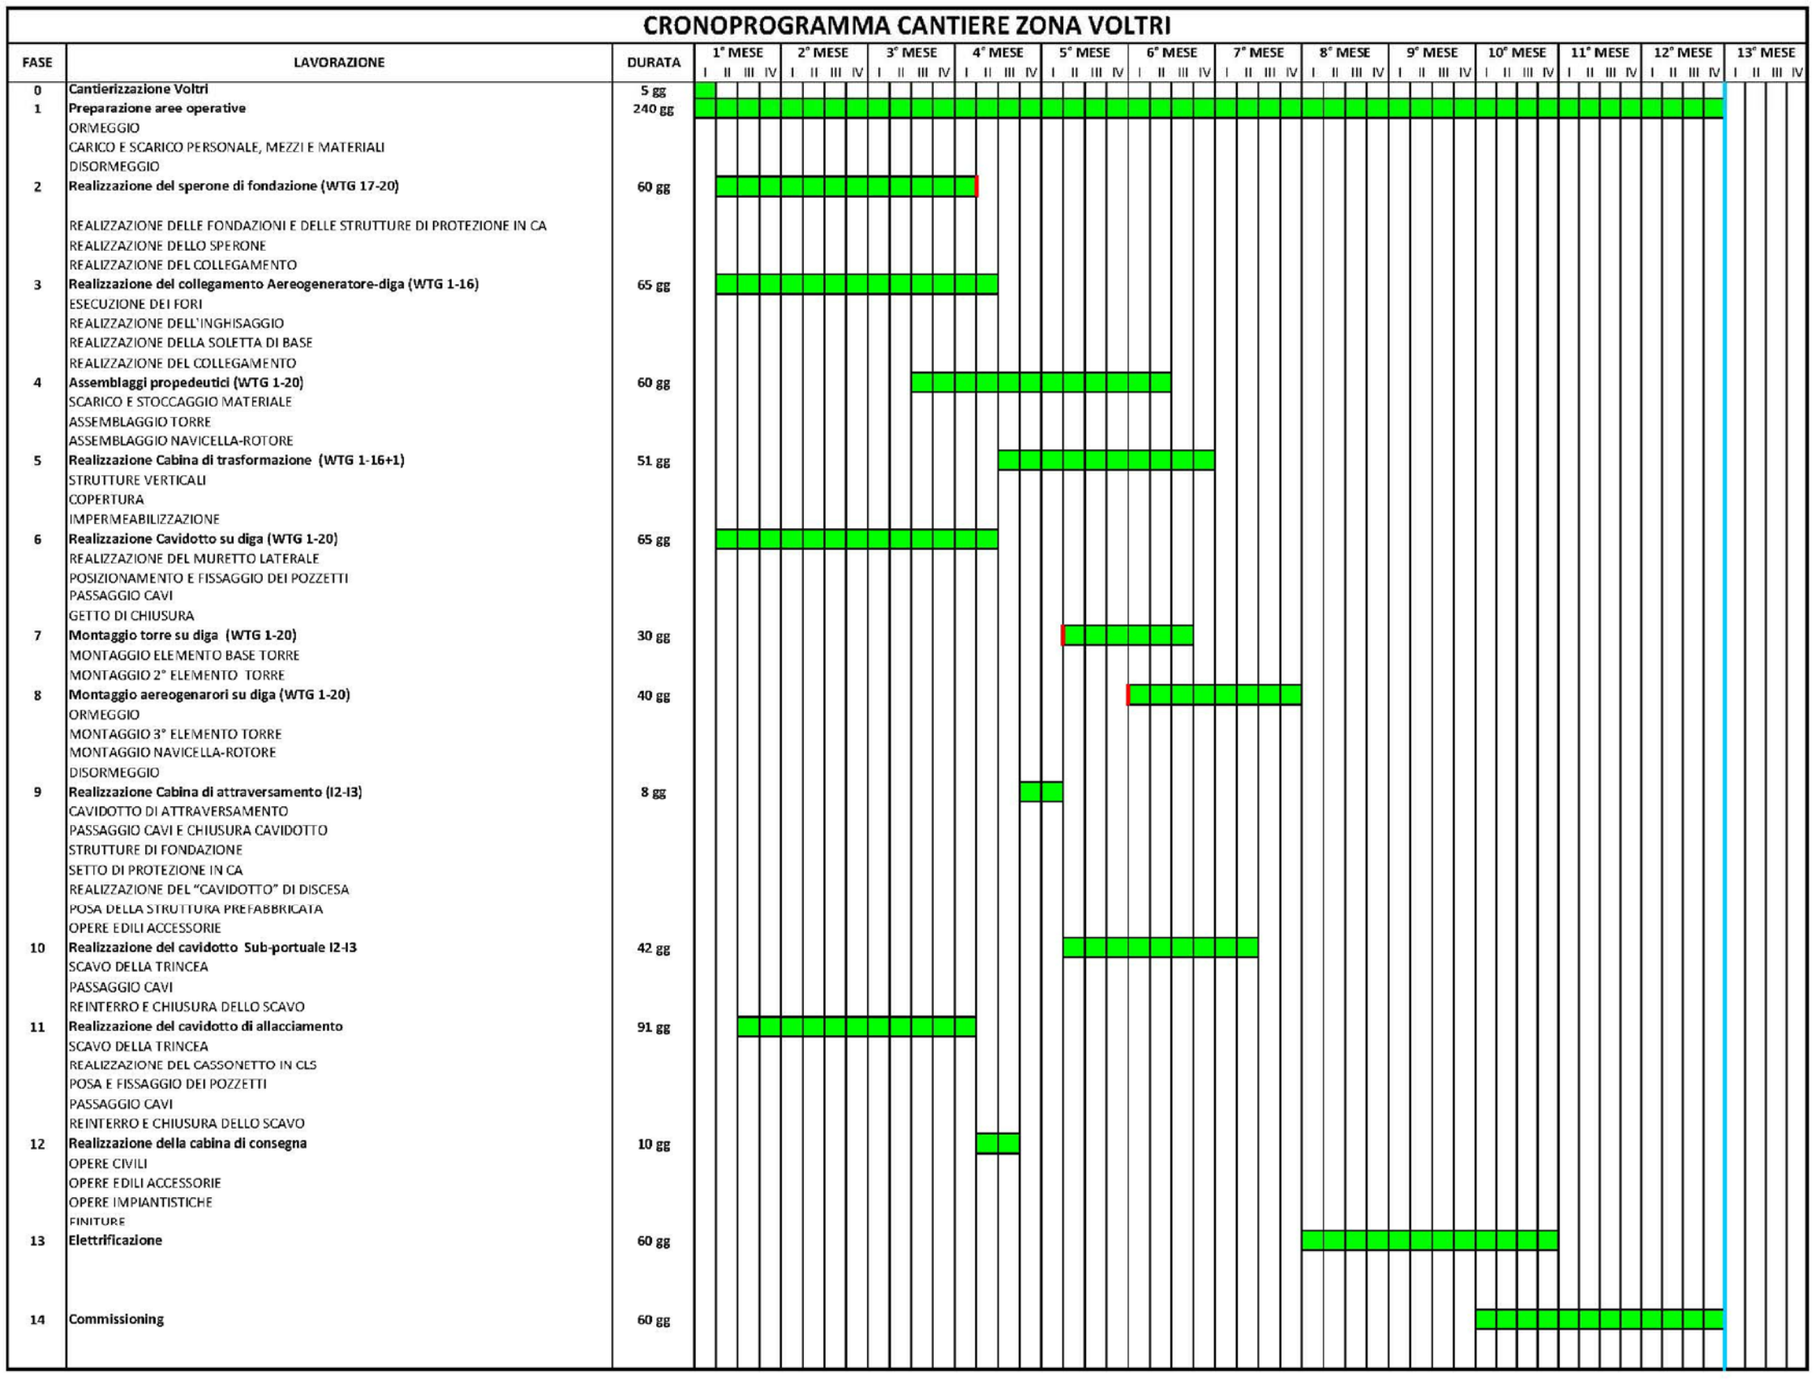


FIGURA 7.2c

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
