
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SURITE DEL CUCULO" NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE e SAVONA

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Inizio Lavori**	1 g?	18 feb	18 feb
2	**Sondaggi Geognostici**	3 g	19 feb	23 feb
3	**Analisi di Laboratorio**	15 g	24 feb	15 mar
4	**Relazione Geologica**	6 g?	16 mar	23 mar
5	**Realizzazione Progetto Esecutivo delle fondazioni e cabina di consegna**	15 g?	24 mar	13 apr
6	**Consegna Genio Civile**	1 g?	14 apr	14 apr
7	**Deposito documentazione Genio Civile**	30 g	15 apr	26 mag
8	**Taglio alberi**	3 g	18 feb	22 feb
9	**Realizzazione piazzole, strade, scavi di fondazione**	20 g	23 feb	21 mar
10	**realizzazione plinto di fondazione WTG_01**	**20 g?**	**27 mag**	**23 giu**
11	realizzazione pali di fondazione	10 g	27 mag	09 giu
12	prove di carico (sui primi pali gettati)	1 g?	10 giu	10 giu
13	getto magrone	1 g?	10 giu	10 giu
14	Armatura plinto	8 g?	13 giu	22 giu
15	Getto Plinto	1 g?	23 giu	23 giu
16	**realizzazione plinto di fondazione WTG_02**	**20 g?**	**27 mag**	**23 giu**
17	realizzazione pali di fondazione	10 g	27 mag	09 giu
18	prove di carico (sui primi pali gettati)	1 g?	10 giu	10 giu
19	getto magrone	1 g?	10 giu	10 giu
20	Armatura plinto	8 g?	13 giu	22 giu
21	Getto Plinto	1 g?	23 giu	23 giu
22	**Realizzazione cabina MT di consegna**	15 g?	19 apr	09 mag
23	**Posa Cavidotto**	15 g?	01 apr	18 apr
24	**Montaggio Strutturale Aerogeneratori**	12 g	27 lug	11 ago
25	**Montaggio Elettrico Aerogeneratori**	10 g?	12 ago	25 ago
26	**Commissioning Wind Farm**	10 g	23 set	06 ott
27	**Collaudo ENEL**	1 g?	10 mag	10 mag
28	**Primo parallelo**	1 g?	20 set	20 set
29	**Ripristino**	20 g	23 set	20 ott
30	**Entrata in Esercizio Wind Farm**	1 g?	07 ott	07 ott

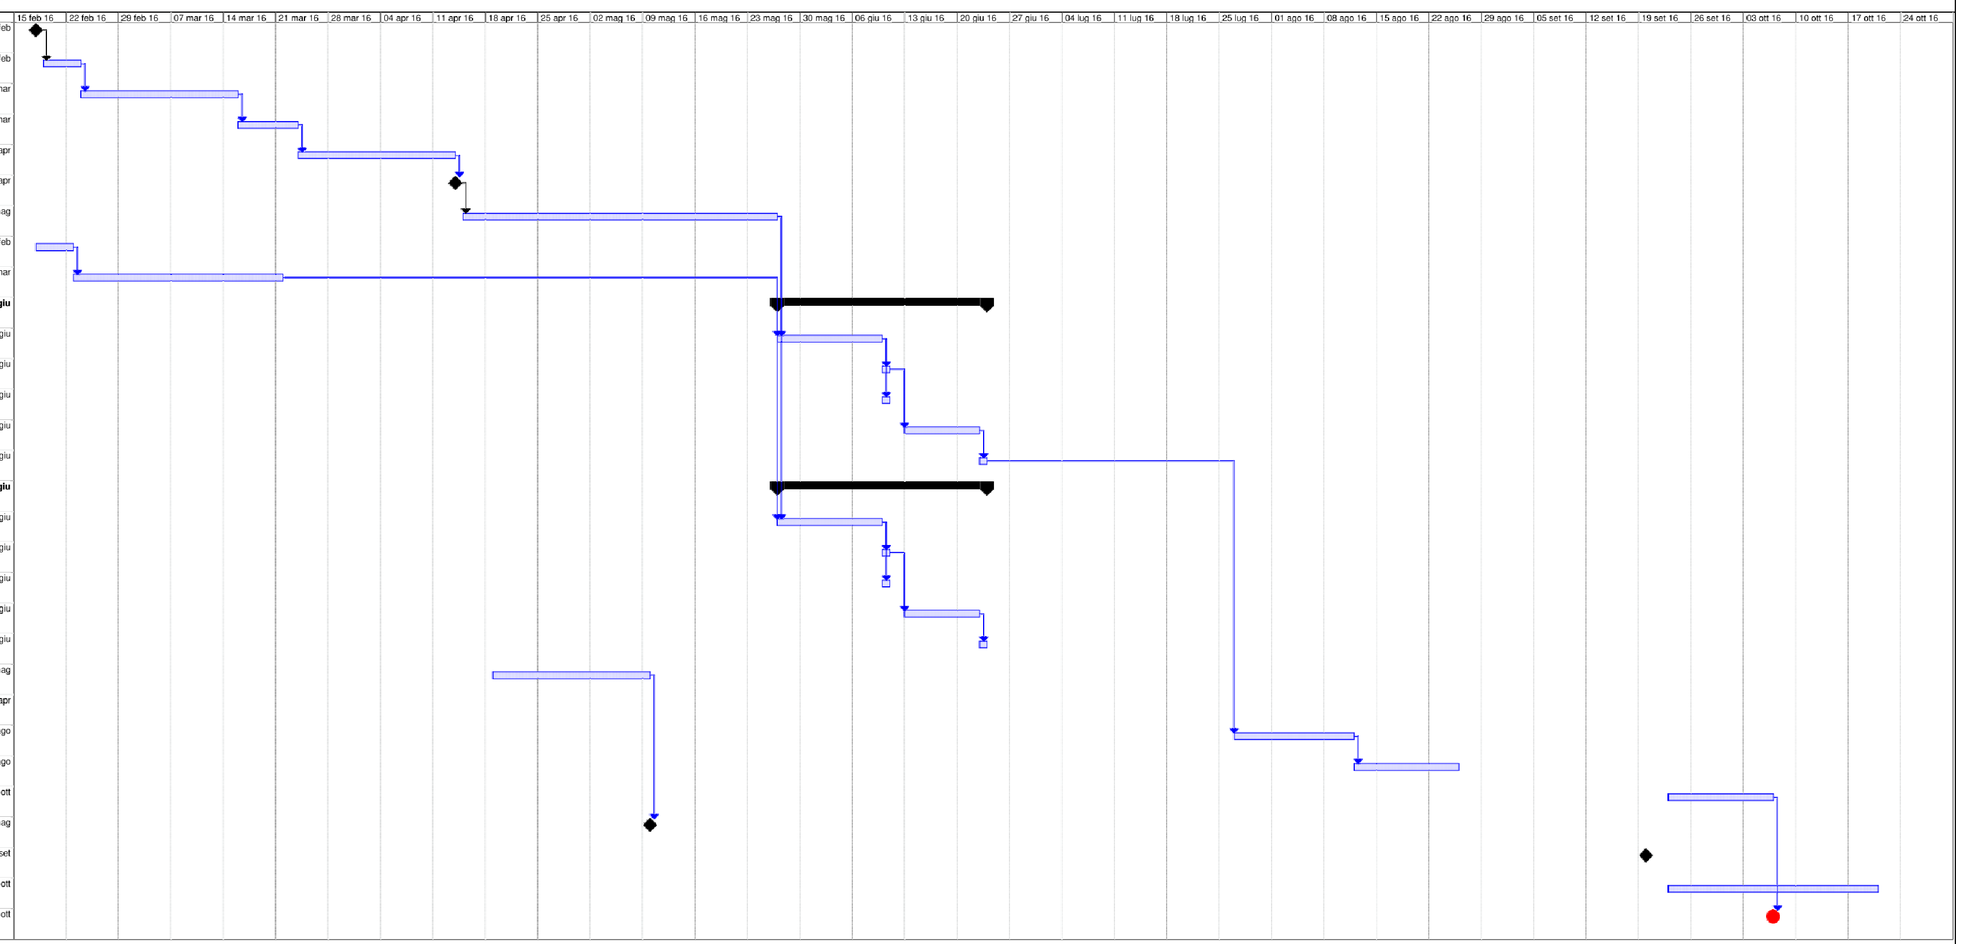

NOTA:
Le date sono del tutto indicative.
Il cronoprogramma mostra le tempistiche per le varie fasi esecutive considerando anche i tempi burocratici.

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di SAVONA

COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE

e SAVONA

SOIMAR ENERGY srl
Via Schina, 15
10143, TORINO (TO)
P.IVA: 10311390016

IMPIANTO/PLANT: CAIRO MONTENOTTE - SAVONA SURITE DEL CUCULO	PROGETTO/JOB: SEN-654
APPR./APPROVED: SNT	TITOLO/TITLE: Cronoprogramma delle fasi di realizzazione dell'Impianto
CONTR./CHECKED: SV	
DIS./DRAWN: SV	
DATA/DATE: 23/03/2015	DISEGNO/DRAWING N.: TAV.120 — REV.: 1
SIZE: A1	
DOC./FILE.: -	FOGLIO/SHEET N.: 1 DI/OF N.: 1 — SCALA/SCALE: -

La SOIMAR ENERGY s.r.l. riserva la proprieta' di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta
All rights reserved to SOIMAR ENERGY s.r.l. reproduction and transfer of this drawing to thirds are not allowed unless previous written authorization
