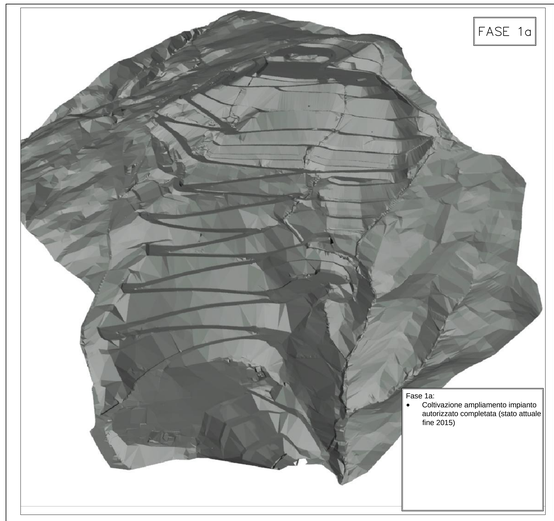
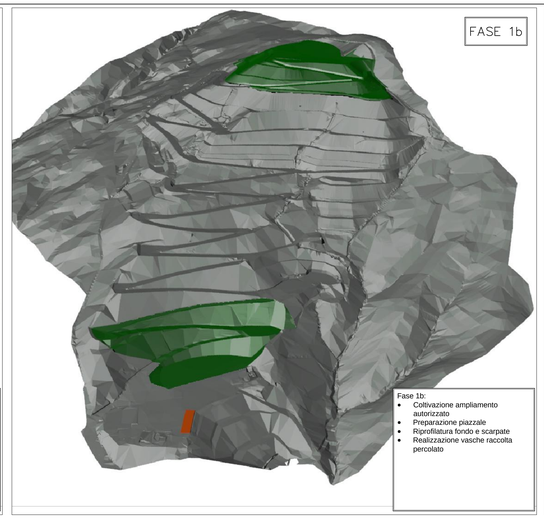
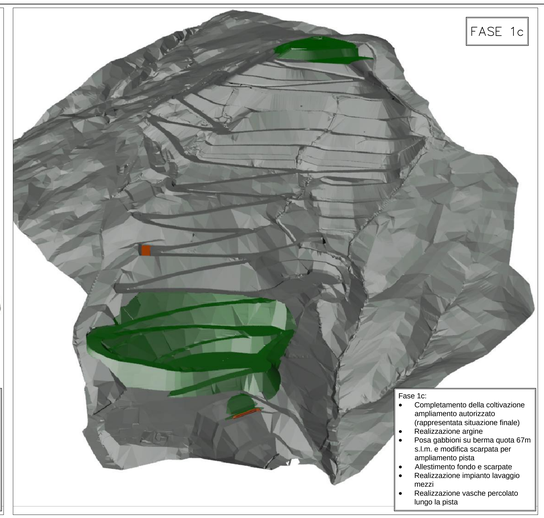


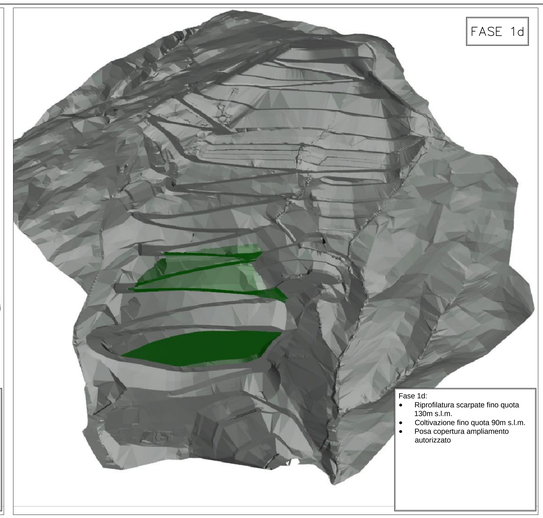

Fase 1a:
- Coltivazione ampliamento impianto autorizzato completata (stato attuale fine 2015)



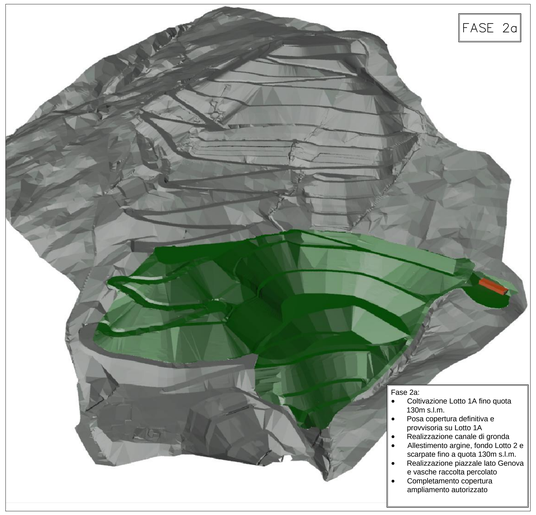

Fase 1b:
- Coltivazione ampliamento autorizzato
- Preparazione piazzale
- Riprofilatura fondo e scarpate
- Realizzazione vasche raccolta percolato



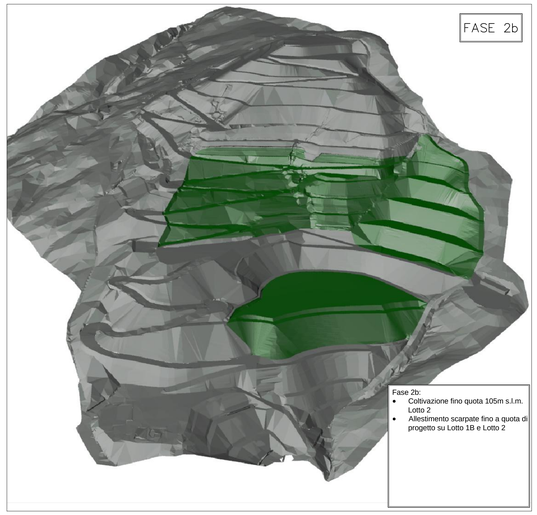

Fase 1c:
- Completamento della coltivazione ampliamento autorizzato (rappresentata situazione finale)
- Realizzazione argine
- Posa gabbioni su berma quota 67m s.l.m. e modifica scarpata per ampliamento pista
- Allestimento fondo e scarpate
- Realizzazione impianto lavaggio mezzi
- Realizzazione vasche percolato lungo la pista



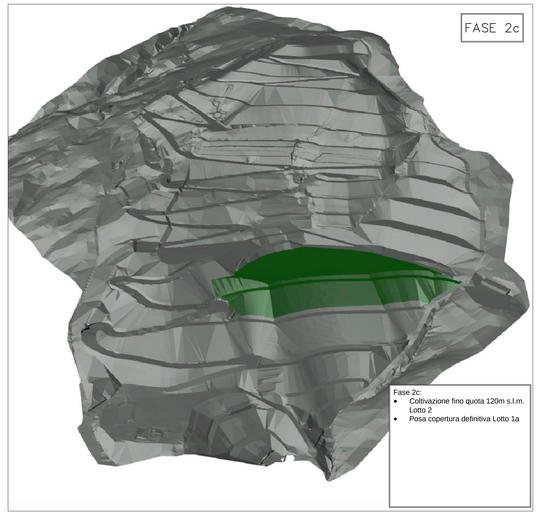

Fase 1d:
- Riprofilatura scarpate fino quota 130m s.l.m.
- Coltivazione fino quota 90m s.l.m.
- Posa copertura ampliamento autorizzato



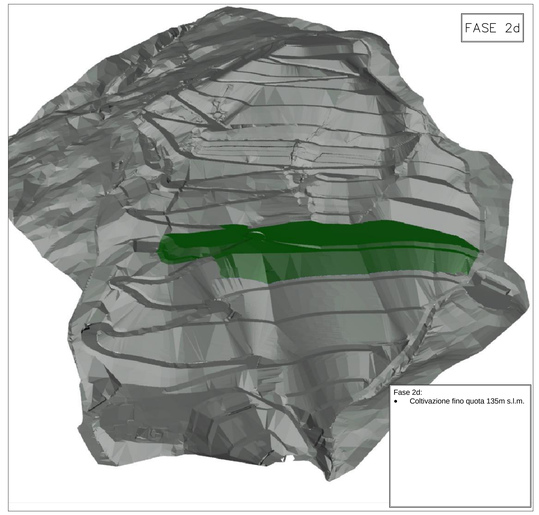

Fase 2a:
- Coltivazione Lotto 1A fino quota 130m s.l.m.
- Posa copertura definitiva e provvisoria su Lotto 1A
- Realizzazione canale di gronda
- Allestimento argine, fondo Lotto 2 e scarpate fino a quota 130m s.l.m.
- Realizzazione piazzale lato Genova e vasche raccolta percolato
- Completamento copertura ampliamento autorizzato



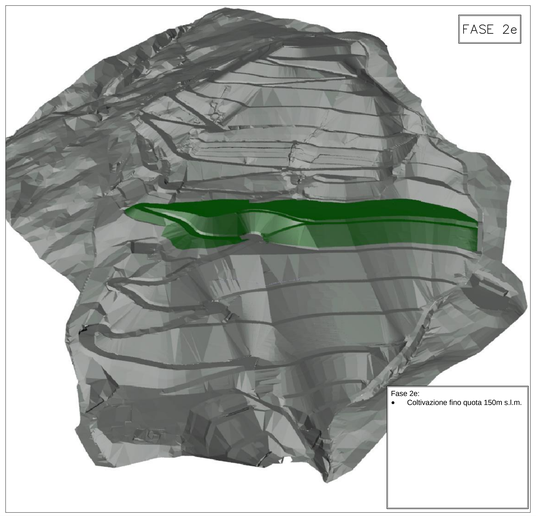

Fase 2b:
- Coltivazione fino quota 105m s.l.m. Lotto 2
- Allestimento scarpate fino a quota di progetto su Lotto 1B e Lotto 2



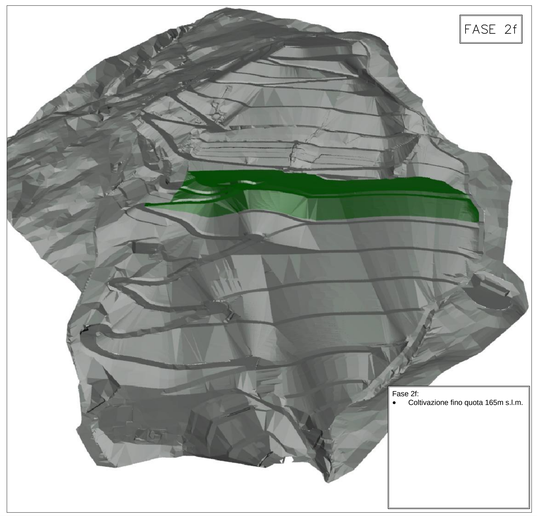

Fase 2c:
- Coltivazione fino quota 120m s.l.m. Lotto 2
- Posa copertura definitiva Lotto 1a



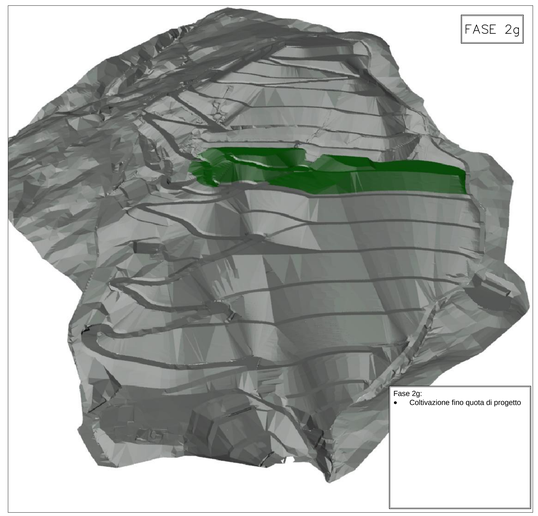

Fase 2d:
- Coltivazione fino quota 135m s.l.m.



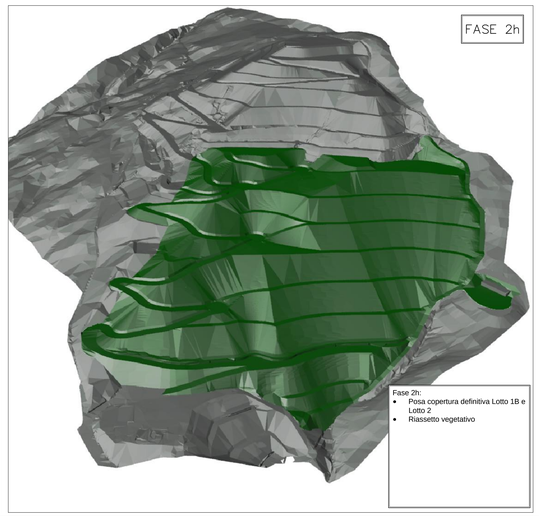

Fase 2e:
- Coltivazione fino quota 150m s.l.m.




Fase 2f:
- Coltivazione fino quota 165m s.l.m.




Fase 2g:
- Coltivazione fino quota di progetto




Fase 2h:
- Posa copertura definitiva Lotto 1B e Lotto 2
- Riassetto vegetativo

LEGENDA

AREA DI INTERVENTO

MANUFATTI DA REALIZZARE (VASCHE RACCOLTA PERCOLATO, IMPIANTO LAVAGGIO MEZZI, GABBIONI)

Note:
- La pista di coltivazione attuale e l'accesso alla zona di monte dell'impianto autorizzato dovranno essere mantenuti durante tutte le fasi di allestimento e coltivazione

Committente:

GRUPPO WASTEITALIA

Località:

COMUNE DI VADO LIGURE (SV)
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN LOCALITÀ BOSSARINO

Progetto:

AMPLIAMENTO LATO EST
INTEGRAZIONI PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato: FASI DI INTERVENTO

Numero elaborato: D26

Codice elaborato: 030-006 D026E01

Scala: -

| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 24.01.2017 | EMISSIONE | MATTEO CASTIGLIONI | Ing. MARALENA LACAPRA | Ing. STEFANO VEGGI |
| E02 | | | | | |
| E03 | | | | | |
| E04 | | | | | |

Progettista: Desmos Ingegneria Ambiente Energia

Timbro e firma:

Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l.
Ufficio: Via Piemonte,12 20141 Milano Tel. +39 023658750 Fax +39 023658751
Sede legale: Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano
E-mail: desmos@desmos.it - E-mail certificata: desmos.ing@pec.it
P.I. e C.F.: 09016150964 - REA: MI 2063052

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Reg.Dn-0454
