Regione Liguria	Comune Cairo Montenotte	Comune Savona	Provincia Savona
REGIONE LIGURIA			PAR PARIBVS

Parco eolico Pian del Melo - 9 MW

Cronoprogramma dei lavori

REL. 03

Progetto definitivo
Comuni Cairo Montenotte e Savona
Località Pian del Melo
Rev. 00 - Giugno 2025
Scala

Bissi Marco
04.08.2025
15:45:12
GMT+02:00

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

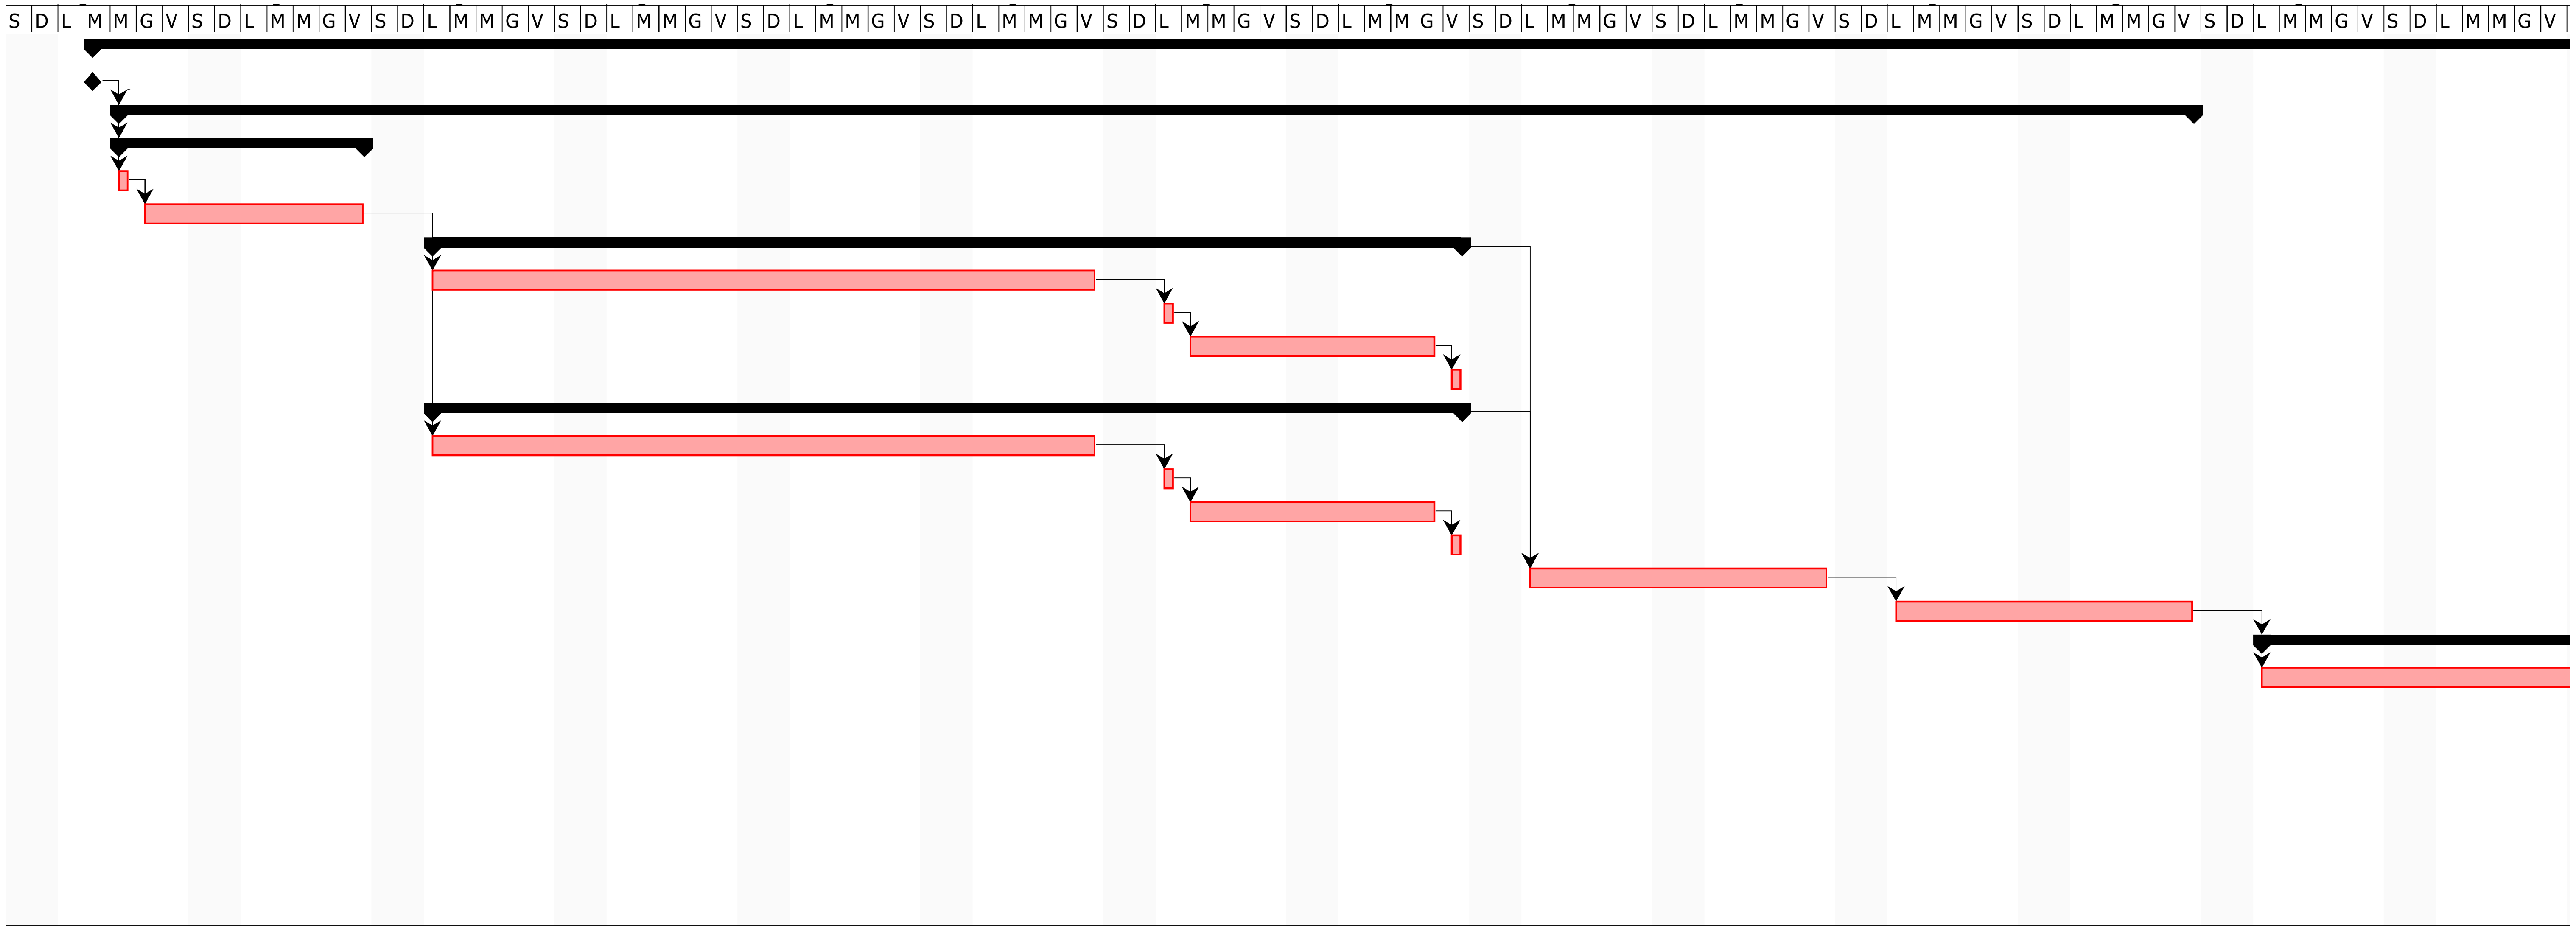
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1758 Dott. Ing. Daniele Pirra

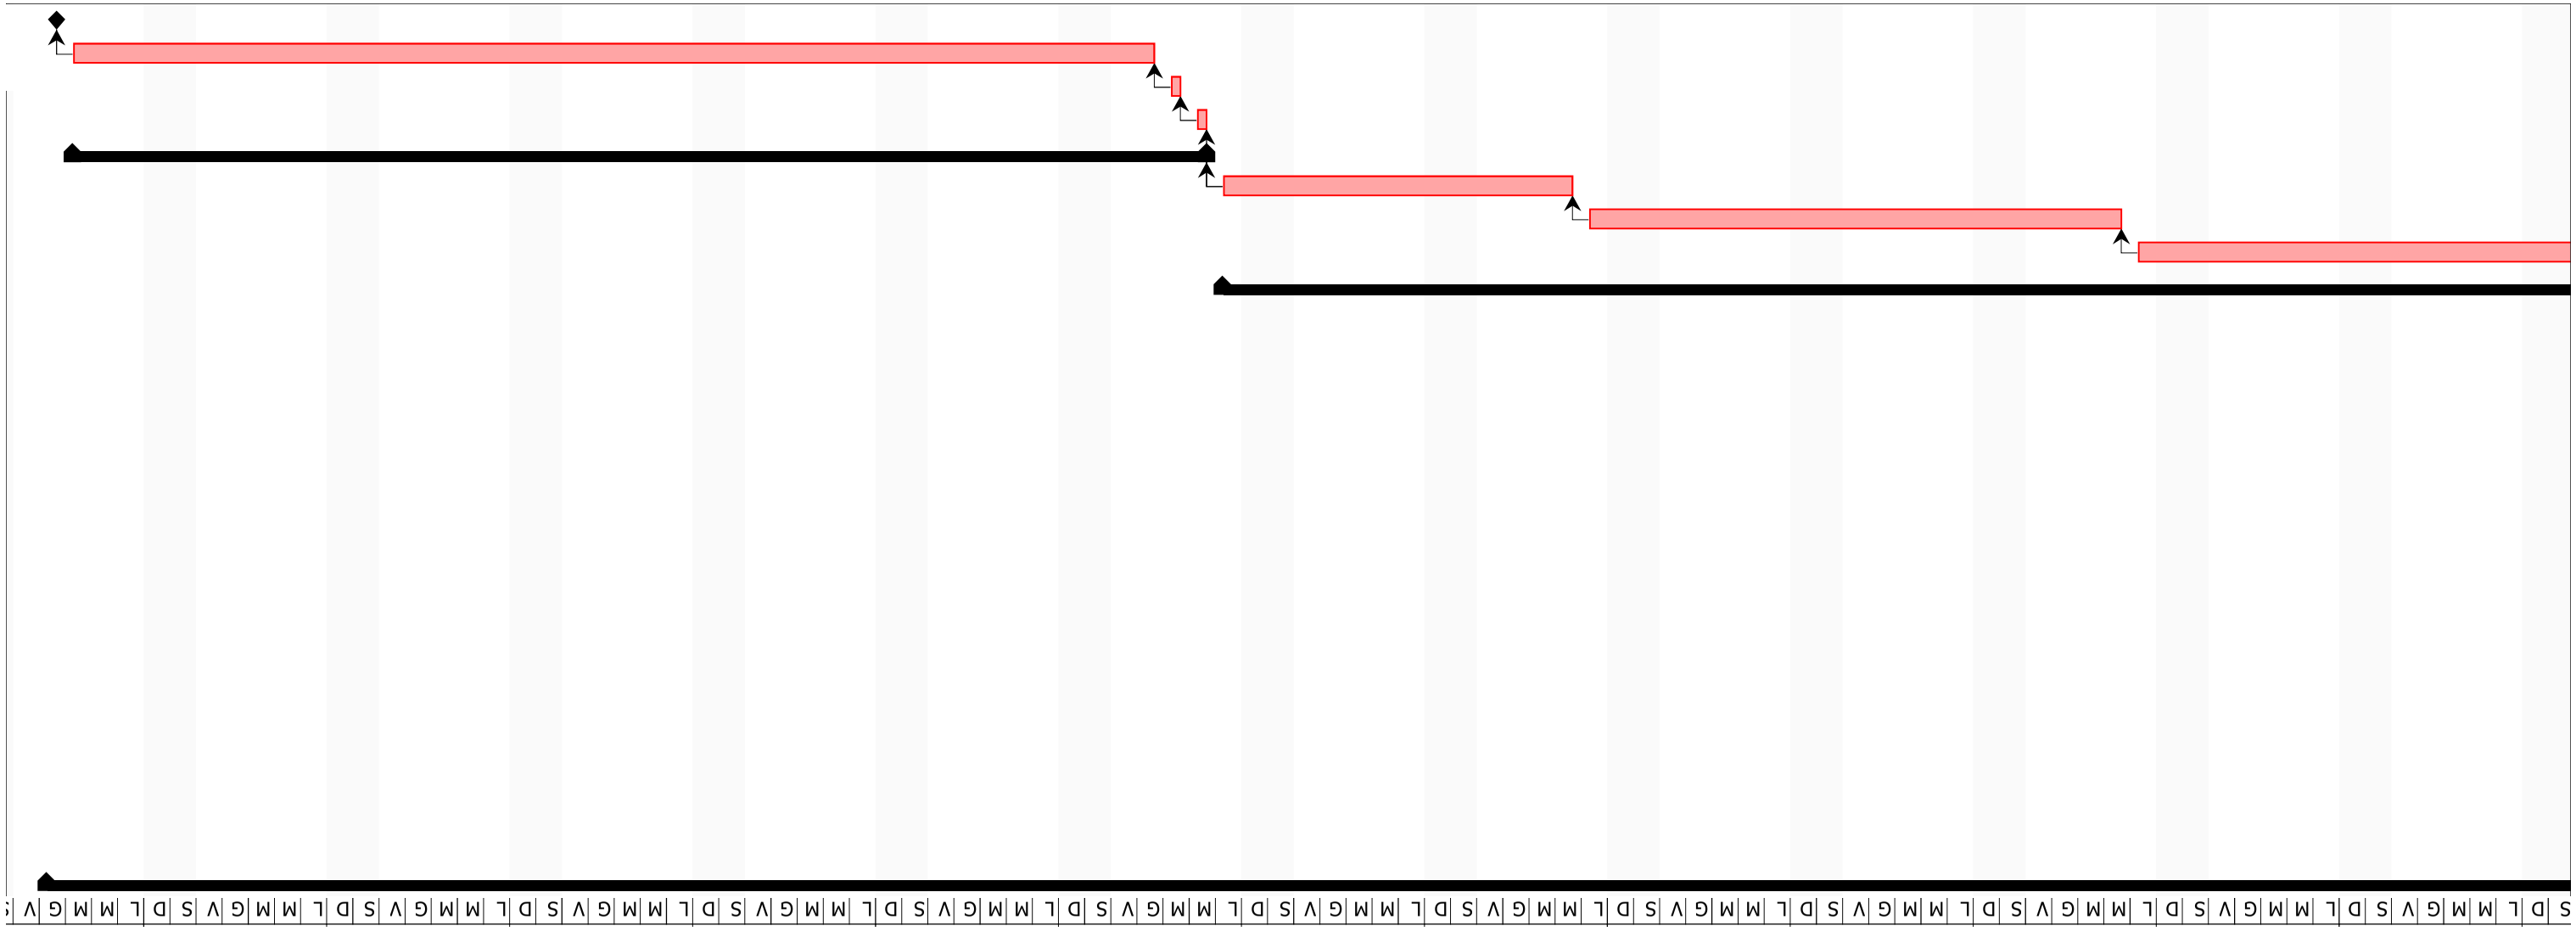
BH Wind s.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159
fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com - info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO - 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

	Nome	Durata
1	**Cronoprogramma Parco eolico Pian del Melo - 9 MW**	**138 giorni**
2	Inizio lavori	1 giorno
3	**Realizzazione opere civili**	**58 giorni**
4	**Allestimento cantieri e pulizia aree**	**8 giorni**
5	Delimitazione area di cantiere	1 giorno
6	Taglio piante	7 giorni
7	**Realizzazione WTG 02**	**30 giorni**
8	Scavi piazzola e fondazioni WTG02	20 giorni
9	Getto magrone	1 giorno
10	Posa armatura plinto di fondazione	8 giorni
11	Getto plinto di fondazione	1 giorno
12	**Realizzazione WTG 03**	**30 giorni**
13	Scavi piazzola e fondazioni WTG03	20 giorni
14	Getto magrone	1 giorno
15	Posa armatura plinto di fondazione	8 giorni
16	Getto plinto di fondazione	1 giorno
17	Realizzazione locale tecnico e cabina di consegna	10 giorni
18	Posa dei cavidotti	10 giorni
19	**Montaggi**	**46 giorni**
20	Montaggio strutturale Aerogeneratori	21 giorni
21	Montaggio elettrico Aerogeneratori	15 giorni
22	Allestimento quadri di parellelo locale utente	10 giorni
23	**Avviamento impianto e chiusura lavori**	**32 giorni**
24	Collaudo ENEL	1 giorno
25	Primo parallelo	1 giorno
26	Ripristini ambientali	30 giorni
27	Fine lavori	1 giorno


S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V


S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
