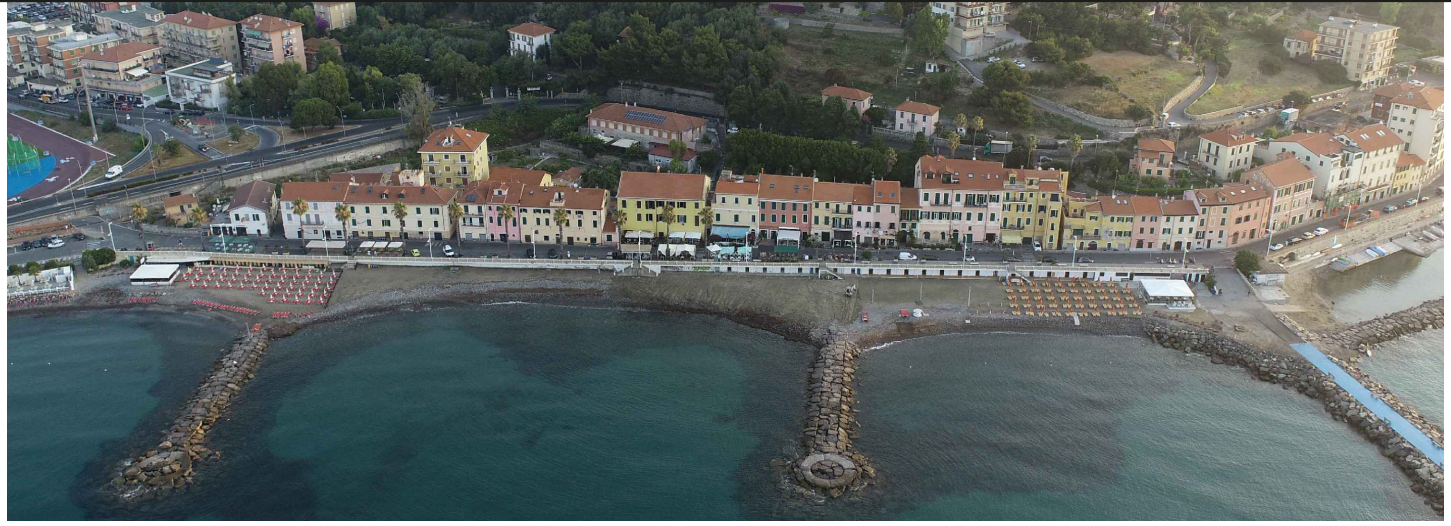


LOTTO A : ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI
LOTTO B : RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE OOGGETTO DI ALTRI FINANZIAMENTI
CUP D57H21001220001

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L

Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	__:___	30/03/2022

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2					
1					
0	30/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	F.T.	F.T.	D.G.

TITOLO	TAV N°
BOZZA DI CONTRATTO	18

C I T T A ' D I I M P E R I A
(C.F. 00089700082)

SCHEMA DI CONTRATTO

ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 - DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI - CUP: D57H21001220001

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno _____ del mese di _____nella sede della stazione appaltante in viale Matteotti, n. 157 – Imperia, il RUP _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F. _____), il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente _____
- il sig. _____ nato a _____il_____, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ partita I.V.A. _____con sede legale in _____, via _____iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di_____ al n. _____, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa

(OPPURE nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa aggiudicataria)

- il sig._____ , nato a_____ il _____, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale; ***(oppure)*** procuratore generale dell'impresa_____, partita I.V.A._____, con sede legale in _____, via_____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____al n. _____, giusta procura speciale; ***(oppure)*** procura generale, in data_____rep. n._____autenticata nella firma dal dott._____notaio in _____, allegata in originale al presente atto sotto la lettera B, che nel prosieguo sarà chiamata per brevità anche esecutore o impresa.
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott._____sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni

PREMESSO CHE

· con D.G.M. n. _____ del _____ , esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 - DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI"**, per una spesa complessiva di € 1.957.000,00 di cui € 1.924.500,00 + IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 32.500,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 347.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con provvedimento n. _____del _____ l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante _____
_____

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato approvato l'esito della gara svoltasi in data _____e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa _____ con sede in _____con il ribasso del _____ % sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo dei lavori da appaltare di €_____ comprensivi di €_____ per oneri per la sicurezza e di €_____per lavori in economia, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del _____ l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota del _____ l'impresa ha presentato la richiesta documentazione ed ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia definitiva per un importo di _____ a mezzo _____ ;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all'impresa_____, con sede in_____ via_____ che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo ai lavori di "**ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021 - DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI**".

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione di una anticipazione del 20 % sul valore stimato dell'appalto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € _____, oltre IVA nella misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.
I pagamenti in acconto saranno effettuati su richiesta dell'impresa ogni qualvolta l'impresa avrà eseguito lavori per un importo complessivo pari ad **€ 300.000,00 (TRECENTOMILA/00).**
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal _____ alla sede legale dell'impresa sita in _____via_____ .
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal _____.
Le modalità di pagamento sono concordate come segue: _____

Art. 4 CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI

A seguito di autorizzazione alla consegna da parte del responsabile del procedimento il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno e il luogo per la consegna.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è stabilito entro il 31/10/2022.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori; in quest'ultimo caso, si intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. È pure riservata all'Amministrazione la concessione di proroghe ai termini di esecuzione, la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore.
Per le eventuali sospensioni dei lavori e proroghe si applicano le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs.50/2016 e nell'art 5 del D.M. 49 del 7/03/2018.
In ogni caso per il ritardo di dell'ultimazione, verrà applicata una penale dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
La riscossione della penale sarà operata in sede di conto finale e qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva.
Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi, refertazioni e conseguenti pareri di legge, e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto, tra i quali si evidenzia la richiesta ed ottenimento della competente autorizzazione demaniale all'esecuzione dei lavori ed eventuali ordinanze;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) i tempi di riparazione dei mezzi marittimi o terrestri impiegati.
La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza prima della stipula del contratto o altra forma di legge.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento, in tutti gli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo validato.
Entro 5 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008
b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
c) il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto per l'emissione dei certificati di pagamento;
d) l'elenco di tutte le macchine ed attrezzature che l'Appaltatore intenderà utilizzare per il sollevamento, la movimentazione, la lavorazione, la fornitura di ogni e qualsiasi materiale da impiegarsi per la realizzazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
In particolare l'Appaltatore provvede a:
1) nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

2) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
4) richiedere tempestivamente per iscritto entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano, il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5) dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge;
6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. 81/2008);
7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, antincendio e gestione dell'emergenza (D.Lgs. 81/2008);
8) assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
10) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
11) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
12) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
13) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
14) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
15) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, compreso il Codice della Navigazione Marittima (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.) ed il relativo Regolamento (D.P.R. n. 328/1952), le Ordinanze dell'Autorità Marittima e Demaniale;
16) provvedere alla gratuita manutenzione per mesi 6 decorrenti dalla data di ultimazione;
17) l'appaltatore dovrà eseguire su richiesta della stazione appaltante, le lavorazioni nei giorni festivi e/o su doppi turni di lavoro di otto ore ciascuno, con presentazione di instanza di autorizzazione in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di emissione acustica; per tale condizione non e' previsto alcun compenso aggiuntivo e/o indennita' di sorta: l'appaltatore ha valutato tale eventuale obbligo di esecuzione nel formulare la propria migliore offerta.

Art. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione del contratto
Si procede alla risoluzione nei casi previsti dall'art.108 del D.Lgs.50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016. 2. A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Recesso dal contratto
Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite; quest'ultimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 7 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 107 del D. lgs 50/2016.

Art. 8 CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE
Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle stesse acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall'art.205 del D.Lgs. 50/2016 (Accordo bonario).
Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs.50/2016 (Transazione).
Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di Imperia.

Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA
L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 la garanzia definitiva di € _____, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data _____dalla Società _____Agenzia di _____;
(oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca_____;
(oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario.
La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE
Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 103 c 7 del d.lgs. 50/2016, una polizza di assicurazione con un massimale di € _____ per danni di esecuzione e un massimale di € _____ per responsabilità civile verso terzi, emessa in data_____ dalla Società _____ Agenzia di _____ .

Art. 11 REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi.

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 13 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.
(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all'impiego della Provincia di _____ , competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data _____prot. n. _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 15 DOMICILIO DELL'ESECUTORE

(se l'impresa ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)
A tutti gli effetti del presente atto, l'impresa elegge domicilio presso la sua sede legale, già dichiarata nel presente contratto.
(oppure se l'impresa non ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)
A tutti gli effetti del presente atto, l'impresa elegge domicilio in Imperia, presso _____,
via_____ al n. _____ .

Art. 16 SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante indica che non è subappaltabile la Categoria OG7.
(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
Il subappalto non è ammesso, non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare categorie di lavoro.
(oppure se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le opere da subappaltare, indicate in: _____ l'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art 102 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore, nel Regolamento di attuazione del Codice Appalti

D.P.R.207/2010 per le disposizioni che restano in vigore, nelle linee guida ANAC, nei decreti attuativi del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs.50/2016), nel D.M. 248/2016, nel DM 49/2018, nel D. Lgs. 50/2016.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Art. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

1. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. _____
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

Art. 22 ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
…….

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad esso allegati: il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore, il Regolamento di attuazione del Codice Appalti D.P.R.207/2010 per le disposizioni che restano in vigore, le linee guida ANAC, i decreti attuativi del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), il D.M. 248/2016, il DM 49/2018, il D. Lgs. 50/2016, l'Ordinanza OCDPC n° 558 del 15 novembre 2018.

(Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata)

DIRIGENTE SETTORE_____

(Ing. _____)

per l'IMPRESA _____

(Sig. _____)

IL SEGRETARIO GENERALE

(_____)
